



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar:	POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania:	2007-2013
	Numer programu (CCI):	2007PL161PO012
	Nazwa programu:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
	SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:
Okres sprawozdawczy:		01.01.2015 – 30.06.2015

Andrzej Buła

Antoni Konopka

.....

Roman Kolek

Tomasz Kostuś

Grzegorz Sawicki

SPIS TREŚCI:

I. Informacje wstępne	1
<i>Spis tabel, wykresów i map</i>	<i>4</i>
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	7
<i>1. Realizacja i analiza postępów</i>	<i>7</i>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	7
1.2 Informacje finansowe	8
1.3 Analiza jakościowa	11
<i>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych</i>	<i>80</i>
<i>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....</i>	<i>82</i>
<i>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</i>	<i>83</i>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	83
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	83
<i>5. Informacja o realizacji dużych projektów.....</i>	<i>87</i>
<i>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej</i>	<i>87</i>
<i>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....</i>	<i>88</i>
<i>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej</i>	<i>89</i>

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik I	<i>Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013.....</i>	91
Załącznik II	<i>Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2015 r.....</i>	133
	<i>Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE.....</i>	135
Załącznik III	<i>Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy.....</i>	137

Spis tabel, wykresów, map i schematów

Tabela 1. Stopień realizacji wskaźników programowych w ramach RPO WO 2007-2013	7
Tabela 2. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu	11
Tabela 3. Indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WO 2007-2013.....	19
Tabela 4. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym	24
Tabela 5. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu	25
Tabela 6. Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu.....	30
Tabela 7. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu	41
Tabela 8. Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym	46
Tabela 9. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu	47
Tabela 10. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu	54
Tabela 11. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu	62
Tabela 12. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu	69
Tabela 13. Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 – podpisane umowy/ wydane decyzje od uruchomienia Programu.....	73
Tabela 14. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu.....	74
Tabela 15. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2015 r.	80
Tabela 16. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)	87
Tabela 17. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie)	88
Wykres 1. Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2015 – 30.06.2015)	9
Wykres 2. Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2015 – 30.06.2015).....	9
Wykres 3. Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2015 – 30.06.2015)	10
Wykres 4. Poziom dofinansowania UE w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne.....	10
Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu	13
Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej).....	14
Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej).....	14
Wykres 8. Dofinansowanie z EFRR wniosków na poszczególnych etapach wdrażania od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.....	18
Wykres 9. Liczba i wartość dofinansowanych umów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 wypełniających założenia poszczególnych strategii	21
Wykres 10. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	23
Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	23
Wykres 12. Liczba i wartość udzielonych pożyczek w podziale na rodzaje przedsiębiorstw	31
Wykres 13. Liczba i wartość udzielonych poręczeń w podziale na rodzaje przedsiębiorstw	31
Wykres 14. Udział poszczególnych rodzajów innowacji w ramach zakończonych projektów innowacyjnych (kategoria interwencji 07).....	33
Wykres 15. Rozkład podpisanych umów w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1 wg Sekcji PKD 2007	37

Wykres 16. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	40
Wykres 17. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	40
Wykres 18. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	45
Wykres 19. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	45
Wykres 20. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	53
Wykres 21. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	53
Wykres 22. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	60
Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	61
Wykres 24. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	68
Wykres 25. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	68
Wykres 26. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów	73
Wykres 27. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej.....	85
Wykres 28. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej.	86
Wykres 29. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej.....	86
Mapa 1. Zestawienie liczby i wartości EFRR podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta.....	15
Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta.....	16
Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013.....	77

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacje nt. postępu rzeczowego w zakresie wskaźników produktu i rezultatu zawartych w RPO WO 2007-2013¹ oraz w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*², zostały zaprezentowane w *Załączniku I*.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe. W ramach Programu założono realizację **90 wskaźników**, w tym: 49 wskaźników produktu oraz 41 wskaźników rezultatu.

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego [KSI (SIMIK 07-13)]. Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników zaprezentowano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM RPO WO 2007-2013. W przypadku wskaźników w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,1289 PLN.

Osiągnięte wartości oraz szacowane do osiągnięcia wartości wskaźników zostały przedstawione kumulatywnie, w oparciu odpowiednio o: zatwierdzone wnioski o płatność końcową i zawarte umowy/wydane decyzje, zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) do 30 czerwca 2015 r.³. Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Analiza postępu realizacji wskaźników została przeprowadzona w oparciu o dopuszczalne odchylenia od wartości docelowej wskaźnika, analogicznie jak w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. Określono, iż wskaźnik uznaje się za osiągnięty w przypadku odchylenia wartości wskaźnika od planowanej wartości docelowej do +/- 25%. W przypadku, gdy odchylenie wskaźnika jest większe niż +/- 25% wskaźnik uznaje się jako nieosiągnięty/przekroczony.

W *Tabeli 1* przedstawiono informacje nt. ogólnego stopnia realizacji wskaźników programowych na podstawie wniosków o płatność końcową, z której wynika, że blisko 69% wskaźników zostało osiągniętych tj. 38 wskaźników produktu i 24 wskaźników rezultatu. W przypadku ponad 31% wskaźników odchylenie przekracza +/- 25% zakładanej wartości docelowej (dotyczy to 11 wskaźników produktu i 17 wskaźników rezultatu). Spośród wskaźników, które odbiegają od zakładanej wartości docelowej, 14 wskaźników przekracza założoną wartość docelową co stanowi wartość dodaną celu Programu.

Dokładne informacje nt. stanu realizacji poszczególnych wskaźników zostały opisane w ramach analizy jakościowej poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 1. Stopień realizacji wskaźników programowych w ramach RPO WO 2007-2013

Status Nr osi	WSKAŹNIKI PRODUKTU			WSKAŹNIKI REZULTATU		
	Osiągnięty	Przekroczony/ nieosiągnięty	Σ	Osiągnięty	Przekroczony/ nieosiągnięty	Σ
Oś 1	13	2	15	8	6	14
Oś 2	2	0	2	5	2	7
Oś 3	6	3	9	2	1	3

¹ Zaktualizowany Program zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją nr K (2011) 9364 z 13 grudnia 2011 r.

² Wersja 69 zatwierdzona *Uchwałą nr 731/2015* Zarządu Województwa Opolskiego z 16 czerwca 2015 r.

³ Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych, tj. na poziomie Osi priorytetowej.

Status Nr osi	WSKAŹNIKI PRODUKTU			WSKAŹNIKI REZULTATU		
	Osiągnięty	Przekroczony/ nieosiągnięty	Σ	Osiągnięty	Przekroczony/ nieosiągnięty	Σ
Oś 4	3	3	6	2	4	6
Oś 5	7	1	8	4	0	4
Oś 6	2	1	3	0	4	4
Oś 7	5	1	6	3	0	3
RPO WO 2007-2013	38	11	49	24	17	41

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabelach finansowych (*Załącznik II*).

Dane zawarte w treści sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych. Wszelkich zaokrążeń (ogółem dla Programu oraz w ramach poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami finansowymi zawartymi w *Załączniku II* do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 30 czerwca 2015 r. z *Oracle Business Intelligence*. Innymi słowy, zaokrąglone wartości ogółem dla Programu wynikają bezpośrednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokrąglonych wartości poszczególnych osi.


Wykresy 1 – 3 przedstawiają postęp finansowy Programu w porównaniu z 31.12.2014 r. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, największy przyrost w stosunku do końca grudnia 2014 r. odnotowano w ramach wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz wniosków po ocenie formalnej – odpowiednio blisko 7% i 6%.

W zakresie wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów największy przyrost odnotowano w zakresie wniosków zatwierdzonych do realizacji - około 1,6% wzrostu w stosunku do wartości osiągniętych na koniec 2014 r.

Biorąc pod uwagę wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz środki zatwierdzone przez Instytucję Certyfikującą (w stosunku do grudnia 2014 r.) odnotowano przyrosty - odpowiednio 3% i 4,6%.


Województwo opolskie zgodnie z raportem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. *Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013* (informacja miesięczna za czerwiec 2015 r.) zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** pod względem poziomu płatności w ramach regionalnych programów operacyjnych (**97%**), co przedstawia *Wykres 4*. Poziom płatności w ramach wszystkich regionalnych programów operacyjnych na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 88%.

Wykres 1. Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2015 – 30.06.2015)

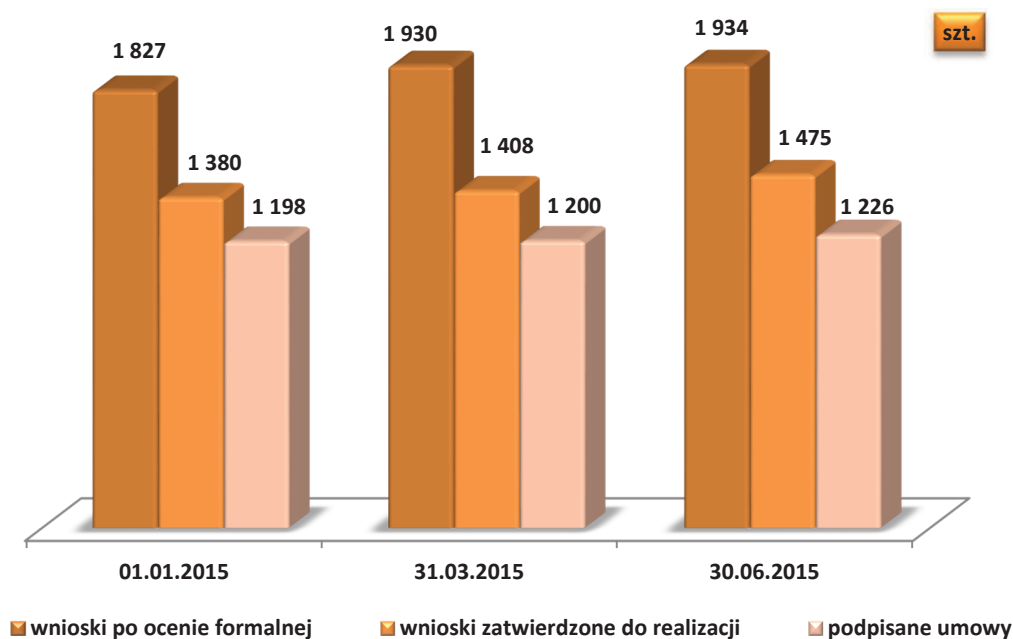


Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 2. Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2015 – 30.06.2015)

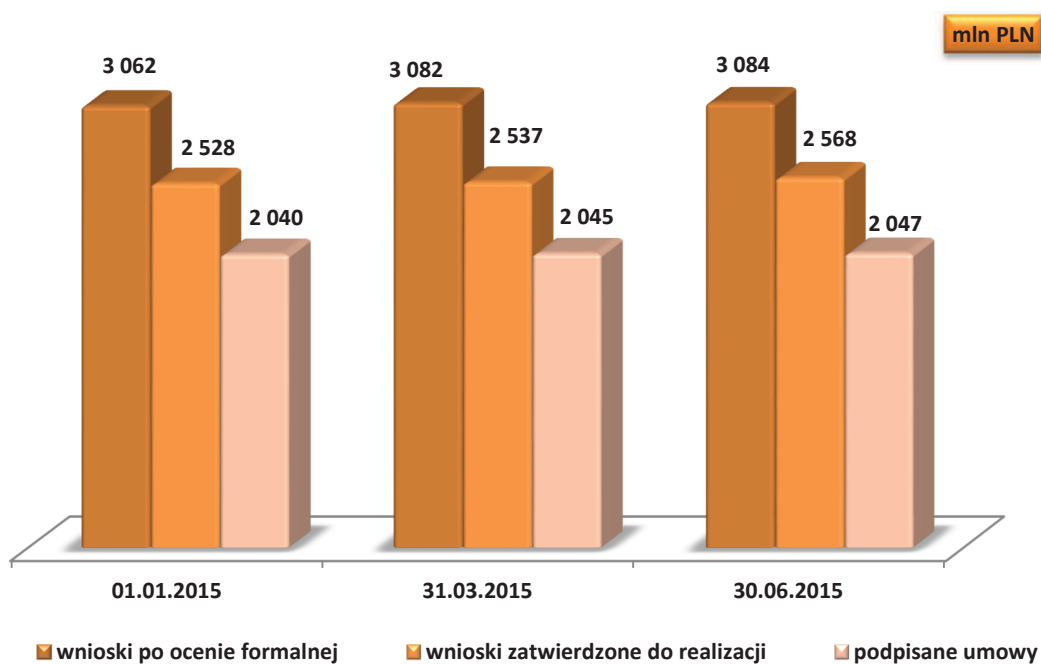


Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2015 – 30.06.2015)

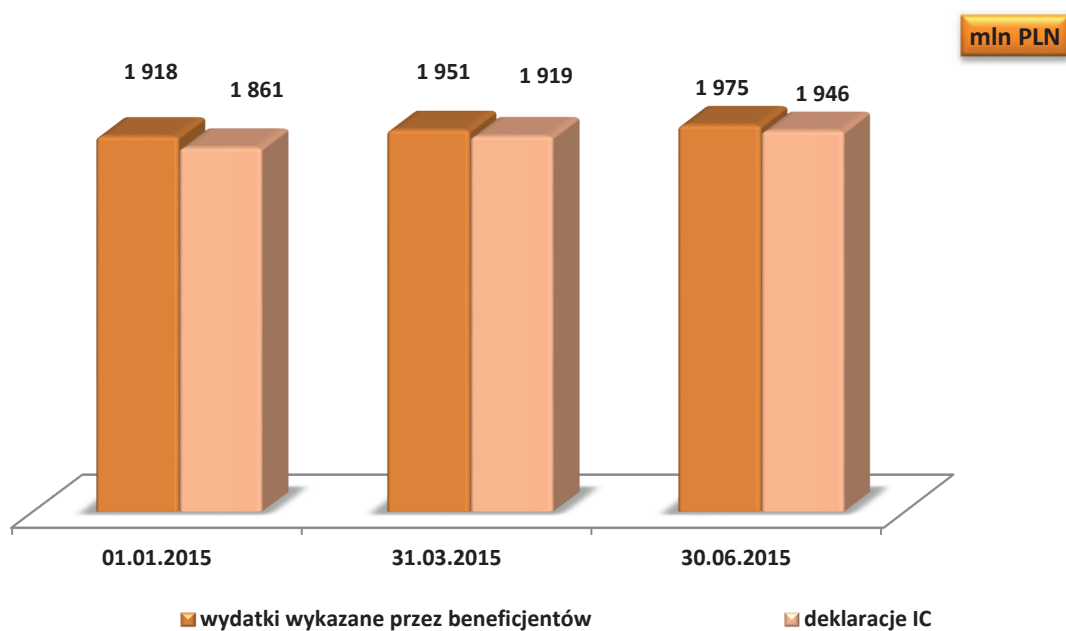

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 4. Poziom dofinansowania UE w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne

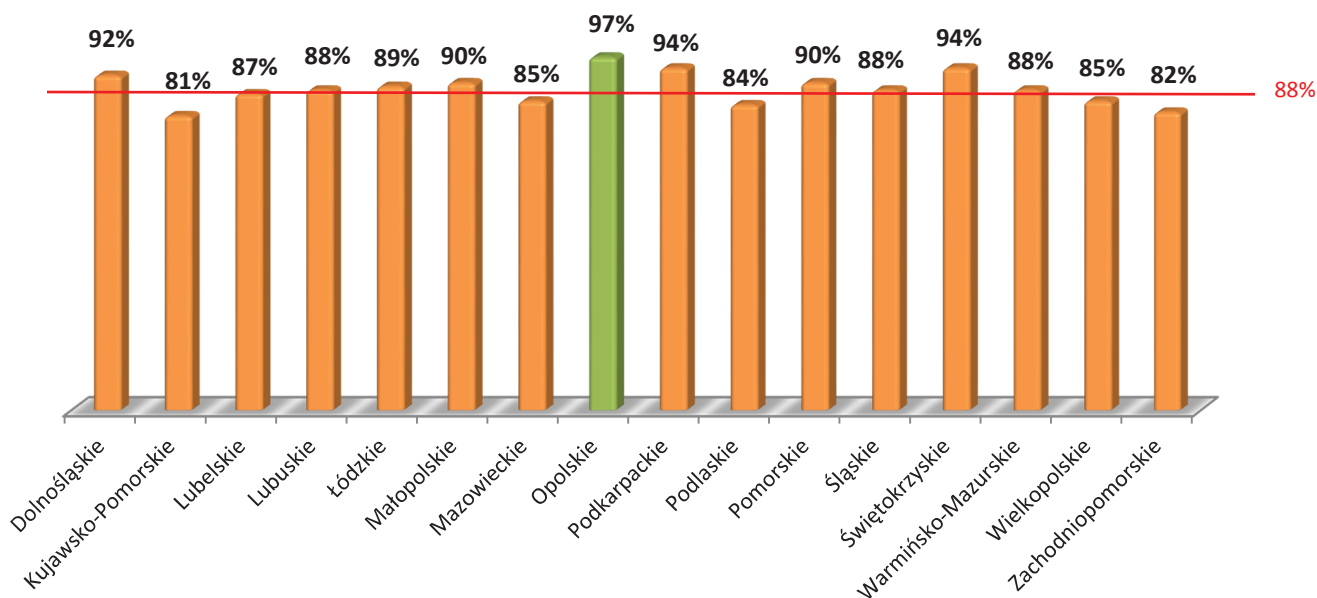

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MIR „Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013” wg stanu na dzień 30.06.2015.

1.3 Analiza jakościowa

I. Informacje nt. wdrażania RPO WO 2007-2013

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Alokacja

⇒ Zgodnie z uchwałą Nr 53 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych alokacja RPO WO 2007-2013 została **zwiększona o 64 302 160 Euro**, co stanowi 15% dotychczasowej alokacji na Program. Dodatkowe środki pochodzą z Krajowej Rezerwy Wykonania **54 156 945 Euro** oraz dostosowania technicznego **10 145 215 Euro**, w tym na niwelowanie skutków powodzi (6 275 125 Euro). Łączna kwota alokacji na RPO WO 2007-2013 wynosi **491 446 973 Euro**.

Nabory wniosków

⇒ zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 października 2014 r.* do końca czerwca 2015 r. przeprowadzono łącznie **98 naborów wniosków**, w tym: **78 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **20 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,

⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła **506,56 mln Euro** (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi **100%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013.

Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w *Tabeli 2*. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 2. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	konkursowe	IPI	konkursowe	IPI
			EFRR + BP	EFRR + BP
Oś Priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	35	4	196,81	9,16
Oś Priorytetowa 2 <i>Społeczeństwo informacyjne</i>	3	0	28,73	0,00
Oś Priorytetowa 3 <i>Transport</i>	14	11	73,38	66,92
Oś Priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	12	2	46,05	5,67
Oś Priorytetowa 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	10	2	35,75	8,96
Oś Priorytetowa 6 <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	4	1	30,80	4,33
SUMA NABORÓW	78	20	411,52	95,04
	Σ = 98 naborów		Σ = 506,56 mln Euro	

Źródło: *Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 października 2014 r.*

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **2 758 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **7 048,72 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **3 773,52 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **1 934 wnioski** o całkowitej wartości **5 658,82 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **3 083,89 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji **1 475 projektów** o całkowitej wartości **4 699,77 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **2 568,33 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **1 226 umów** na realizację projektów, których całkowita wartość wyniosła **3 658,09 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **2 046,63 mln PLN**,
- ⇒ **1 203** umowy to projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **23** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł ponad **100%**,
- ⇒ najwyższy poziom zakontraktowania został osiągnięty w Osi 5, Osi 6 oraz Osi 4 (odpowiednio 101,46%, 100,84% oraz 100,65%).

Wnioski o płatność


- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły **1 974,92 mln PLN** (EFRR), co stanowi około **97%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- ⇒ największą wartość wydatków we wnioskach o płatność wykazali beneficjenci w ramach Osi 1 i 3. Natomiast największy poziom wydatków wykazanych we wnioskach o płatność w stosunku do alokacji przeznaczonej na Osie został osiągnięty w ramach Osi 5, Osi 6 i Osi 3 (ponad **98%**).

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **1 946,36 mln PLN**, co stanowi ponad **95%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Poziom wykorzystania alokacji w ramach wniosków poprawnych pod względem formalnym, podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono na *Wykresie 5*.

Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

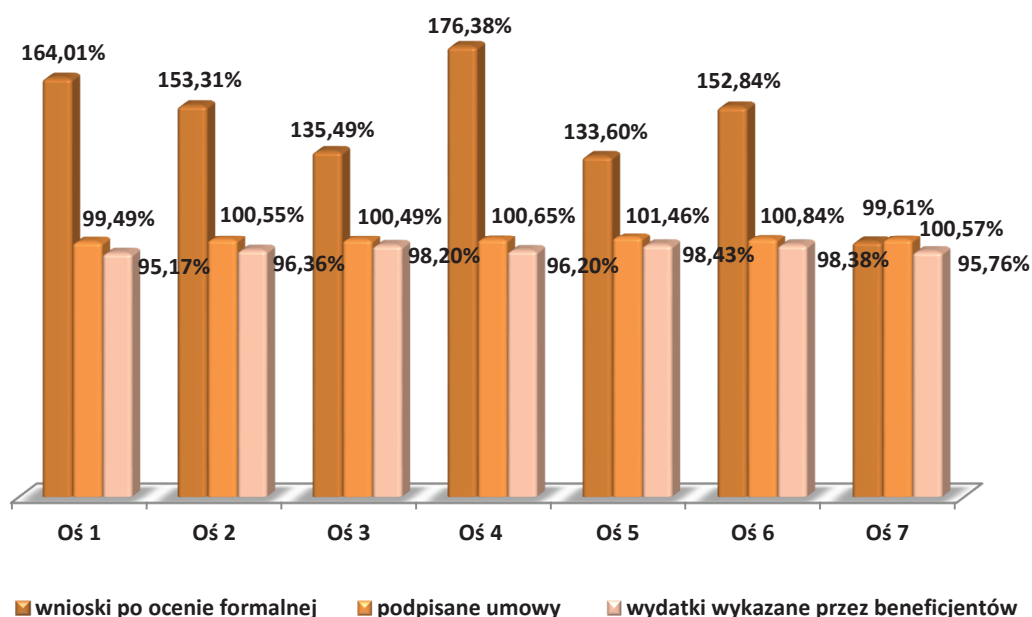

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wg stanu na 30 czerwca 2015 r. większość osi priorytetowych osiągnęło poziom kontraktacji przekraczający 100% alokacji zapisanej w ramach RPO WO 2007-2013 na ich realizację.

Biorąc pod uwagę wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność, trzy osie priorytetowe przekroczyły poziom 98% alokacji EFRR zapisanej na ww. osie – są to Oś priorytetowa 5, Oś priorytetowa 6 i Oś priorytetowa 3.

W zakresie Osi priorytetowej 5 odnotowano najwyższy poziom zakończonych projektów i wynosi on ok. 98%. W przypadku pozostałych Osi priorytetowych liczba zakończonych projektów kształtuje się na poziomie 89-93% liczby umów podpisanych w ramach przedmiotowych osi.

Najwięcej środków w zakresie podpisanych umów pozyskały **samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne (ponad 569 mln PLN), samorząd województwa wraz z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (około 515 mln PLN) oraz przedsiębiorcy (ponad 458 mln PLN).**


Średnia wartość dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadająca na 1 mieszkańca województwa opolskiego wyniosła około 1 982 PLN. Pod względem kwoty dofinansowania EFRR przypadającej na 1 mieszkańca powiatu najwyższe wartości uzyskało **Miasto Opole** ponad **7 882 PLN**. Kwotę dofinansowania z EFRR powyżej **1 000 PLN** na mieszkańca otrzymało 7 powiatów: **strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, głubczycki, oleski, krapkowicki i namysłowski.**

Beneficjenci mający siedzibę na terenie 2 gmin: Łambinowic i Skoroszyce nie realizują żadnych projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Wśród samorządów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: **Opole, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Nysa, Zawadzkie, Ujazd i Brzeg.** Natomiast wśród samorządów powiatowych najwięcej środków pozyskały powiaty: **kędzierzyńsko-kozielski, nyski, strzelecki** oraz **głubczycki.**

Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w całości zakontraktowanych środków przedstawia Wykres 6.

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)

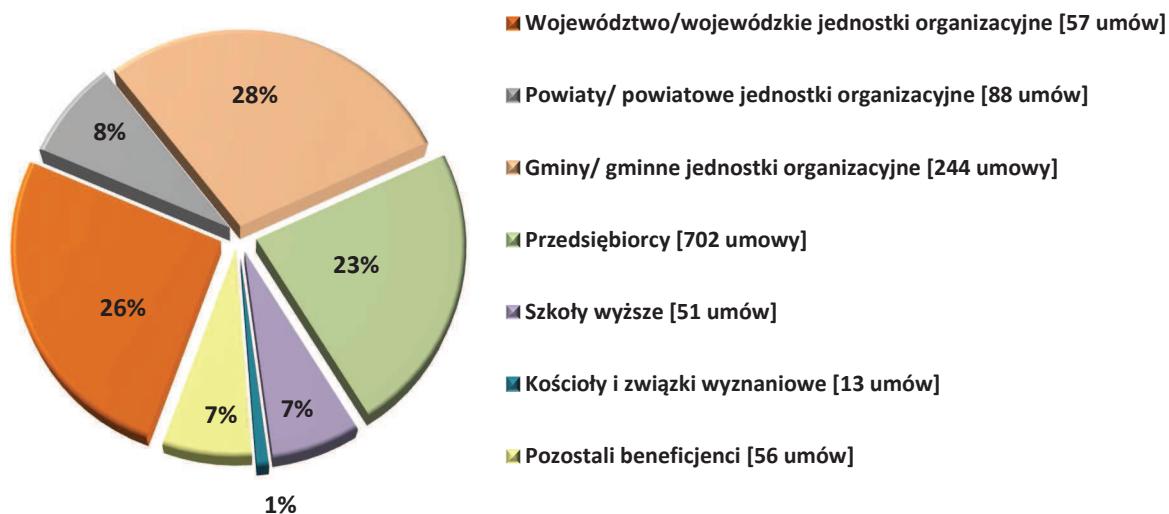


Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W zakresie zakontraktowania środków RPO WO 2007-2013 najwięcej środków przeznaczono na **inwestycje z zakresu transportu** (ok. 587 mln PLN), **przedsiębiorczość** (około 265 mln PLN), **innowacje, badania i rozwój technologiczny** (ok. 248 mln PLN) oraz **turystykę** (ponad 238 mln PLN).

Dane dotyczące zakontraktowania środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 7. Na *Mapie 1* i *2* przedstawiono natomiast zestawienie wartości podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia.


Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)

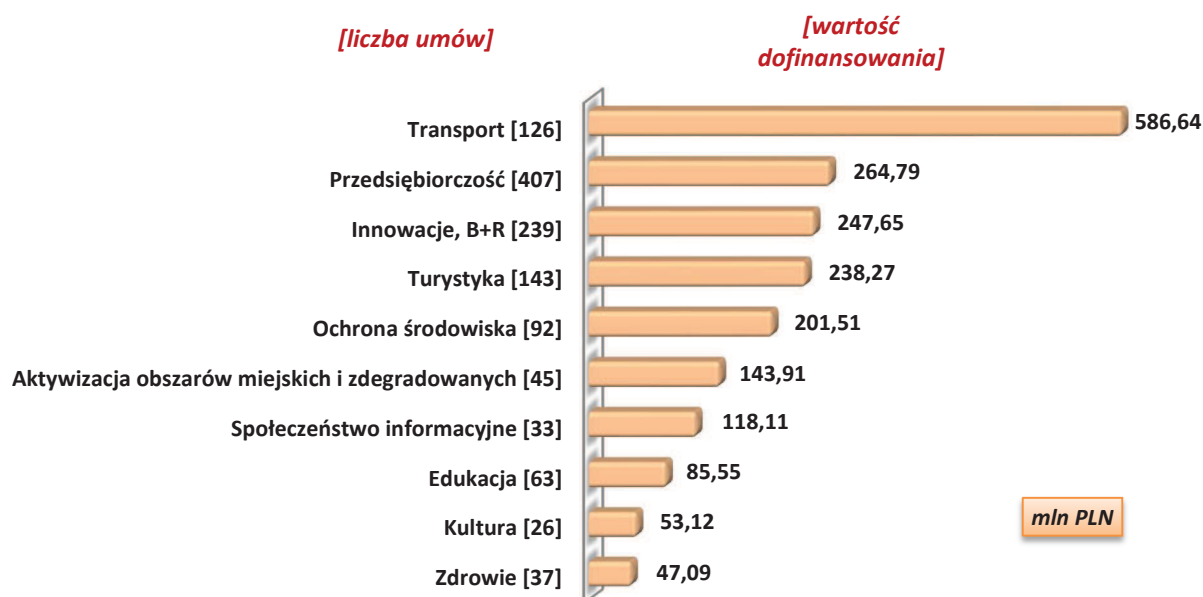

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


Szczegółowe informacje na temat wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie II sprawozdania.

Mapa 1. Zestawienie liczby i wartości EFRR podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta

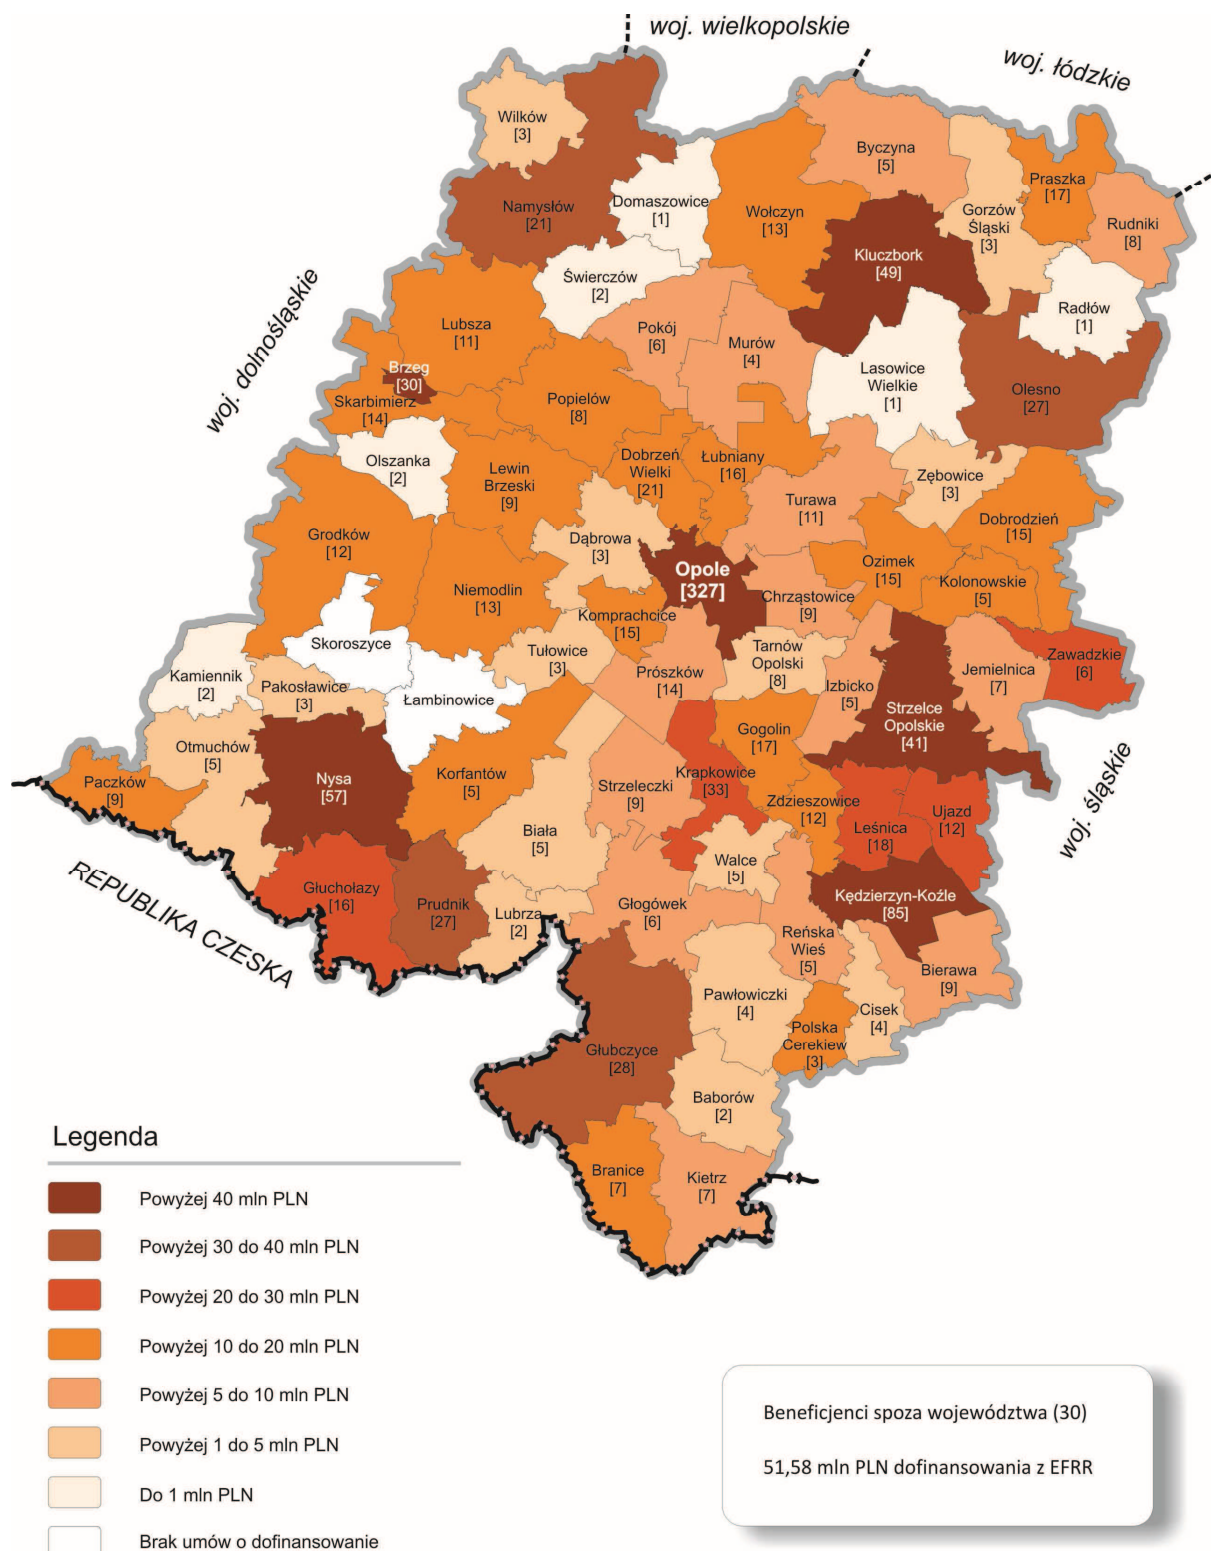

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta

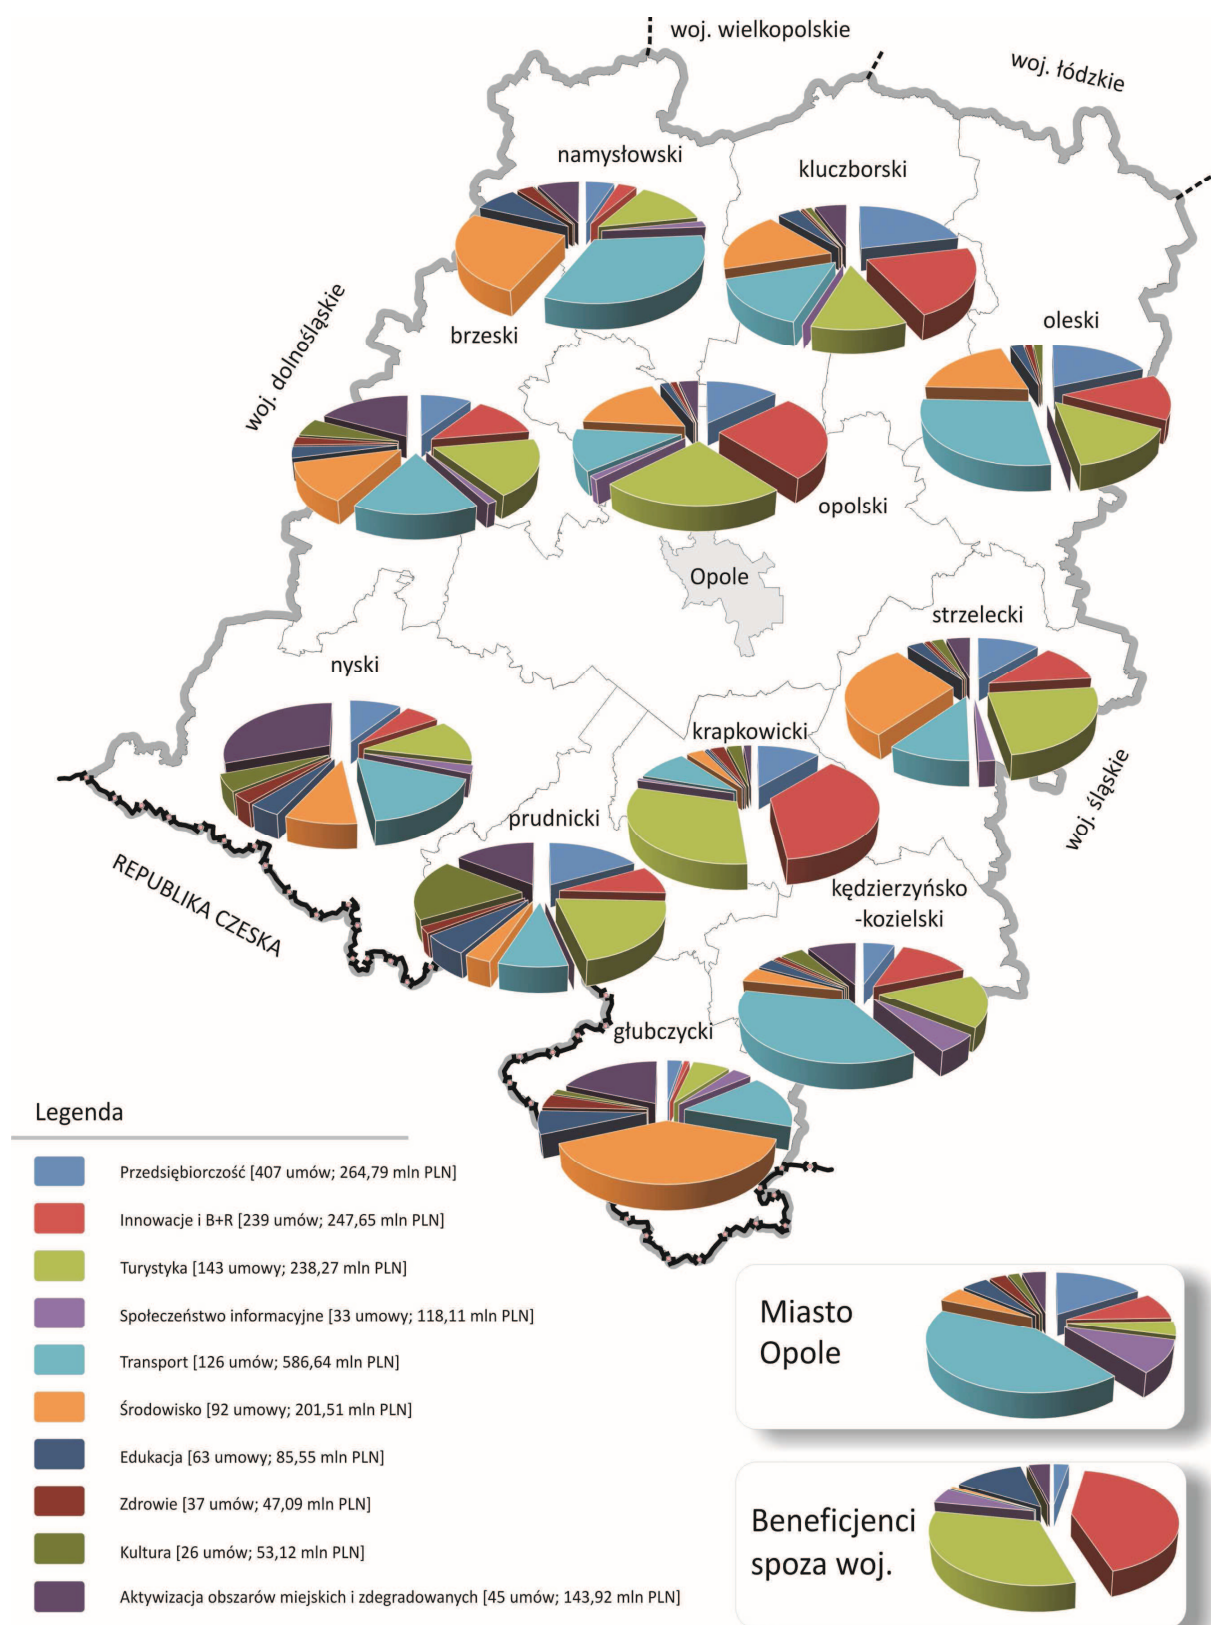

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów wniosków w ramach Programu;

Wnioski złożone

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **107 wniosków** o całkowitej wartości **53,05 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **21,57 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zaakceptowanych do realizacji zostało **95 projektów** o całkowitej wartości **71,82 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **40,35 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **35 umów** o całkowitej wartości **114,74 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **29,48 mln PLN**,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym rozwiązano **5 umów** o całkowitej wartości **18,60 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **7,11 mln PLN** (wszystkie w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*).

Wnioski o płatność


⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **57,95 mln PLN**, co stanowi około **3%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **85,86 mln PLN**, co stanowi ponad **4%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Porównanie postępów w realizacji Programu od jego uruchomienia oraz w okresie sprawozdawczym przedstawiono na *Wykresie 8*.

Wykres 8. Dofinansowanie z EFRR wniosków na poszczególnych etapach wdrażania od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym

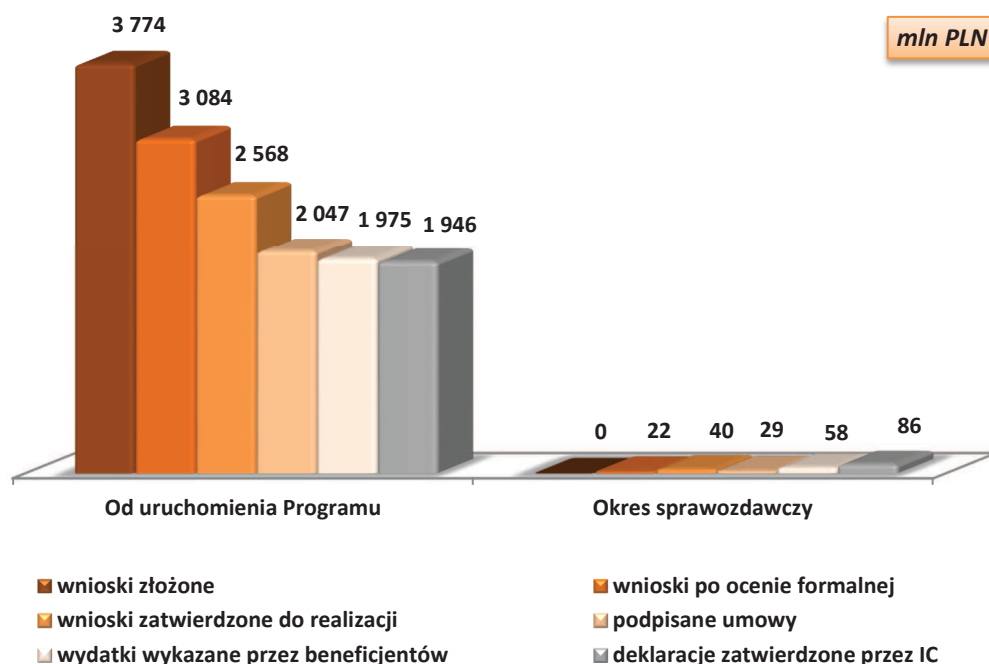

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Indywidualne projekty kluczowe

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.* na realizację **23 projektów** umieszczonych w *Indykatorywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* przeznaczono kwotę **93,24 mln Euro** z EFRR, tj. **19,5%** alokacji EFRR przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej.

Od uruchomienia programu podpisano/podjęto **23 umowy/decyzje o dofinansowaniu** projektów kluczowych. Ich całkowita wartość to **597,42 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi **389,65 mln PLN**, co stanowi ponad **19%** wszystkich środków zakontraktowanych w ramach Programu.

W okresie sprawozdawczym podpisano **1 umowę** o dofinansowanie o całkowitej wartości **5,80 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **4,93 mln PLN**. Umowa dotyczyła projektu kluczowego *Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Bładaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II*. Przedmiotowy projekt realizowany był w ramach środków na niwelowanie skutków powodzi z 2010 r. powstałych dzięki oszczędnościom na projekcie *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa*.

Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **384,50 mln PLN** (w tym 3,90 mln PLN w okresie sprawozdawczym), co stanowi blisko **19,5%** wartości wszystkich wniosków o płatność.

Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja wszystkich **23 projektów kluczowych**. W przypadku czterech z nich okres rzeczowej realizacji zakończył się do 30 czerwca 2015 r. jednak nie zatwierdzono/ wprowadzono do KSI (SIMIK 07-13) wniosków o płatność końcową.

Tabela 3. Indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WO 2007-2013

[mln PLN]

Lp.	Nazwa działania/ poddziałania	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wartość EFRR
PROJEKTY ZAKOŃCZONE				
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	Miasto Opole	Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu	11,6
2.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Gmina Prudnik	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich	4,9
3.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Gmina Zawadzkie	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi	10,5
4.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Miasto Opole	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	8,9
5.	3.1.1 Drogi regionalne	Miasto Opole	Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu	35,8
6.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa	32,5
7.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – Smolarnia	8,4
8.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobosz w km 24+565 - 35+760	28,0
9.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+385 – 28+337,17	37,4
10.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakość Etap II	21,7
11.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakość Etap I	25,8
12.	3.1.1 Drogi regionalne	Województwo Opolskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików	14,4
13.	3.1.1 Drogi regionalne	Miasto Opole*	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu	13,8
14.	3.1.2 Drogi lokalne	Powiat kędzierzyńsko-kozielski*	Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa	17,4
15.	3.1.2 Drogi lokalne	Powiat kędzierzyńsko-kozielski	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap I	3,5
16.	3.1.2 Drogi lokalne	Powiat kędzierzyńsko-kozielski*	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II	4,9
17.	3.1.2 Drogi lokalne	Gmina Cisek	Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las	0,2
18.	3.2 Transport publiczny	Województwo Opolskie	Zakup pojazdów szynowych	31,2

Lp.	Nazwa działania/ poddziałania	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wartość EFRR
19.	4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Województwo Opolskie	Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500	19,0
20.	4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Województwo Opolskie*	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek-Dzielnicza” zadanie 1,6,7	4,4
21.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	Politechnika Opolska	Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48	11,3
22.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Województwo Opolskie	Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	26,2
23.	6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	Politechnika Opolska	Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF	17,9
ŁĄCZNIE PROJEKTY ZAKOŃCZONE IPI= 389,7				

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Indyktywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz danych z KSI (SIMIK 07-13).

* rzeczowa realizacja projektów zakończyła się do końca czerwca 2015 r., jednak nie zostały zatwierdzone/ wprowadzone do KSI -(SIMIK 07-13) wnioski o płatność końcową.

Najwięcej projektów realizowanych było w ramach Osi priorytetowej 3 Transport – 14 inwestycji o wartości EFRR około 274,97 mln PLN (blisko 71% środków zakontraktowanych w ramach IPI).

Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach RPO WO 2007-2013


W celu uczynienia ze zjednoczonej Europy najbardziej dynamicznego i konkurencyjnego gospodarczo regionu na świecie w 2000 r. przyjęty został plan rozwoju dla Unii Europejskiej - *Strategia Lizbońska*. Realizując jej założenia IZ RPO WO 2007-2013 dokonała podziału dostępnej alokacji w ramach Programu na poszczególne Osi Priorytetowe, w których realizowane są projekty wypełniające założenia celów lizbońskich. Od uruchomienia Programu **856 z 1 226** zakontraktowanych projektów o wartości dofinansowania z EFRR **873,49 mln PLN** wdraża cele Strategii Lizbońskiej.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego [SUE RMB] to kolejna ze strategii unijnych wdrażana przez IZ RPO WO 2007-2013. Ze względu na geograficzne położenie regionu w południowej części Polski projekty wdrażane w ramach Programu, które wpisują się w założenia Strategii będą wpływać na realizację jej założeń jedynie w pośredni sposób. Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w cele *SUE RMB*, od uruchomienia Programu w założenia Strategii wpisuje się **1 128 z 1 226 umów** o wartości dofinansowania ze środków EFRR **1 732,86 mln PLN**.

W 2010 r. przyjęto nową strategię rozwojową dla obszaru UE – *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, która wyznacza priorytety w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej. W porównaniu z wcześniej obowiązującą *Strategią Lizbońską* zakres kategorii interwencji wyznaczonych do wdrażania celów wskazanych przez Komisję Europejską w nowo przyjętej strategii uległ poszerzeniu, przyczyniając się tym samym do wzrostu znaczenia samego RPO WO 2007-2013. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 wpisują się w 6 inicjatyw flagowych *Strategii Europa 2020*. Od uruchomienia Programu we wdrażanie wyznaczonych w Strategii inicjatyw zaangażowanych jest **1 157 z 1 226** zakontraktowanych projektów dofinansowanych z EFRR w wysokości prawie **1 843,18 mln PLN**.

Porównanie stopnia zaangażowania środków RPO WO 2007-2013 w realizację poszczególnych Strategii zaprezentowano na *Wykresie 9*.

Wykres 9. Liczba i wartość dofinansowanych umów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 wypełniających założenia poszczególnych strategii

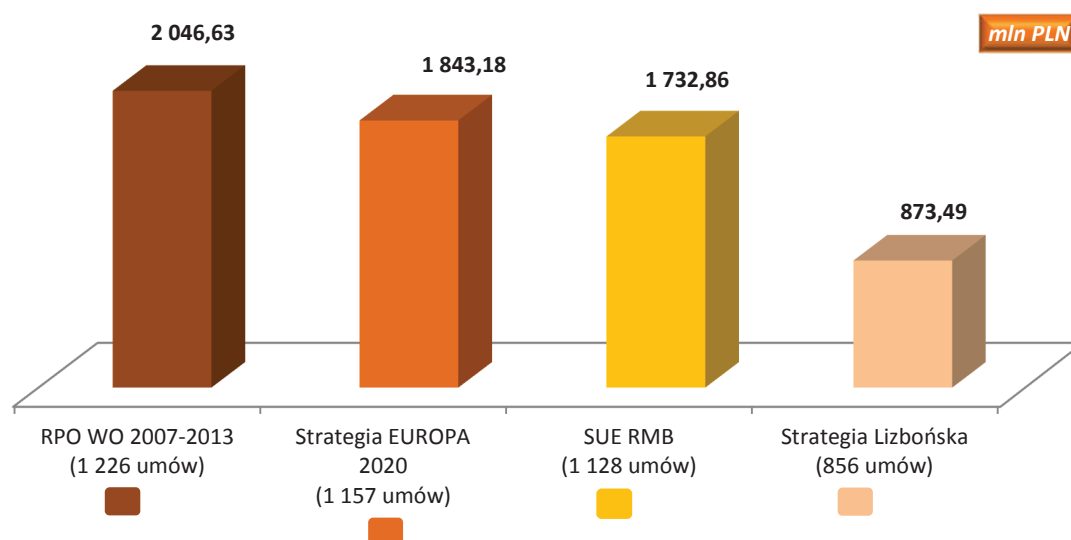

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

II. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych

OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Celami Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* są:

- tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy,
- rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości,
- wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.

We wdrażanie Osi priorytetowej 1 zaangażowana jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Za wdrażanie wszystkich działań/poddziałań odpowiada IP II stopnia z wyłączeniem poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*.

Na realizację Osi priorytetowej 1 przeznaczono łącznie **182 343 581 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **37%** alokacji na Program z EFRR, w tym dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania stanowią **24 300 000 Euro**. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono **160 759 678,75 Euro (89%** alokacji na Oś).

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową) oraz działalność okołobiznesową.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek badawczo-naukowych.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 1.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 października 2014 r.* do końca czerwca 2015 r. przeprowadzono **35 naborów wniosków w procedurze konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **4 projektów kluczowych** w ramach poddziałań 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **205,97 mln Euro**, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej **196,81 mln Euro**, na nabory w ramach procedury pozakonkursowej **9,16 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **2 143 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **4 261,61 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR **1 806,77 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **1 362 wnioski** na całkowitą wartość **3 015,19 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **1 237,59 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **1 022 projekty**, na całkowitą wartość **2 386,41 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **971,84 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **789 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **1 793,68 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **750,71 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **99%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **718,15 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **95%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **706,13 mln PLN**, co stanowi około **94%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 10-11*.

Wykres 10. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

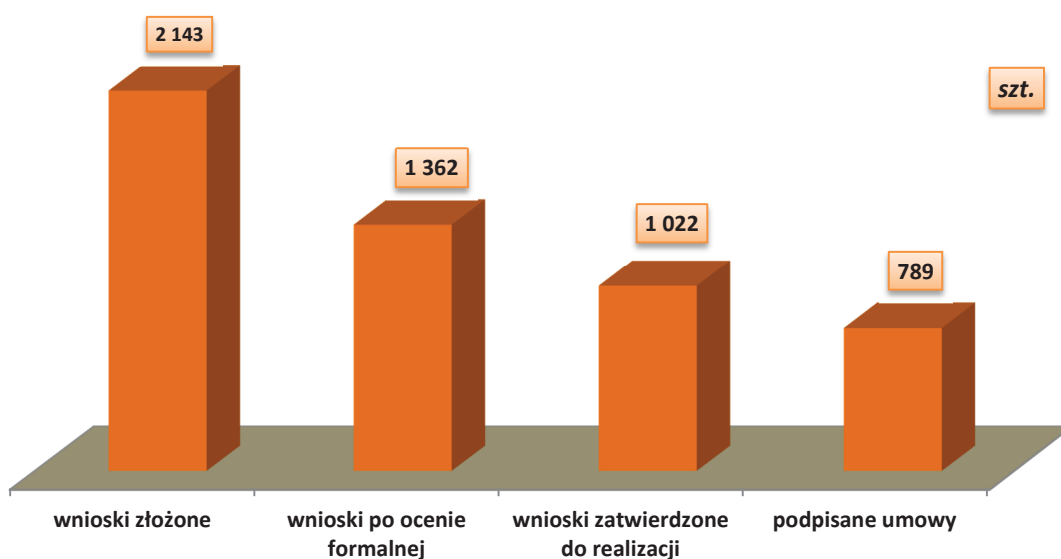

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

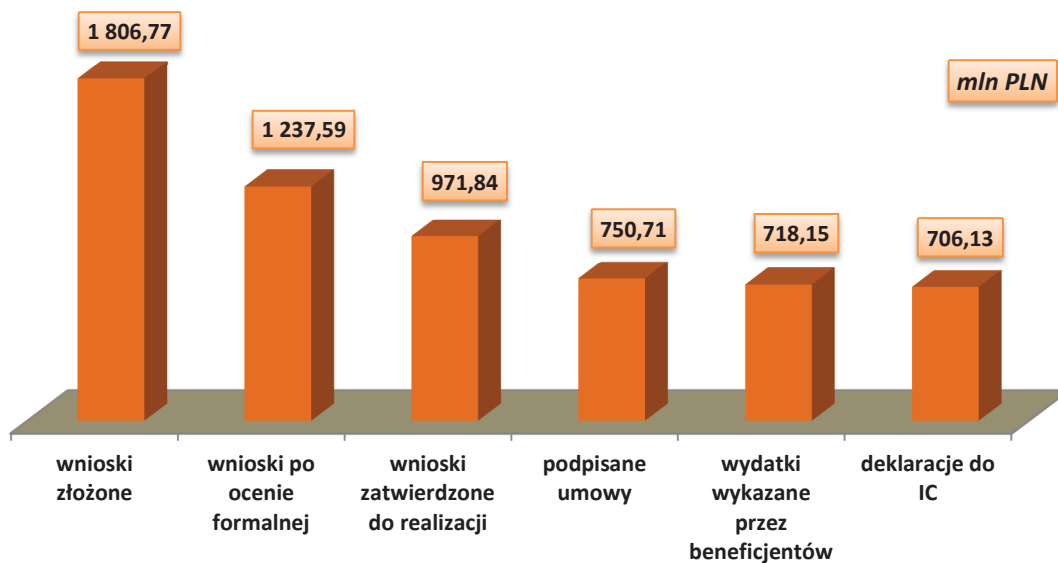

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach Osi 1.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1,

⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **103 wnioski** o całkowitej wartości **43,47 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **15,64 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **90 projektów**, których całkowita wartość wyniosła **37,50 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **13,39 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **27 umów** o dofinansowanie w ramach VI naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*. Ich całkowita wartość wyniosła **13,72 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **4,90 mln PLN**,

⇒ w okresie sprawozdawczym rozwiązano **5 umów** o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*. Łączna całkowita wartość rozwiązanych umów to **18,60 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **7,11 mln PLN**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **25,90 mln PLN** w ramach następujących działań/poddziałań:

- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – **6,40 mln PLN**,
- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – **0,92 mln PLN**,
- 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* – **1,21 mln PLN**,
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **12,69 mln PLN**,
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – **0,60 mln PLN**,
- 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **4,08 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad **3%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **39,94 mln PLN**, co stanowi ponad **6%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w *Tabeli 4*.

Tabela 4. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

[mln PLN]

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach						
VI nabór (12-26.11.2014 r.)	nie złożono wniosków		90	13,39	27	4,90
OGÓŁEM	-		90	13,39	27	4,90

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 1.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowanych jest **789** projektów, w tym **402** w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, **5** projektów z zakresu inżynierii finansowej, **239** projektów z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego oraz **143** projekty z zakresu turystyki.

Do końca I półrocza 2015 r. zakończyła się realizacja **737** projektów (93% podpisanych umów), w tym **365** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **5** projektów z zakresu inżynierii finansowej, **228** projektów innowacyjnych oraz **139** projektów z zakresu turystyki.

W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 15 wskaźników produktu oraz 14 wskaźników rezultatu. Do 30 czerwca 2015 r. rozpoczęła się realizacja wszystkich wskaźników. Poziom realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentuje *Tabela 5*. Wartości wskaźników zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz podpisane umowy, za wyjątkiem działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*, którego realizacja jest wykazywana na podstawie podpisanych umów oraz sprawozdań merytorycznych składanych w trybie miesięcznym przez beneficjentów do IP II stopnia.

Tabela 5. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
1.1	Liczba projektów z zakresu B+R, w tym: [szt.]	80	66	82,5	68	85
a	w MSP	38	40	105,3	41	107,9
1.2	Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi [szt.]	140	127	90,7	143	102,1
1.3	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: [szt.]	674	657	97,5	696	103,3
a	mikro: do 9 pracujących	475	463	97,5	494	104
b	małe: 10-49 pracujących	131	124	94,7	129	98,5
c	średnie: 50-249 pracujących	68	70	102,9	73	107,4
d	innowacyjne przedsięwzięcia	140	143	102,1	151	107,9
e	przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	22	23	104,5	24	109,1
f	firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania	197	167	84,8	186	94,4
1.4	Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia [szt.]	36	18	50	18	50
a	w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	29	18	62,1	18	62,1
1.5	Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji [mln Euro]	25,5	24,7	96,9	24,7	96,9
1.6	Liczba projektów z zakresu turystyki [szt.]	174	139	79,9	143	82,2

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
1.7	Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie [mln Euro]	17,1	14,02	82	14,07	82,3
Wskaźniki rezultatu						
1.8	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze, w tym [szt.(EPC)]:	68	57	83,8	58	85,3
a	kobiety	34	6	17,6	9	26,5
b	mężczyźni	34	51	150	49	144,1
1.9	Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym [szt. (EPC)]:	3 080	2 864,08	93	3 050,5	99
a	kobiety	1 540	594,5	38,6	621	40,3
b	mężczyźni	1 540	2 269,58	147,4	2 429,5	157,8
c	na obszarach wiejskich	1 482	1 242,45	83,8	1 366	92,2
1.10	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym [szt. (EPC)]:	896	940	104,9	908	101,3
a	kobiety	448	309	69	290	64,7
b	mężczyźni	448	631	140,8	618	137,9
c	na obszarach wiejskich	473	473	100	449	94,9
1.11	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach [szt.]	170	137	80,6	206	121,2
1.12	Dodatkowo wprowadzone inwestycje [mln Euro]	171,2	136,03	79,5	150,99	88,2
1.13	Liczba wspartych przedsiębiorstw [szt.]	520	637	122,5	529	101,7

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację: 21 wskaźników zostanie osiągniętych w granicach 25% rozbieżności od wartości zakładanej; 3 wskaźniki przekroczą zakładaną wartość; w przypadku 5 najprawdopodobniej zostanie nieosiągnięta założona wartość docelowa.

Przekroczenie oraz nieosiągnięcie wartości docelowej dotyczy wskaźników w obszarze zatrudnienia: liczba miejsc pracy dla mężczyzn została niedoszacowana, natomiast dla kobiet przeszacowana już na etapie programowania. Analogiczna sytuacja ma miejsce w obszarze badawczo-rozwojowym (144,1% do 26,5%), turystyki (137,9% do 64,7%) oraz ogółem w sektorze przedsiębiorstw (157,8% do 40,3%). Kobiety często pracują w innych branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Różnicowane jest to także takimi cechami jak wykształcenie, zaangażowanie w życie rodzinne czy oczekiwania życiowe. Ponadto, poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy niż mężczyzn: współczynnik aktywności zawodowej w 2013 r. wśród kobiet wyniósł 48,5%, natomiast wśród mężczyzn 64,4%. Ludność bierna zawodowo jest znacznie sfeminizowana – ponad 61% tej populacji stanowią kobiety. Nieuwzględnienie ww. czynników na etapie programowania liczby utworzonych miejsc pracy w podziale na płeć, w znacznym stopniu zdeterminowało znaczące odchylenia od założonych wartości docelowych. Najistotniejszą jednak kwestią, w sytuacji obserwowanego kryzysu na rynku pracy Unii Europejskiej, wydaje się być fakt, że **realizacja wskaźników głównych (ogólnych) dotyczących zatrudnienia nie jest zagrożona.**

Nieosiągnięte zostaną także wskaźniki *Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu*, których wartości na poziomie umów wyniosły na koniec I półrocza 2015 r. odpowiednio 50% i 62,1% wartości docelowej. Wynika to z kilku

czynników opisywanych już w poprzednich sprawozdaniach, tj.: szerszego zakresu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (do 30 czerwca 2015 r. w ramach działania 6.2 środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało ponad 2 200 osób); niskiej jakości złożonych wniosków w ramach naboru na *start-up* oraz rezygnacji beneficjentów z podpisywania umów oraz ich rozwiązywanie. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki IZ RPO WO 2007-2013 nie przeprowadzała dodatkowych naborów dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Obszar: Rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu są podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz wspierają nawiązywanie kontaktów roboczych przez przedsiębiorców. Zapewniają kompleksową i wszechstronną ofertę usług skierowanych do przedsiębiorstw oraz ułatwiają firmom dostęp do profesjonalnych usług okołobiznesowych. *Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku* (kontynuując zapisy *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013*) jako jedno z wyzwań wskazuje profesjonalizację i koncentrację branżową instytucji otoczenia biznesu. W województwie opolskim funkcjonują instytucje (wsparte również środkami RPO WO 2007-2013), których dotychczasowa rola w rozwoju przedsiębiorczości była i jest znacząca. Nadal istnieje jednak potrzeba poprawy przepływu informacji pomiędzy samymi instytucjami, jak i w relacjach z przedsiębiorcami; usprawnienia funkcjonowania tych instytucji. Oferta opolskich IOB jest nadal mało zróżnicowana i wymaga podejmowania przez te jednostki różnorodnych form aktywności i oferowania nowych profesjonalnych usług innowacyjnych.

W ramach poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* RPO WO 2007-2013 prowadzone są działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności firm regionu w oparciu o sektor otoczenia biznesu. Wsparcie inwestycyjne otrzymały nowe, jak i dotychczas funkcjonujące, inkubatory przedsiębiorczości, centra biznesu, centra branżowe oraz centra transferu wiedzy i technologii zapewniające kompleksową ofertę usług dla przedsiębiorstw. Gromadzą one duży potencjał wiedzy oraz doświadczenia i są one ważnym partnerem dla władz publicznych w budowaniu spójnej i efektywnej polityki gospodarczej oraz konkurencyjności przedsiębiorstw.

Od początku uruchomienia Programu realizowane są **32 projekty** w tym obszarze. Beneficjentami poddziałania są przede wszystkim szkoły wyższe (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie); jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Powiat Kluczborski, Gmina Strzelce Opolskie, Miasto Opole) oraz inne instytucje otoczenia biznesu tj., Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Instytut Trwałego Rozwoju czy Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”. Do 30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **23 projektów**. W ich wyniku:

- wsparcie otrzymały **23** instytucje otoczenia biznesu, które udzieliły dostępu do usług okołobiznesowych **4 832** przedsiębiorstwom;
- utworzono **11** nowych inkubatorów przedsiębiorczości (w tym **1** akademicki); ponadto **3** inkubatory zostały rozbudowane;
- przy wsparciu inkubatorów powstaną **164** nowe przedsiębiorstwa;
- **137** przedsiębiorstw ulokowano w inkubatorach, zapewniając im lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach, jak również pomoc instytucjonalną, szkoleniową i doradczą związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem;
- powstały branżowe centra biznesu wspierające sektor budowlany, sektor odnawialnych źródeł energii oraz branżę meblarską i wyposażenia wnętrz;
- utworzono i wyposażono regionalne centrum transferu wiedzy i technologii w Nysie.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Miasta Opolu *Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu*. Potrzeba jego realizacji wynikała z konieczności wyposażenia powstającego Regionalnego Centrum Biznesu (dofinansowanego również ze środków RPO WO 2007-2013) w urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności okołobiznesowej przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe.

Celem inwestycji było umożliwienie świadczenia nowych usług, związanych z tworzeniem i rozszerzeniem działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym stworzenia sieci wsparcia przedsiębiorczości o zasięgu regionalnym. Nowoczesny sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie zakupione w ramach projektu pozwoli na organizację targów i konferencji na światowym poziomie przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych. Długoterminowe korzyści z funkcjonowania wyposażonego w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego odczuwalne będą dla wielu grup beneficjentów. Nowocześnie wyposażony obiekt umożliwi organizację imprez targowych, seminariów, szkoleń i konferencji na najwyższym poziomie. Dzięki temu, korzystające z oferty podmioty gospodarcze i instytucje sektora B+R, staną się bardziej konkurencyjne na regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku.

Przykładem projektu przyczyniającego się do rozwoju przedsiębiorczości jest także zakończony już projekt *Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju*. Jego głównym celem było wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego. Na rynku rośnie popyt na inteligentne rozwiązania kwestii środowiskowych, natomiast maleje zapotrzebowanie na tradycyjne usługi związane z naliczaniem opłat środowiskowych oraz tradycyjnym doradztwem. Centrum ma charakter strefy biznesu, stanowi najlepsze miejsce dla innowacyjnych firm oraz zaspokaja potrzeby przedsiębiorców, którzy oczekiwali od władz samorządowych sprawnego i efektywnego działania, umożliwiającego realizację różnego rodzaju inwestycji powiązanych z kwestiami środowiskowymi. Nowoczesna infrastruktura architektoniczna i techniczna spełniła wszelkie standardy niezbędne do funkcjonowania każdej nowoczesnej firmy technologicznej, a tym samym jej sprawniejsze i skuteczniejsze wejście na rynek oraz rozwój działalności. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu: świadczone będą 3 nowe usługi; wsparcie otrzymają **182** przedsiębiorstwa, z czego **10** – nowopowstałe firmy.

Najwięcej projektów realizowanych jest w stolicy województwa Opolu (**16** projektów), w powiecie oleskim i strzeleckim (po **4** projekty) oraz w powiecie kluczborskim (**3** projekty). Zdecydowana większość IOB proponuje usługi okołobiznesowe dla przedsiębiorstw niezależnie od branży, w której działają, tj. doradztwo, szkolenia, dostęp do infrastruktury i pomieszczeń, pomoc w organizacji targów, konferencji, szkoleń. Nie brak jednak również usług wyspecjalizowanych, m.in. dla branży budowlanej, przemysłu meblarskiego, firm związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi czy na potrzeby rozwoju działów badawczo-rozwojowych w firmach innowacyjnych.

Przewiduje się, że w wyniku realizacji wszystkich projektów, dla których podpisano umowy:

- wsparcie otrzymają **33** instytucje otoczenia biznesu;
- powstanie **12** nowych inkubatorów przedsiębiorczości, kolejne **4** zostaną rozbudowane;
- powstanie **10** centrów/sfer biznesu oraz **5** centrów transferu technologii i zaawansowanych technologii;
- utworzonych zostanie **80** miejsc pracy, w tym **31** dla kobiet;
- instytucje otoczenia biznesu udzielą wsparcia ponad **5 400** przedsiębiorstwom, m.in. z branży budowlanej, meblarskiej, rolnej, turystycznej, ochrony środowiska, technologii IT;
- przy wsparciu IOB powstanie **239** nowych przedsiębiorstw;
- **206** przedsiębiorstw zostanie ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach.

Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Sektor MŚP pełni ważną rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej i wzmacnianiu potencjału gospodarczego województwa opolskiego. Aktywne i dynamiczne przedsiębiorstwa wpływają zarówno na wzrost gospodarczy regionu, jak również pozytywnie oddziałują na rynek pracy. W obliczu problemów demograficznych województwa opolskiego, konieczne jest budowanie silnego biznesu, wspieranie przedsiębiorstw, w tym nowoczesnego rzemiosła.

Celem poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* RPO WO 2007-2013 jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw województwa opolskiego oraz zwiększenie ich konkurencyjności poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej, technologicznej oraz wzrost ich możliwości inwestycyjnych.

Od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.1.2 realizowanych jest **370 projektów**. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **342** projektów. Zauważalne już dziś efekty interwencji są następujące:

- zostało utworzonych blisko **990** miejsc pracy (**174,5** dla kobiet), w tym **442,25** na obszarach wiejskich;
- działalność gospodarczą rozpoczęło **18** mikroprzedsiębiorstw;
- w ramach nowopowstałych firm bezpośrednio powstało **20** nowych miejsc pracy (w tym **2** dla kobiet);
- dzięki dokonanych inwestycjom firmy mogą zaoferować ponad **800** usług/produktów;
- **20** mikroprzedsiębiorstw dokonało zmian w produkcji przyczyniających się do ochrony środowiska;
- około 35% projektów (**119**) zrealizowały firmy stosunkowo nowe na rynku, tj. funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata.

Analizując rozkład zakończonych projektów w ramach Sekcji PKD 2007, pierwszą pod względem liczby realizowanych projektów jest **Sekcja F Budownictwo**, w ramach której zrealizowano **78** inwestycji, co stanowi **blisko 23%** wszystkich zakończonych projektów. Zgodnie ze *Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.* budownictwo stanowi jedną ze zdefiniowanych specjalizacji regionalnych województwa. Najwięcej zakończonych projektów z tego sektora dotyczy wykonywania specjalistycznych robót budowlanych, m.in. usług w zakresie robót ziemnych podstawowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Przemysł materiałów budowlanych (cementowo-wapienniczy, wyroby betonowe, gipsowe, produkcja szkła i wyrobów ze szkła) stanowi istotną pozycję konkurencyjną w gospodarce Opolszczyzny.

Wśród projektów zakończonych, kolejną grupę stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach **Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe**. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **75** umów (około **22%** zakończonych projektów).

Ze względu na udział jako trzecia zaklasyfikowała się **Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle**, w ramach której zakończyła się realizacja **54** projektów (około **16%** zakończonych projektów). Identyczna liczba projektów zakończyła się w **Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna**. Wsparcie uzyskały gabinety specjalistyczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi, na które istnieje duże zapotrzebowanie w województwie.

Jednym z zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2 jest inwestycja pn. *Podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa poprzez budowę obiektu warsztatowo magazynowego w Strzelcach Opolskich*. Głównym celem przedsięwzięcia było unowocześnienie i rozszerzenie możliwości usługowych prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia wysoce specjalistycznych usług z zakresu kładzenia linii energetycznych napowietrznych, jak i ziemnych. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie przedsiębiorstwa i jego unowocześnienie na kolejnym etapie

ekspansji rynkowej oraz ułatwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowania pozycji i przejęcia części lokalnego rynku. W ramach zakończonej inwestycji powstały 3 miejsca pracy.

Kolejnym przykładem projektu przyczyniającego się do wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej regionu jest projekt *Powstanie składu budowlano-opałowego w Byczynie. Ekologiczna specjalizacja w ofercie opałowej*. Projekt zakończył się w okresie sprawozdawczym, a jego podstawowym celem było ugruntowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku sprzedaży materiałów budowlanych, opału oraz kotłów grzewczych. Nabywcy materiałów budowlanych oczekiwali od firmy wysokiej jakości towarów, terminowości realizacji zamówień oraz kompleksowości przy zachowaniu umiarkowanych cen. Klienci oczekiwali również możliwie wyspecjalizowanej usługi sprzedaży bez konieczności poszukiwania części asortymentu u innych dostawców materiałów budowlanych. Oferta przedsiębiorstwa nie spełniała tych oczekiwań. Potrzebą wnioskodawcy było także przebudowanie posiadanej nieruchomości na pawilon materiałów budowlanych i opału oraz zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń, w celu rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży dla branży budowlanej jak i osób fizycznych. W wyniku realizacji projektu przebudowano nieruchomości na pawilon materiałów budowlanych i opału oraz zakupiono zestaw niezbędnych do prowadzenia działalności środków trwałych. Powierzchnia wybudowanych obiektów wyniosła **1142,10 m²**. Firma jako jedyne przedsiębiorstwo w gminie sprzedaje kotły grzewcze oraz jako jedyne oferuje zarówno sprzedaż materiałów budowlanych, opału w tym opału ekologicznego.

Obszar: Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości

Celem działania jest wzrost dynamiki rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości.

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.2 realizowanych jest 5 umów o dofinansowanie na kwotę **102 mln PLN**. W sumie zasilono 3 instrumenty inżynierii finansowej (jeden z instrumentów realizuje 3 umowy). Cztery z realizowanych projektów polegają na utworzeniu funduszu pożyczkowego dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a jeden projekt dotyczy wsparcia regionalnego funduszu poręczeniowego.

W ramach działania 1.2 beneficjenci podpisali umowy o wsparcie **984** przedsiębiorców (**870** pożyczek i **114** poręczeń), co zaangażowało w sumie **160,07 mln PLN** ze środków EFRR. Podpisane z przedsiębiorcami umowy wykorzystują przyznane środki w ponad **157%**. Wynika to z faktu, że w przypadku wszystkich umów trwa kolejny obrót środkami. W Tabeli 6 przedstawiono informacje nt. realizowanych umów.


Tabela 6. Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu

[mln PLN]


Lp.	Beneficjent	Umowy podpisane z beneficjentem		Umowy podpisane przez beneficjenta z ostatecznymi odbiorcami		
		Liczba	Wartość dofinansowania EFRR	Liczba udzielonych pożyczek/poręczeń	Wartość odpowiadająca dofinansowaniu ze środków UE	% realizacji umowy przez beneficjenta
1.	FRŚIWIL	1	23,00	335 pożyczek	47,35	206%
2.	FRŚIWIL	1	20,00	219 pożyczek	39,04	195%
3.	FRŚIWIL	1	26,00	190 pożyczek	35,08	135%
4.	WFOŚIGW	1	23,00	126 pożyczek	24,20	105%
5.	ORFPK	1	10,00	114 poręczeń	14,40	144%
OGÓŁEM		5	102,00	984	160,07	157%

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie sprawozdań miesięcznych z działalności funduszy poręczeniowych/pożyczkowych, wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Wykres 12. Liczba i wartość udzielonych pożyczek w podziale na rodzaje przedsiębiorstw

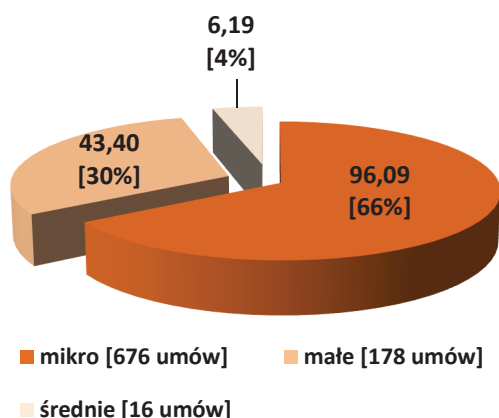

Wykres 13. Liczba i wartość udzielonych poręczeń w podziale na rodzaje przedsiębiorstw



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie sprawozdań miesięcznych z działalności funduszy poręczeniowych/pożyczkowych, wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Obszar: *Innowacje, badania, rozwój technologiczny*

Szansą na skuteczne konkurowanie przedsiębiorstw w warunkach rynkowych jest ich ciągły rozwój, głównie poprzez inwestowanie w nowoczesne technologie i innowacje. Ważna jest przy tym otwartość i nastawienie sektora przedsiębiorstw na gospodarkę opartą na wiedzy, a także gotowość i otwartość na zmiany, m.in. w zakresie organizacji i struktur. Wdrażanie nowych czy też innowacyjnych rozwiązań wymaga dużych nakładów, w szczególności finansowych, a także w wielu przypadkach współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami sfery badawczo-rozwojowej: jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, czy przedsiębiorstwami prowadzącymi zaawansowaną działalność B+R.

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.3 *Innowacje, badania, rozwój technologiczny* zakończyła się realizacja **228** projektów, z czego **24** w okresie sprawozdawczym.

W wyniku realizacji zakończonych projektów utworzonych zostało ponad **1 030 miejsc pracy** w przedsiębiorstwach (**155** dla kobiet), w tym blisko **350** na obszarach wiejskich. Ponadto, utworzono **57 etatów badawczych** w zakresie B+R. Powstały **423 nowe produkty/usługi** oraz wdrożono **168 wyników prac B+R**.

Projekty z zakresu B+R

Jednym z ogniw efektywnego wdrażania systemu innowacji w gospodarce jest zaplecze naukowo-badawcze. Dlatego działania na rzecz budowy innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki obejmują przede wszystkim tworzenie warunków sprzyjających współpracy sektora badawczo-rozwojowego z biznesem, w tym wspieranie parków przemysłowych i naukowo-technologicznych. W regionie wciąż zbyt mało jest przedsiębiorstw wdrażających własne rozwiązania technologiczne. Jednocześnie aktywność jednostek naukowych w zakresie komercjalizacji wypracowanych rozwiązań jest śladowa. Dlatego niezbędne jest zbliżenie obu środowisk oraz powiązanie ich wzajemnych relacji (korzyści i potrzeb) tak, aby zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy dostrzegli zalety współdziałania w zakresie praktycznego zastosowania prowadzonych badań i ich wyników. W konsekwencji powinno to doprowadzić do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Projekty dotyczące wsparcia sfery badawczo-rozwojowej realizowane są zarówno przez jednostki badawczo-rozwojowe w ramach kategorii interwencji 02 i 03, jak i przez przedsiębiorstwa w ramach kategorii interwencji 04. Zwiększenie oferty jednostek sektora B+R na potrzeby gospodarki oraz zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystania wyników prac B+R jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw to podstawowe cele projektów dotyczących wsparcia sfery badawczo-rozwojowej.

W ramach poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* realizowanych jest **27** projektów z zakresu B+R. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **26 inwestycji**.

W wyniku realizacji zakończonych projektów:

- w **5** ośrodkach badawczych powstało **10** laboratoriów, z usług których skorzysta **18** przedsiębiorstw;
- zakupiono blisko **200 sztuk** aparatury badawczej;
- w **58** przypadkach praktycznie zastosowano wyniki wspartych projektów badawczych i rozwojowych w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego;
- przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury zostało zrealizowanych **6** projektów badawczych, rozwojowych i celowych;
- zrealizowano **127** projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi;
- dokonano **12** transferów technologii pomiędzy zaangażowanymi podmiotami;
- utworzono **3** etaty badawcze, w tym **1** dla kobiety.

W ramach poddziałania 1.3.1 w okresie sprawozdawczym trwała realizacja ostatniego projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji*, polegającego na tworzeniu i udoskonaleniu sieci współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w województwie opolskim. Główny cel projektu zdefiniowano jako wzmocnienie współpracy sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji Opolszczyzny. Istotnym działaniem realizowanym w ramach projektu jest również promocja innowacyjności, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wyników badań i wiedzy, organizację i udział w targach, misjach gospodarczych czy giełdach kooperacyjnych.

W ramach projektu powstały:

- *Platforma Wymiany Innowacji* – narzędzie wspierające zarządzanie procesami i projektami, a w szczególności służące transferowi wiedzy w sieci współpracy;
- *Akcelerator Innowacji* – zintegrowany system proinnowacyjnych usług dla MŚP, którego celem jest rozwijanie sieci ośrodków innowacji, podnoszenie jakości świadczonych usług dla różnych branż zawodowych, wspieranie rozwoju klastrów zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny oraz kompleksowy system opieki nad firmą w początkowym okresie jej istnienia;
- *Klub 150* – inicjatywa zrzeszająca kluczowe firmy regionalnej gospodarki w celu transferu technologii oraz stworzenia i umocnienia powiązań branżowych pomiędzy uczestnikami Klubu i ich kooperantami.

Ponadto, w ramach kategorii interwencji 04 od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* **40 przedsiębiorstw zrealizowało projekty z zakresu B+R**. W ich ramach utworzono **47** etatów badawczych, w tym **5** dla kobiet. Wprowadzono **52** nowe usługi/produkty oraz wdrożono **54** wyniki prac B+R. W ramach zakończonych projektów utworzono także **23** laboratoria.

Jedną z zakończonych inwestycji w zakresie B+R jest projekt pn. *Utworzenie laboratorium B+R w zakresie badań oblodzenia linii elektro-energetycznych*. Podstawowym celem przedsięwzięcia było stworzenie warunków do badania i rozwoju produktów przedsiębiorstwa poprzez utworzenie laboratorium B+R w zakresie wytwarzania prototypów systemu pomiaru i analizy oblodzenia linii elektro-energetycznych, służących do ich monitorowania i diagnozowania, które następnie będą wdrażane u poszczególnych klientów. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt, aparaturę pomiarową oraz niezbędne oprogramowanie. W wyniku wdrożenia projektu w przedsiębiorstwie

została wdrożona innowacja produktowa, tj. system pomiaru i analiz oblodzenia linii napowietrznych, który będzie ostrzegał służby dyspozytorskie w zakresie stanu oblodzenia linii w celu usunięcia złodowacenia zanim dojdzie do awarii.

Projekty innowacyjne

W ramach poddziałania 1.3.2 do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **143** projektów innowacyjnych w ramach kategorii interwencji 07 *Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)*.


Część przedsiębiorców prowadziła badania w ramach własnej jednostki B+R; część współpracowała z regionalnymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, tj. Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Instytutem Materiałów Wiążących w Opolu, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Niektórzy beneficjenci korzystali z oferty współpracy instytucji krajowych, tj. Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

W wyniku inwestycji, które zostały zakończone:

- utworzono **około 880** miejsc pracy (**145** dla kobiet), w tym około **310** na obszarach wiejskich;
- utworzono **7** etatów badawczych;
- wdrożono **99** wyników prac B+R;
- powstało **338** nowych produktów/usług;
- **3** przedsiębiorstwa dokonały zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza;
- **2** przedsiębiorstwa dokonały zmian w produkcji w zakresie gospodarki odpadami;
- zmniejszy się ilość wytwarzanych odpadów o ponad **180 ton rocznie**.

W zrealizowanych projektach można wyróżnić 3 rodzaje wprowadzanych innowacji: innowacje produktowe, procesowe oraz proceduralne. Największą grupę stanowią beneficjenci, którzy wdrożyli jednocześnie **innowacje procesowe i produktowe** (58%), natomiast najrzadziej w ramach projektów przeprowadzane są zmiany w obszarze systemu zarządzania firmą (ok.2%). Na wprowadzanie zmian w technologii, zakup nowych maszyn i urządzeń (**innowacja procesowa**) zdecydował się niemal co 4 beneficjent (ok.23% zakończonych projektów). Natomiast **innowację produktową** (wprowadzanie nowych/ulepszonych lub zmodernizowanych produktów i usług) wdrożyło 24 beneficjentów.

Wykres 14. *Udział poszczególnych rodzajów innowacji w ramach zakończonych projektów innowacyjnych (kategoria interwencji 07)*

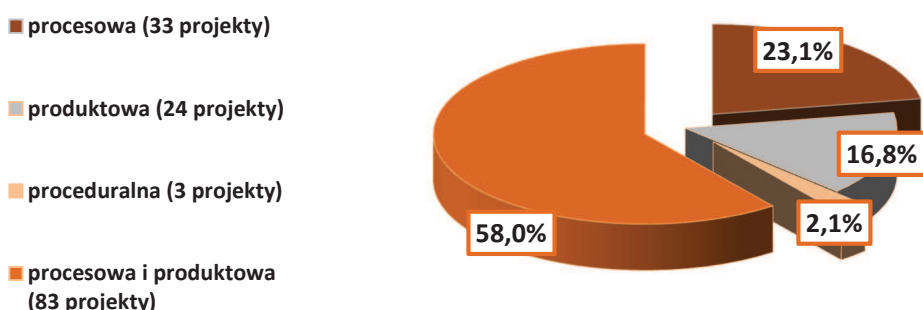

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja inwestycji pn. *Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie wytwarzania szkła dekoracyjnego oraz wielkogabarytowych szklanych elementów konstrukcji o nieregularnych kształtach*. Poprzez inwestycje w środki trwałe związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, tj. zakup linii do wytwarzania szkła dekoracyjnego i zakup linii do wytwarzania wielkogabarytowych szklanych elementów konstrukcji o nieregularnych kształtach, stosowanych jako wypełnienie elewacji budynków oraz elementy architektury wewnętrznej, nastąpiła dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu dodatkowych produktów. Inwestycja umożliwiła wprowadzenie do sprzedaży szkła dekoracyjnego z cyfrowym nadrukiem ceramicznym o rozdzielczości 720 dpi, które może służyć jako element dekoracyjny ścian, wypełnienie szaf wnękowych czy element zabudowy łazienek. Dodatkowo projekt przyczynił się do produkcji wielkogabarytowych szklanych elementów konstrukcji o nieregularnych kształtach z cyfrowym drukiem ceramicznym służącym m.in. do wypełnienia aluminiowych bądź stalowych systemów elewacji zewnętrznej budynków czy wypełnienia balustrad wewnętrznych i zewnętrznych. Stworzenie nowych linii jest efektem wdrożenia rozwiązań innowacyjnych wypracowanych we współpracy z Politechniką Opolską.

Przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem

W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* do końca I półrocza 2015 r. zakończyła się realizacja **19** projektów prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych [kategoria interwencji 06 *Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)*]. Do najczęstszych korzyści jakie beneficjenci wymieniają z tytułu wdrażania technologii środowiskowych zaliczyć można: ograniczenie energochłonności i materiałochłonności procesów produkcyjnych, obniżkę emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa, zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza lub poziomu hałasu, powtórne wykorzystanie odpadów (recykling) i odzysk energii.

W wyniku realizacji zakończonych projektów:

- **6** przedsiębiorstw dokonało zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza, w tym dokonano ograniczenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza o **15,68 ton/rok**;
- **3** przedsiębiorstwa dokonały zmian w produkcji w zakresie gospodarki odpadami, w tym zmniejszono ilość wytwarzanych odpadów o ponad **2 360 ton/rok**;
- **2** przedsiębiorstwa dokonały zmian w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- utworzono **138** miejsc pracy (**9** dla kobiet), w tym **36** na obszarach wiejskich;
- wdrożono **15** wyników prac B+R;
- wprowadzono **33** nowe produkty/usługi;
- wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie wyniosła około **11,7 mln Euro**.

Jednym ze zrealizowanych projektów prośrodowiskowych i innowacyjnych jest projekt pn. *Utworzenie innowacyjnej i proekologicznej stacji paliw w Praszcze*. W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia nowopowstałego obiektu, w tym proekologiczne zbiorniki i dystrybutory paliw oraz zaawansowane technologicznie urządzenia diagnostyczne do mierzenia poziomu spalin samochodowych oraz oprogramowanie sterujące procesami badawczymi. Projekt umożliwi nie tylko funkcjonowanie jednej z najnowocześniejszych stacji paliw w regionie, ale także wdrożenie innowacji przy współpracy z uczelnią wyższą. System pomiarowy zamontowany na nowej stacji wykorzystuje doświadczenia naukowców z Politechniki Opolskiej w zakresie badań zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe. Realizowane wspólnie z Politechniką Opolską programy badawcze w zakresie zmniejszenia emisji spalin przekładają się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa, jak i gospodarki całego regionu.

Obszar: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

Ważnym potencjałem rozwoju regionu są turystyka i sport. Bogactwo przyrodniczo-kulturowe stwarza możliwości do rozwoju aktywności gospodarczej w zakresie turystyki, kultury, rekreacji i sportu. Znaczącym potencjałem cechują się zwłaszcza miasta i wsie o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym. Atrakcyjnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują się, objęte konserwatorską ochroną przyrody parki krajobrazowe i obszary leśne (np. Góra św. Anny, Góry Opawskie, Stobrawski Park Krajobrazowy). Obszary przyrodnicze są także predysponowane do uprawiania rekreacji, turystyki aktywnej i mogą stanowić dobrą bazę treningową dla uprawiających sporty. Nową atrakcją turystyczną stanowi unikatowe w skali europejskiej paleontologiczne stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Trias” w Krasiejowie – Jurapark. Przekształcone w markowy produkt turystyczny związany z utworzeniem jednego z największych w Europie parków tematycznych poświęconych dinozaurom, stało się znaczącym walorem turystyczno-rekreacyjnym regionu.

Dobiegający końca proces wdrażania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 potwierdza, że podejmowane w ramach obszaru turystyki interwencje przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez zdecydowany wpływ na proces tworzenia nowych miejsc pracy: wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego dzięki realizacji projektów turystycznych powstało 940 miejsc pracy, czyli na poziomie większym niż zaprogramowano.

W ramach działania 1.4 *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej* od uruchomienia Programu podpisano **143** umowy na realizację projektów z zakresu turystyki.

Do końca I półrocza 2015 r. zakończonych zostało **139** projektów, w tym **113** zrealizowanych przez przedsiębiorstwa oraz **26** przez podmioty publiczne. W wyniku ich realizacji utworzonych zostanie **940** miejsc pracy w turystyce (**309** dla kobiet), w tym **473** na obszarach wiejskich.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.4.1 podpisano **114** umów na realizację projektów z zakresu turystyki, z których **113** już się zakończyło (99,1%). W wyniku ich realizacji zwiększa się rola turystyki, rekreacji i sportu jako czynników pozytywnie wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego, w tym przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy. Wyższy standard obiektów turystycznych, w szczególności bazy noclegowej i gastronomicznej, likwidowane bariery uniemożliwiające korzystanie z obiektów osobom niepełnosprawnym, polepszony dostęp do regionalnych atrakcji oraz obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, przyciągają coraz więcej turystów spoza regionu, w tym zagranicznych.

W wyniku zakończonych projektów:

- powstało **840** miejsc pracy w przedsiębiorstwach w turystyce (**265** dla kobiet), w tym **452** na obszarach wiejskich;
- turystom udostępniono **954** miejsca noclegowe;
- wybudowano **94**, a przebudowano **78** obiektów turystycznych i rekreacyjnych;
- szacuje się, iż blisko **5,6 mln** turystów skorzysta ze zmodernizowanej bazy obiektów turystycznych i rekreacyjnych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu *Piękna wieś opolska - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Kuniowie*. Beneficjent planując inwestycję wykorzystał walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe rejonu kluczborsko-oleskiego, a także fakt krzyżowania się w tym miejscu ważnych komunikacyjnych traktów kolejowych i drogowych i bezpośredniego sąsiedztwa z województwami łódzkim i wielkopolskim. W całej gminie Kluczbork brakuje obiektów turystycznych oferujących kompleksowy zakres usług w jednym obiekcie co bezpośrednio wpływa na niewielkie wykorzystanie oferty kulturalnej i przyrodniczej rejonu. W Kuniowie, który słynie z bardzo dużej aktywności w organizowaniu przeróżnych wydarzeń społeczno-kulturalnych brakuje stałej bazy

infrastrukturalnej dla obsługi ruchu turystycznego. Słabe perspektywy rozwojowe i brak atrakcyjnych ofert zatrudnienia sprawiały, że wieś powoli zaczęła się wyludniać. Wnioskodawca dysponował sporą działką, na której zlokalizowany był duży obiekt kubaturowy w stanie surowym zamkniętym. Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie nieużytkowanego obiektu na pensjonat z przestronnymi salami okolicznościowymi (np. na potrzeby organizacji konferencji), okazałym zapleczem noclegowym oraz zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw dla dzieci, parking, zewnętrzne sauny, tradycyjna wiejska osada). Ważnym elementem inwestycji był jej prospołeczny charakter – beneficjent aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów w celu aktywizacji lokalnej społeczności. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostało **17** miejsc pracy.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez sektor publiczny

Od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* realizowanych jest **29** projektów. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **26 inwestycji**, w wyniku których został podwyższony standard zasobów infrastrukturalnych instytucji zajmujących się rozwojem sportu, nastąpiła poprawa dostępności do publicznej infrastruktury sportowej w regionie, a także wzmocniona została pozycja i rozpoznawalność województwa opolskiego w skali kraju, dzięki realizacji szeregu zadań z zakresu promocji i informacji w oparciu o wykorzystanie walorów turystycznych Opolszczyzny.

Projekt *Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin* był jednym z projektów, których realizacja zakończyła się w okresie sprawozdawczym. Jego celem było zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa opolskiego poprzez wypromowanie walorów i atrakcji turystyczno-rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych o ugruntowanej tradycji, stanowiących wizytówkę regionu, a także budujących wizerunek województwa opolskiego przyjaznego rodzinie. Województwo opolskie było w porównaniu do innych województw częściej odwiedzane ze względu na odwiedziny znajomych i rodziny, niż z pozostałych względów urlopowych. Atuty turystyczne były słabo wypromowane, szczególnie poza granicami regionu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była niedostateczna promocja przedsięwzięć, wynikająca z braku środków finansowych oraz systemowych rozwiązań w zakresie promocji. W wyniku realizacji projektu województwo opolskie otworzyło się na rodziny i ich oczekiwania względem wspólnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Projekt objął działaniami promocyjnymi miejsca o wysokiej atrakcyjności turystycznej, ponieważ ich potencjał gwarantował przyciągnięcie uwagi i zainteresowanie turystów. Promocja w mediach polegająca m.in. na przygotowaniu i emisji spotów reklamowych, ogłoszeń i informacji, debat, billboardów, banerów i innych reklam zewnętrznych pomogła w dotarciu do rodzin z ościennych województw. Projekt w dużym stopniu poprawił atrakcyjność turystyczną województwa opolskiego i był jednym z elementów procesu zmiany wizerunku województwa jako obszaru atrakcyjnego turystycznie i skupił się na promocji miejsc i wydarzeń stanowiących wizytówkę regionu.

W wyniku zakończonych inwestycji:


- powstało **100** miejsc pracy (**44** dla kobiet), w tym **21** na obszarach wiejskich;
- wybudowano/przebudowano **23** obiekty sportowo-rekreacyjne, z których oferty skorzystało ponad **924 tys.** osób;
- **12** obiektów turystycznych i rekreacyjnych zostało wybudowanych; kolejnych **11** zostało przebudowanych;
- długość wybudowanych/oznakowanych ścieżek rowerowych wyniosła ponad **108 km**;
- wybudowano **9,3 km** szlaków turystycznych, a **4,25 km** zostało przebudowanych;
- z systemu rezerwacji i informacji turystycznej skorzystało ponad **6 tys.** turystów.

Podsumowanie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw

W ramach działań skierowanych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (tj. poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*) od uruchomienia Programu podpisano łącznie **696** umów. Do końca czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **657** projektów (94,4%).

Wykres 15 przedstawia rozkład podpisanych umów w podziale na sekcje gospodarki w oparciu o klasyfikację PKD 2007, dokonany na podstawie danych uzyskanych z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Dla potrzeb sprawozdania każdemu beneficjentowi przyporządkowano jeden, przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykres 15. Rozkład podpisanych umów w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1 wg Sekcji PKD 2007

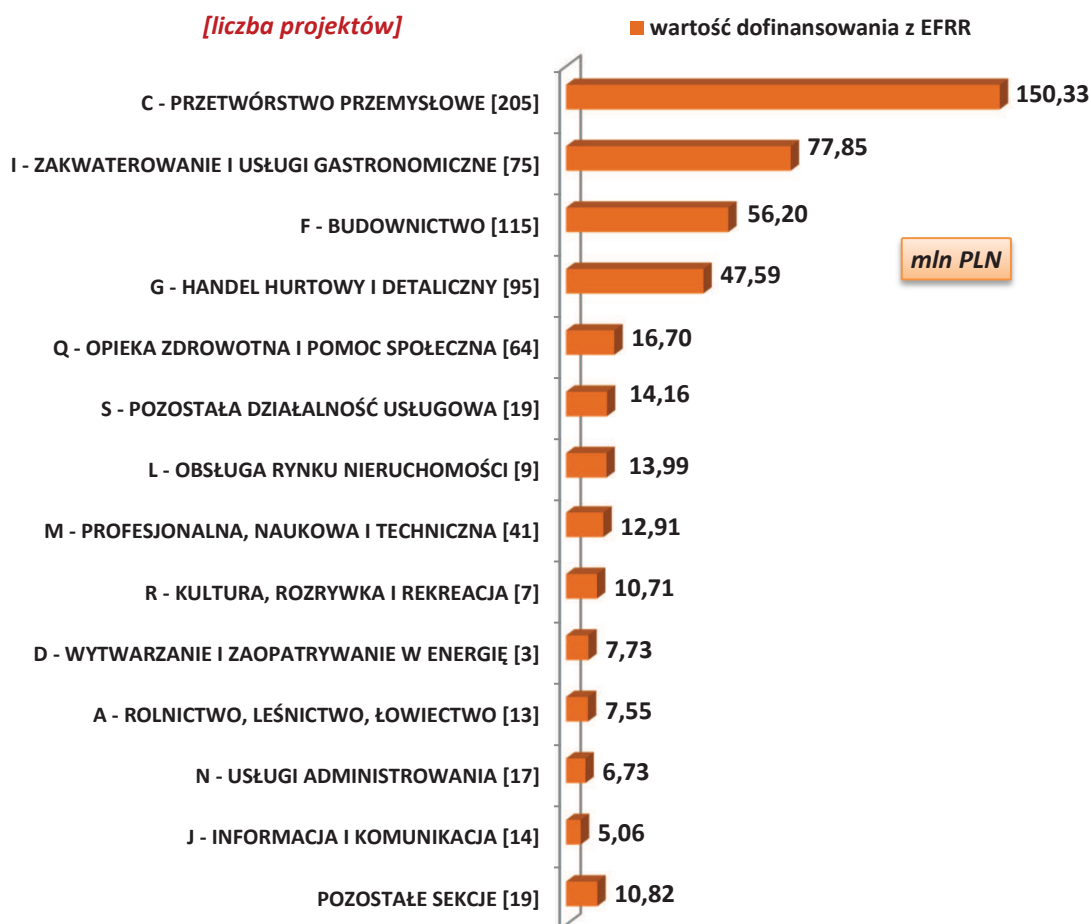

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz REGON.

W ramach podpisanych umów największe dofinansowanie z EFRR otrzymali beneficjenci działający w Sekcji C *Przetwórstwo przemysłowe*. W ramach tej sekcji podpisano **205** umów na kwotę wsparcia z UE ponad **150 mln PLN**. Największym wsparciem zostały objęte działy:

- *Dział 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych* (30 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **28,16 mln PLN**);
- *Dział 16 Produkcja wyrobów z drewna i korka* (30 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **21,86 mln PLN**);
- *Dział 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych* (22 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR **19,45 mln PLN**);

- *Dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych* (20 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **16,89 mln PLN**);
- *Dział 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych sztucznych* (13 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **11,55 mln PLN**);
- *Dział 24 Produkcja metali* (6 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **11,23 mln PLN**);
- *Dział 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana* (17 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **8,82 mln PLN**);
- *Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych* (10 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **5,95 mln PLN**).

Kolejną wyróżniająca się sekcją jest Sekcja I *Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi*, w ramach której podpisano **75** umów na kwotę blisko **78 mln PLN**. Największa pula środków w ramach powyższej sekcji (73,19 mln PLN) została przekazana do działu gospodarki 14 *Hotele i restauracje*.

Kwota **56,20 mln PLN** dofinansowania z UE trafiła do Sekcji F *Budownictwo*, w ramach której podpisano **115** umów. Rozkład podpisanych umów na poszczególne działy przedstawia się następująco:

- *Dział 43 Roboty budowlane specjalistyczne* (65 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **29,98 mln PLN**);
- *Dział 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej* (29 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **14,87 mln PLN**);
- *Dział 41 Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków* (21 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **11,36 mln PLN**).

Czwartą znacząca sekcją pod względem wielkości pozyskanego dofinansowania z UE okazała się Sekcja G *Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle* – w ramach której realizowanych jest **95** umów na kwotę dofinansowania z EFRR **47,59 mln PLN**. Rozkład podpisanych umów na poszczególne działy przedstawia się następująco:

- *Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi* (38 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **23,64 mln PLN**);
- *Dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi* (35 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **16,49 mln PLN**);
- *Dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych* (22 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR **7,46 mln PLN**).

Sekcje, w których udział pozyskanego dofinansowania jest stosunkowo niewielki (poniżej **5 mln PLN**), zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pn. *Pozostałe sekcje*. Dotyczy to nw. sekcji:

- Sekcja B *Górnictwo i wydobywanie*;
- Sekcja H *Transport i gospodarka magazynowa*;
- Sekcja E *Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją*;
- Sekcja K *Działalność finansowa i ubezpieczeniowa*;
- Sekcja P *Edukacja*.

OŚ PRIORYTETOWA 2 *Spółeczeństwo informacyjne*

Celami Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* są:

- tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT,
- promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 2 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Alokacja na realizację Osi priorytetowej 2 została zwiększona o dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania **4 155 658 Euro**, co stanowi 16% dotychczasowej alokacji na tę Oś. Zgodnie z zapisami Programu łączna kwota alokacji wynosi **29 784 347 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **6%** środków Programu. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 2.

W ramach Osi podejmowane są działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiejętności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozszerzania usług publicznych w tym zakresie.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, jednostek ochrony zdrowia.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 2.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **3 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** – odpowiednio 1 nabór w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* oraz 2 nabory w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **28,73 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **79 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **253,80 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **211,57 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **68 wniosków** na całkowitą wartość **219,90 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **180,07 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **36 projektów**, na całkowitą wartość **157,56 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **130,61 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **33 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **142,25 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **118,11 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **100,5%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **113,18 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **96%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **111,31 mln PLN**, co stanowi około **95%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 2 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 16-17.

Wykres 16. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

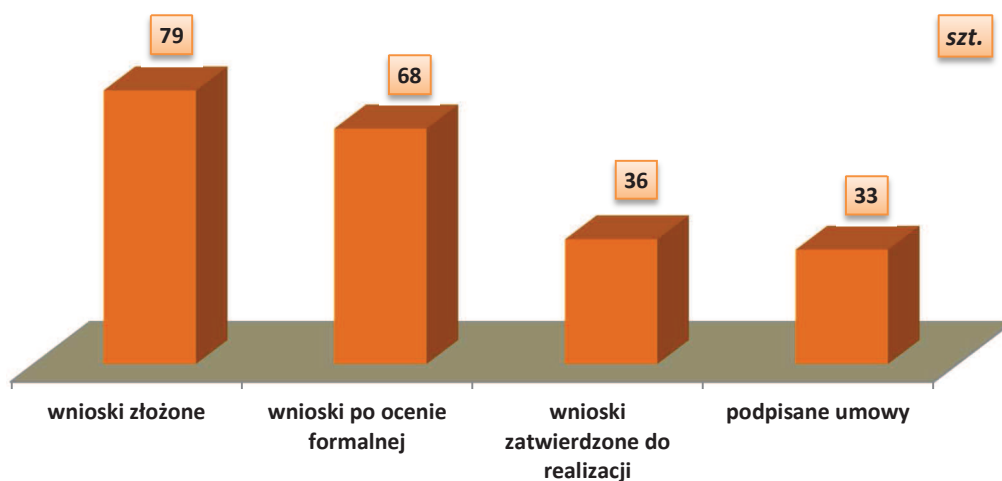

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 17. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

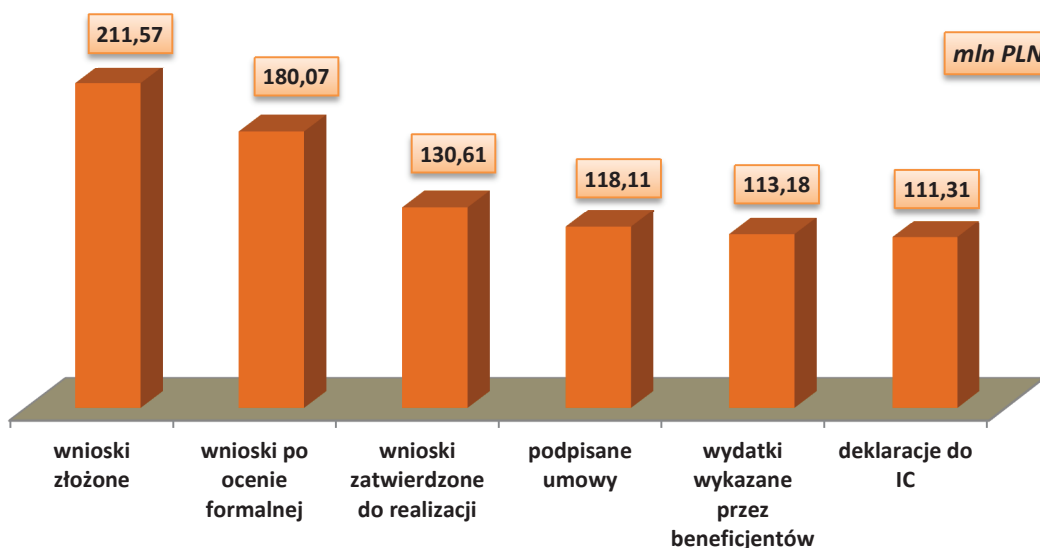

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach Osi 2.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, nie dokonywano oceny formalnej wniosków.

Wnioski zaakceptowane, podpisane umowy

⇒ nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Osi priorytetowej 2.

Wnioski o płatność

⇒ w okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali wydatki w ramach Osi priorytetowej 2 na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **10,42 mln PLN**, co stanowi około **9%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **10,60 mln PLN**, co stanowi ponad **9%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2.

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.* w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 2.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowane są **33 projekty** z zakresu społeczeństwa informacyjnego: **4 projekty** w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* oraz **29 projektów** w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

Poziom realizacji wskaźników, wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 2, zaprezentowany został w *Tabeli 7*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Tabela 7. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
2.1	Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego [szt.]	32	30	93,8	33	103,1
2.2	Długość sieci Internetu szerokopasmowego [km]	149	149,33	100,2	149,33	100,2
Wskaźniki rezultatu						
2.3	Liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów [szt.]	203	134	66	182	89,7

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
2.4	Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych [osoby]	148 600	185 997	125,2	148 600	100
a	- w tym na obszarach wiejskich	10 000	10 000	100	10 000	100
2.5	Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w: [szt.]	177	170	96,1	170	96,1
a	- jednostkach publicznych	33	28	84,9	28	84,9
b	- szkołach, w tym:	144	142	98,6	142	98,6
c	- na obszarach wiejskich	40	40	100	40	100

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

W ramach Osi priorytetowej 2 założono realizację 2 wskaźników produktu oraz 7 wskaźników rezultatu. Wg stanu na 30.06.2015 r. rozpoczęła się realizacja wszystkich wskaźników wyznaczonych do mierzenia postępu wdrażania Osi priorytetowej 2. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację wszystkie wskaźniki powinny osiągnąć wartości docelowe założone na etapie programowania.

Obszar: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

Od uruchomienia Programu w ramach obszaru *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* realizowane są 4 projekty. Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja wszystkich projektów. Biorąc pod uwagę efekty rzeczowe wspomnianych inwestycji należy wskazać wybudowanie **149,33 km** sieci Internetu szerokopasmowego oraz podłączenie do sieci Internetu szerokopasmowego **142 placówek oświatowych, 28 jednostek publicznych**, w tym **40 jednostek** na obszarach wiejskich. Dzięki realizacji inwestycji zakupiono **9 874 szt.** sprzętu teleinformatycznego (w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) oraz blisko **186 tys. osób** uzyskało dostęp do Internetu.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 1 projektu pn. *Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)* Miasta Opola. Projekt polegał na budowie **21,33 km** otwartej sieci światłowodowej. OSTO to bardzo wydajna sieć światłowodowa, z której skorzystają instytucje publiczne działające w obrębie miasta, w tym opolskie szkoły, jednostki urzędu miasta, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wojewódzkie Centrum Medyczne i Szpital Wojewódzki w Opolu, a także np. straż pożarna, straż miejska, Komenda Wojewódzka Policji czy służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Dzięki niej można stworzyć tematyczne podsieci, np. dla jednostek zarządzania kryzysowego – do koordynacji działań na wypadek nagłych zdarzeń czy klęsk żywiołowych; dla placówek oświatowych, bibliotek czy szpitali. Dzięki sieci jednostki te będą mogły korzystać ze wspólnych baz danych i aplikacji, wymieniać pliki czy pracować razem online na wizji. Utworzona w ramach projektu sieć będzie mogła być wykorzystywana również przy budowie i użytkowaniu nowoczesnego systemu bezpieczeństwa publicznego. Podstawowym celem projektu budowy optycznej sieci teleinformatycznej na terenie miasta Opola było stworzenie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie narzędzi ICT w życiu publicznym, prywatnym i gospodarczym regionu. W ramach projektu został również zakupiony sprzęt teleinformatyczny (w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) - **148 szt.** Dzięki realizacji inwestycji **31 szkół** oraz **28 jednostek publicznych** zostało podłączonych do Internetu szerokopasmowego.

Obszar: Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych

W ramach obszaru *Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych* realizowanych jest **29 projektów**. Do końca czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **26** z nich, w ramach których:

- utworzono lub udostępniono **368** aplikacji/usług teleinformatycznych;
- **134** usługi publiczne realizowane są on-line, z których skorzysta ponad **762 tys. osób**;
- zakupiono **5 421 szt.** wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT;
- przeszkolono **7 313** osób z zakresu ICT;
- **569** jednostek sektora publicznego korzysta z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3** projektów.

Przykładem jednego z nich jest inwestycja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu pn. *Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem*. W ramach projektu wykonano prace budowlano-modernizacyjne sieci informatycznych wszystkich trzech szpitali. Dopuszono placówki w odpowiednią do świadczenia nowych e-usług infrastrukturę ICT - zakupiono **458 szt.** (sprzęt komputerowy, sprzęt sieciowy, oprogramowanie), zaimplementowano nowe e-usługi, zapewniono nadzór nad wdrożonymi modułami, przeprowadzono szkolenia z zakresu wykorzystania zainstalowanych urządzeń dla **200 osób**. W wyniku zakończenia projektu zrealizowano on-line **15** usług publicznych, a liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych wyniosła **25**. Liczba osób korzystających z usług on-line wynosi ponad **45 tys. osób**, a bezpośrednimi odbiorcami projektu są pacjenci, kontrahenci i pracownicy partnerskich szpitali. Projekt przyczynił się do znacznej poprawy jakości i szybkości usług medycznych świadczonych przez poszczególne szpitale w zakresie obsługi pacjenta i procesu leczenia.

Kolejnym projektem, którego realizacja zakończyła się w okresie sprawozdawczym jest inwestycja pn. *Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, której beneficjentem jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Przedmiotem projektu było zintensyfikowanie wykorzystania modułów informacyjnych, platformy e-usług i baz danych Beneficjenta służących do realizacji usług publicznych na poziomie 1 „informacja”, poziomie 2 „interakcja” oraz na poziomie 4 „transakcja”. Dzięki realizacji inwestycji przeprowadzono pełną informatyzację, dzięki której pacjenci mają dostęp do swojej dokumentacji medycznej, wyników badań czy kart informacyjnych drogą elektroniczną, jak również mogą rejestrować się przez Internet, sprawdzać terminy wizyt i uzyskać informację o miejscu na liście oczekujących. Elektronicznie będą również powiadamiani o terminach kolejnych wizyt. Ponadto, ośrodek ma możliwość prowadzenia e-konsultacji pomiędzy pacjentem a terapeutą oraz pomiędzy lekarzami i terapeutami. W ramach zakończonego projektu zakupiono **48 szt.** sprzętu umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT, w tym m.in. 30 zestawów komputerowych, 3 infokioski, 3 serwery oraz inne urządzenia gwarantujące wysoką wydajność systemu oraz wysoki poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych medycznych. W wyniku zakończenia projektu zrealizowano on-line **4** e-usługi publiczne, a liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych wyniosła **3**. Z udostępnionych usług on-line skorzysta **14 tys.** osób, natomiast w celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi pacjentów zostało przeszkolonych **50 osób**.

OŚ PRIORYTETOWA 3 Transport

Celami Osi priorytetowej 3 *Transport* są:

- polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- zwiększenie mobilności mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego.

Oś priorytetowa 3 wdrażana jest w całości przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013. Na realizację zadań z zakresu transportu przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **26 846 502 Euro**, z czego **16 701 287 Euro** pochodzi z Krajowej Rezerwy Wykonania, **10 145 215 Euro** z dostosowania technicznego (w tym 6 275 125 Euro na niwelowanie skutków powodzi). Łączna kwota alokacji na Oś priorytetową 3 wynosi w ramach EFRR **137 904 154 Euro**, co stanowi **28%** środków Programu.

Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 3.

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane są głównie roboty budowlane dotyczące dróg regionalnych i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów oraz wymiana taboru autobusowego i kolejowego na nowy przyjazny środowisku.

Pomoc w ramach przedmiotowej Osi jest kierowana przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 3.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **14 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **11 naborów w ramach procedury pozakonkursowej** (beneficjenci **14 projektów kluczowych** złożyli pełną dokumentację projektową),
- ⇒ całkowita kwota alokacji na przeprowadzone nabory wyniosła **140,30 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **73,38 mln Euro**; natomiast na procedurę pozakonkursową obejmującą indywidualne projekty kluczowe przeznaczono **66,92 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **153 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **1 057,82 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **814,59 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **150 wniosków** o całkowitej wartości **1 055,54 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **790,95 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **130 projektów**, na całkowitą wartość **994,43 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **742,56 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **126 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **784,31 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **586,64 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **100%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **573,24 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **98%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **563,05 mln PLN**, co stanowi ponad **96%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 18-19.

Wykres 18. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

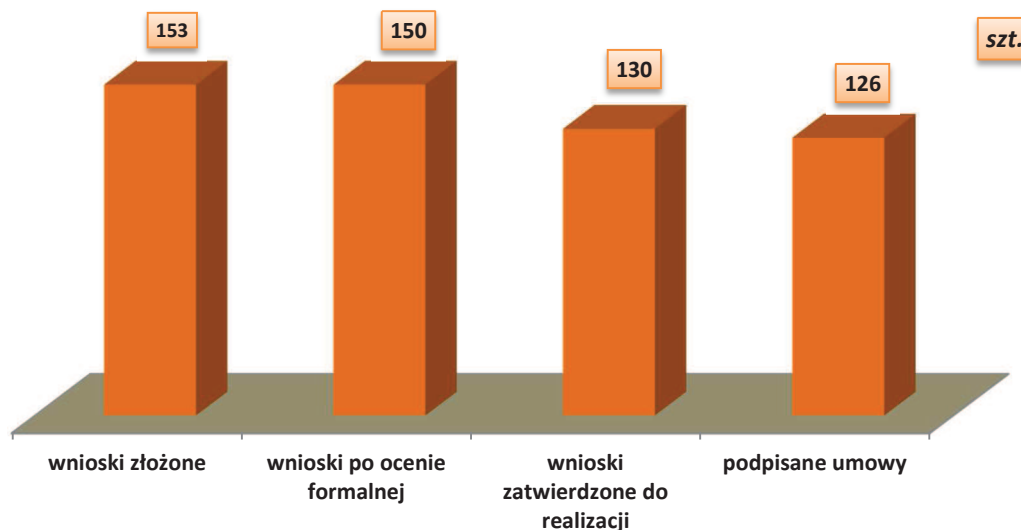

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 19. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

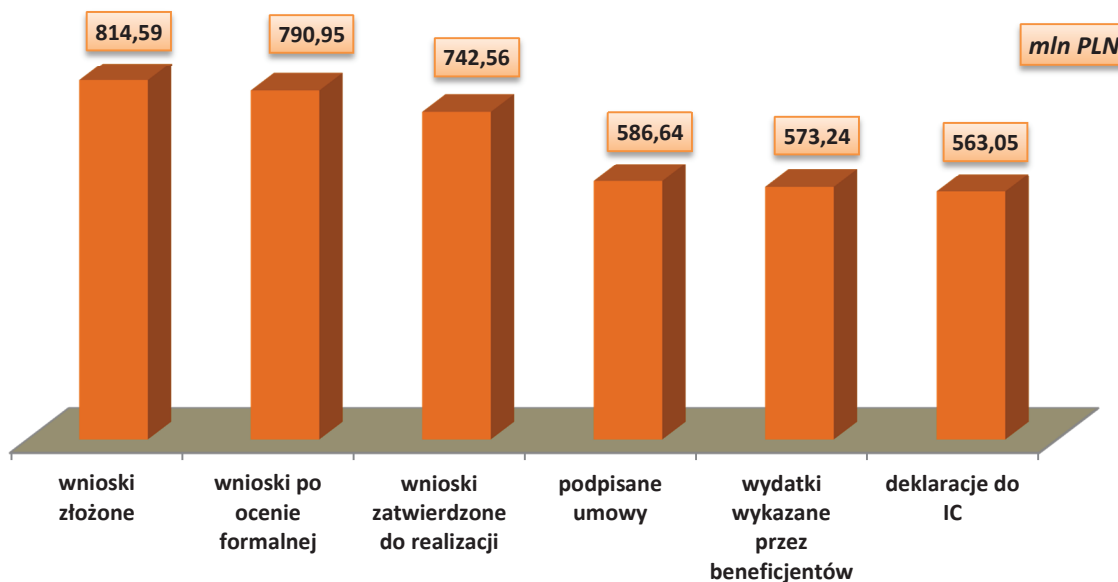

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach Osi 3.

Wnioski złożone

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **3 wnioski** o całkowitej wartości **7,77 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **4,13 mln PLN** (III nabór wniosków w ramach działania 3.2 *Transport publiczny*).

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **4 projekty** na całkowitą wartość **32,51 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **25,15 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ podpisano **7 umów** o dofinansowanie: **1 umowę** w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*, **3 umowy** w ramach działania 3.2 *Transport publiczny* oraz **1 umowę** w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* (projekt kluczowy *Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II*). Ich całkowita wartość wyniosła **38,16 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **10,28 mln PLN**;
- ⇒ ww. projekt kluczowy realizowany jest w ramach środków na niwelowanie skutków powodzi z 2010 r. powstałych dzięki oszczędnościom na projekcie *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa*.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **10,79 mln PLN**, co stanowi około **2%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Płatności wykazano w ramach następujących poddziałań:
- 3.1.1 *Drogi regionalne* – **4,34 mln PLN**,
 - 3.1.2 *Drogi lokalne* – **5,21 mln PLN**,
 - 3.2 *Transport publiczny* – **1,24 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **15,22 mln PLN**, co stanowi około **3%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 8.

Tabela 8. Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

[mln PLN]

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
3.1.1 Drogi regionalne						
V nabór (15-29.02.2012 r.)	nie złożono wniosków		1	21,02	1	1,32
Razem 3.1.1	-		1	21,02	1	1,32
3.1.2 Drogi lokalne						
IPI (14-28.11.2014 r.)	nie złożono wniosków		nie zaakceptowano projektów		1	4,93
Razem 3.1.2	-		-		1	4,93

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
3.2 Transport publiczny						
III nabór (12-26.11.2014 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		3	4,13	3	4,03
Razem 3.2	-		3	4,13	3	4,03
OGÓŁEM	-		4	25,15	5	10,28

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.* w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 3.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest **126** projektów z zakresu transportu: **36** dotyczy budowy/przebudowy dróg regionalnych, **79** dotyczy dróg lokalnych i **11** projektów z zakresu transportu publicznego. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **117** projektów (93% podpisanych umów), w tym **34** z zakresu regionalnej, a **75** - lokalnej infrastruktury drogowej oraz **8** z zakresu transportu publicznego.

W ramach Osi priorytetowej 3 założono realizację 9 wskaźników produktu i 3 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowane są wszystkie z nich. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 3 prezentuje *Tabela 9*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Tabela 9. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
3.1	Liczba projektów z zakresu transportu [szt.]	101	117	115,8	126	124,8
3.2	Długość nowych dróg w tym: [km]	27	30,36	112,4	32,72	121,2
a	regionalne (wojewódzkie)	10	10,25	102,5	11,46	114,6
b	lokalne (powiatowe i gminne)	17	20,11	118,3	21,26	125,1
3.3	Długość zrekonstruowanych dróg w tym: [km]	188	223,14	118,7	230,68	122,7
a	regionalne (wojewódzkie)	79	101,2	128,1	101,65	128,7
b	lokalne (powiatowe i gminne)	109	121,94	111,9	129,03	118,4
3.4	Liczba zakupionych środków transportu publicznego [szt.]	12	43	358,3	51	425
3.5	Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi [szt.]	1	2	200	4	400
Wskaźniki rezultatu						
3.6	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych [Euro/rok]	20 846 599	20 955 438,59	100,5	25 977 437,76	124,6

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
3.7	Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu [szt.]	1 300	4 148	319,1	4 839	372,2
3.8	Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu [osoby/rok]	1 533 000	1 266 018	82,6	1 217 321	79,4

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację, 7 wskaźników zostanie osiągniętych w granicach 25% rozbieżności od wartości zakładanej. 5 wskaźniki przekroczą zakładaną wartość. Przekroczenie wartości wynika m.in. ze zwiększenia alokacji na niektóre działania/poddziałania i tym samym dofinansowania większej liczby projektów, wykorzystania powstałych oszczędności w ramach zakończonych naborów, a także ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników przyjętej na etapie programowania. Wskaźniki przekraczające założony cel stanowią wartość dodaną realizacji celów Osi 3. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu przedstawiono w dalszej części analizy jakościowej.

Obszar: Infrastruktura drogowa

Według stanu na 30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **109** projektów: w tym **34** z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz **75** dotyczących dróg lokalnych.

Od uruchomienia Programu zostało wybudowanych **30,4 km** dróg, a zrekonstruowano **223,1 km**. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację w zakresie nowych oraz zmodernizowanych dróg nie ma obecnie ryzyka zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników. Ponadto wskaźnik *Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnął wartość **20 955 438,6 Euro/rok**, co stanowi ponad 100% wartości docelowej.

Regionalna infrastruktura drogowa

Zgodnie ze *Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty*⁴ poprawa infrastruktury transportowej wpływa nie tylko na podniesienie bezpieczeństwa i mobilności korzystających, a tym samym poprawę ich standardu życia; stanowi także warunek niezbędny do osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Inwestycje realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 poprzez uzupełnienie istniejącej siatki drogowej, w tym poprawę połączeń z autostradą A4 oraz drogami krajowymi, umożliwiły podniesienie konkurencyjności regionalnych terenów inwestycyjnych.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano **101,2 km** dróg wojewódzkich, co stanowi **128,1%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przewiduje się, że realizacja wskaźnika po zakończeniu trwających inwestycji wzrośnie do wartości **101,7 km**. Ponadto powstało ok. **10,3 km** nowych dróg, co stanowi **102,5%** założonej wartości docelowej. Na podstawie dotychczas podpisanych umów przewiduje się, iż wartość wskaźnika *Długość nowych dróg regionalnych* zostanie osiągnięta w granicach 25% odchylenia od wartości docelowej założonej na etapie programowania. Przekroczeniu może ulec wartość wskaźnika *Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych*. Należy to jednak oceniać pozytywnie, jako wartość dodaną.

W celu podniesienia bezpieczeństwa na opolskich drogach realizowane były nie tylko inwestycje w samą infrastrukturę, ale także na zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie akcji ratunkowych i ochrony szlaków komunikacyjnych.

W tym obszarze zrealizowano **8** projektów, w ramach których zakupiono **7** wozów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w **82** sztuki specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych

⁴ Dz. U. UE L 291 z 21.10.2006 r.

i ochrony szlaków komunikacyjnych, m.in. zaporę pływającą ograniczającą rozlewanie się substancji chemicznych, pompę elektryczną do przepompowywania substancji chemicznych z cystern samochodowych, ubrania gazoszczelne, kamery termowizyjne czy platformy ratownicze. Dzięki zrealizowanym inwestycjom zabezpieczonych zostało ponad **6,7 tys. km** szlaków komunikacyjnych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 2 projektów: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinkach: Szumirad - Chudoba w km 7+200-8+250 i 8+350-9+200, oraz w Łowoszów w km 13+295 - 14+300 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów w km 29+550 - 32+000 oraz 32+500 - 34+500.*

Celem pierwszej inwestycji było *zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i mobilności mieszkańców poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 494 w powiecie kluczborskim i oleskim.* Wyremontowana droga jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców powiatu oleskiego w celu dotarcia do stolicy regionu – Opolą. W związku z obserwowanymi od dłuższego czasu trendami na rynku pracy, coraz więcej osób dojeżdża z tego powiatu do pracy w Opolu. Opole jest także stolicą kulturalną, edukacyjną i centrum usług medycznych dla mieszkańców powiatu oleskiego. Stąd poprawa dostępności transportowej do stolicy regionu zawsze odgrywała bardzo ważną rolę dla mieszkańców Olesna i okolic. Ponadto dzięki realizacji projektu zapewniony został również dobry dojazd do utworzonej w Oleśnie podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej powierzchnię 5 ha. W ramach zrealizowanej inwestycji wyremontowano **2,9 km drogi** wojewódzkiej, zrekonstruowano **5 skrzyżowań**.

Druga ze zrealizowanych inwestycji również miała miejsce w powiecie oleskim. Jej celem było *zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.* Parametry techniczne drogi nr 487 nie były dostosowane do wzrastającego z roku na rok natężenia ruchu. Na rozpatrywanym odcinku trasa prowadzi również w terenie zabudowanym, co dodatkowo wydłuża czas przejazdu oraz utrudnia pracę kierowców. Duża liczba pojazdów na analizowanej drodze generowała duże koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji, a także przewozu. Ponadto zwiększał się czas przejazdu przez tworzenie się zatorów na ulicach. Wyremontowana droga była ważnym szlakiem komunikacyjnym dostępności do Olesna jako stolicy powiatu. Dzięki realizacji projektu modernizacji poddano **4,45 km drogi** oraz **3 skrzyżowania**.

Obie, wyżej opisane inwestycje zrealizowane zostały w powiecie oleskim, którego dostępność do stolicy regionu Opola jest utrudniona. Zgodnie z dokumentem *Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności terytorialnej województw*, dla rozkładu dostępności wewnętrznej województwa opolskiego, bardzo duże znaczenie ma równoleżnikowy przebieg przecinającej województwo autostrady A4 oraz centralne położenie Opola. Znaczący jest brak odpowiedniego połączenia na osi północ-południe. Tym samym słabszą dostępnością odznaczają się pasy położone w północnej i południowej części regionu, w szczególności gminy w powiecie oleskim właśnie (na północy) i głubczyckim na południu. Autorzy ww. opracowania (z 2012 r.) zwracali uwagę, iż większość inwestycji w ramach RPO WO 2007-2013 realizowana jest na południe od autostrady A4 (podobnie w województwie śląskim), co powoduje brak inwestycji drogowych w pasie północnym województwa opolskiego, śląskiego oraz południowym województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Ww. inwestycje stanowią ważne kamienie milowe w celu zmiany tych niekorzystnych tendencji.

Lokalna infrastruktura drogowa

Poza siecią dróg o znaczeniu regionalnym, bardzo istotne dla wewnętrznej komunikacji i dostępności regionu są także drogi lokalne. W ramach Programu wsparto budowę, rozbudowę, przebudowę i unowocześnienie dróg powiatowych i gminnych, ze szczególnym naciskiem na inwestycje zapewniające dostępność do terenów inwestycyjnych.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu *lokalnej infrastruktury drogowej* zrekonstruowano **121,9 km** dróg w województwie opolskim, w tym przebudowano **62,1 km** dróg powiatowych oraz **59,8 km** dróg gminnych, co stanowi nieco ponad **111,9%** w odniesieniu do założonej wartości

docelowej wskaźnika *długość zrekonstruowanych dróg lokalnych*. Ponadto wybudowano **20,05 km** dróg gminnych oraz powstał odcinek na drodze powiatowej o długości **0,048 km**, co łącznie stanowi **118,3%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej wskaźnika *długość nowych dróg lokalnych*. Ponadto w ramach inwestycji na drogach lokalnych wartość wygenerowanych *oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych* wyniosła **13 512 561,35 Euro/rok**.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 2 inwestycji z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej. Jedną z zakończonych inwestycji dotyczyła właśnie dostępności do terenów inwestycyjnych. Celem ogólnym projektu pn. *Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowasach* była *poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów o znaczeniu gospodarczym, prowadząca do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dobrzeń Wielki*. Beneficjent projektu przed jego realizacją zidentyfikował problemy, które wiązały się z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą drogową w rejonie miejscowości Czarnowasy w Gminie Dobrzeń Wielki, a tym samym utrudnionym dostępem do atrakcyjnie zlokalizowanych terenów inwestycyjnych. Istniała zatem konieczność zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dobrzeń Wielki, poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. Wobec powyższego zrealizowano remont drogi o długości **1,57 km**. Zrekonstruowany szlak, poza walorami poprawy bezpieczeństwa oraz znaczeniem gospodarczym, poprawił dostępność do atrakcyjnego turystycznie i przyrodniczo terenu Lasów Stobrawsko-Turawskich oraz Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Drugi z projektów, który został zakończony w okresie sprawozdawczym również dotyczył dostępności do terenów inwestycyjnych. Beneficjent projektu *Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek – Steblów* zauważył, iż najważniejszym problemem komunikacyjnym występującym na terenie gminy oraz powiatu jest niepełne wykorzystanie położenia w ciągu III-go paneuropejskiego korytarza transportowego, na który składają się: autostrada A4 Zgorzelec – Korczowa, będąca częścią trasy Berlin – Kijów, magistrala kolejowa wschód – zachód oraz trasa żeglugi śródlądowej o znaczeniu międzynarodowym na rzece Odrze. Niezadawalający stan infrastruktury drogowej stanowi czynnik utrudniający w lokowaniu się nowych inwestycji. W gminie Cisek tereny inwestycyjne zlokalizowane są m.in. w miejscowości Steblów. Na terenie inwestycyjnym znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna i energetyczna. Odległość terenu inwestycyjnego od autostrady A4 wynosi ok. 30 km. Konieczne stało się zatem przygotowanie dostępności terenu również pod kątem infrastruktury drogowej. W wyniku realizacji zadania, polegającego na przebudowie **1,67 km** drogi gminnej, nastąpiła poprawa dostępności do terenu inwestycyjnego o powierzchni 17,7 ha. Nastąpiło upłynnienie ruchu pojazdów na drodze powiatowej nr 1422 O poprzez skierowanie części ruchu na drogę gminną, co w rezultacie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie czasu oczekiwania na włączenie do ruchu, zmniejszenie hałasu, a tym samym na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania ruchu komunikacyjnego na środowisko.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas wspartych inwestycji w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* przewiduje się, iż długość zrekonstruowanych dróg wyniesie **129,03 km** (62,55 km dróg gminnych, 66,48 dróg powiatowych), a długość nowych dróg **21,26 km** (niemal w całości są to drogi gminne). Na podstawie dotychczas podpisanych umów przewiduje się, iż wartość wskaźnika *Długość zrekonstruowanych dróg lokalnych* zostanie osiągnięta w granicach 25% odchylenia od wartości zakładanej. Natomiast wartość wskaźnika *Długość nowych dróg lokalnych* może nieznacznie przekroczyć granicę 25% odchylenia.

Obszar: Transport publiczny

Według stanu na 30 czerwca 2015 r. realizowanych jest **11** projektów z zakresu transportu publicznego, z których **8** inwestycji zostało zakończonych. W ramach zakończonych projektów zakupiono **43** sztuki środków transportu publicznego, w tym 38 autobusy i 5 szynobusów, co stanowi blisko **360%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych środków transportu publicznego*. Projekty zapewniły **4 148 miejsc** w środkach komunikacji, co stanowi blisko **320%** w stosunku do założonej wartości docelowej wskaźnika *potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu*. Przekroczenie wskaźników realizowanych w obszarze transportu publicznego wynika m.in. ze zwiększenia alokacji na działanie i

tym samym dofinansowania większej liczby projektów, wykorzystania powstałych oszczędności w ramach zakończonych naborów, a także ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników przyjętej na etapie programowania. Wskaźniki przekraczające założony cel stanowią wartość dodaną realizacji celów Osi 3.

W I połowie 2015 r. zakończył się projekt pn. *Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III*. Celem ogólnym przedsięwzięcia było *podniesienie jakości infrastruktury miejskiego transportu publicznego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez zakup i wymianę taboru autobusowego oraz zwiększenie mobilności mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu*. Istniejący dotychczas tabor komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu charakteryzuje się dużym zużyciem. Stan techniczny był zdecydowanie nieekonomiczny, ponadto stare autobusy nie posiadają żadnych systemów kontroli jazdy, które wpływają na bezpieczeństwo jazdy, np. ABS, co stanowi o ich niskim poziomie bezpieczeństwa. Stary tabor oferował niski poziom komfortu podróżnym, co było szczególnie uciążliwe dla starszych osób, niepełnosprawnych, matek z wózkami dziecięcymi. Ponadto identyfikowano problemy w sferze dotyczącej środowiska naturalnego. Jednym z najważniejszych jest niespełnianie przez większość taboru autobusowego w Kędzierzynie-Koźlu obowiązujących norm technicznych i ekologicznych. W ramach projektu zakupiono **3 nowe autobusy** dla komunikacji miejskiej, które zapewniają dodatkową pojemność dla **210 osób**.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas wspartych inwestycji w ramach działania 3.2 *Transport publiczny* przewiduje się, iż zakupionych zostanie **51** środków transportu publicznego, które zapewnią **4 839 miejsc**.

OŚ PRIORYTETOWA 4 Ochrona środowiska

Celami Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* są:

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego,
- zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów,
- poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
- zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 4 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **6 500 000 Euro** pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Całkowita kwota alokacji na Oś priorytetową 4 wynosi w ramach EFRR **49 214 481 Euro**, co stanowi **10%** środków Programu.

Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 4.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, przebudowie systemów wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji składowisk odpadów, zakupie urządzeń i wyposażenia dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ochronie bioróżnorodności.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych czy parków krajobrazowych.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w zakresie wdrażania Osi 4.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **12 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **2 projektów kluczowych**: *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7,*
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **51,72 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **46,05 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **5,67 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **160 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **668,49 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR stanowiło **410,66 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **134 wnioski** na całkowitą wartość **594,59 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **353,12 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **97 projektów**, na całkowitą wartość **471,07 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **268,82 mln PLN**,
- ⇒ wśród projektów zaakceptowanych do realizacji znalazły się dwa projekty kluczowe *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7.*

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **92 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **345,62 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **201,51 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **101%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **192,60 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **96%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **190,78 mln PLN**, co stanowi ponad **95%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 20-21*.

Wykres 20. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

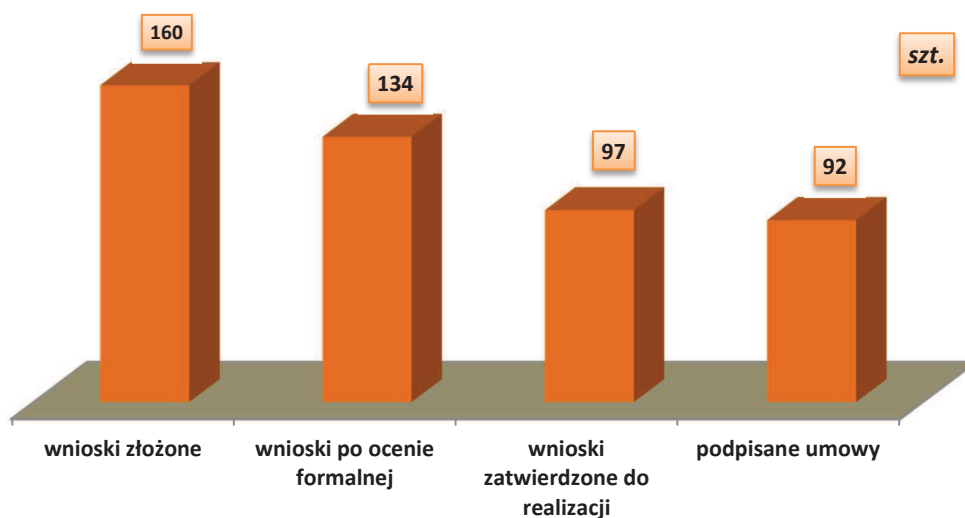

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 21. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

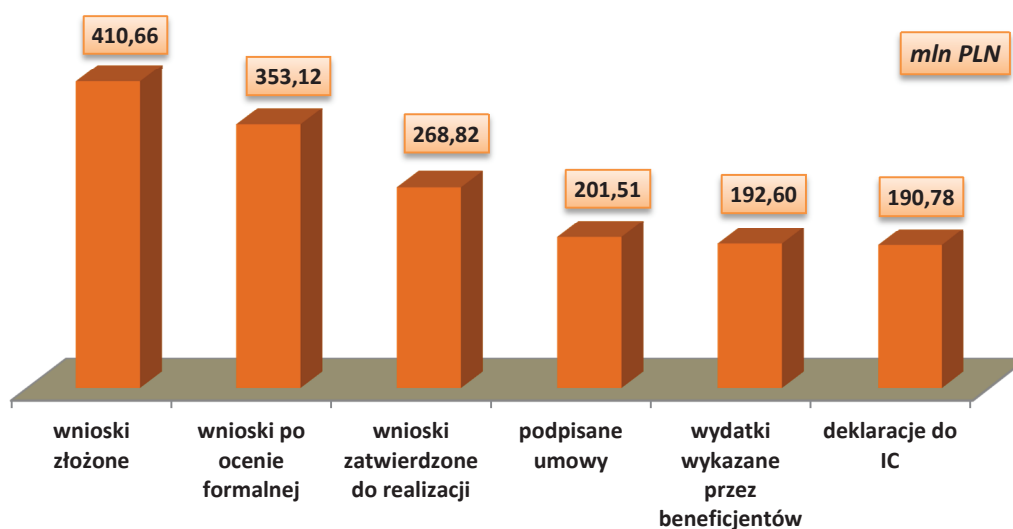

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach Osi 4.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, nie dokonywano oceny formalnej wniosków w ramach Osi priorytetowej 4.

Wnioski zaakceptowane, podpisane umowy

⇒ nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Osi priorytetowej 4.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **4,45 mln PLN** w ramach następujących poddziałań:

- 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* – **0,28 mln PLN**,
- 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* – **4,12 mln PLN**,
- 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* – **0,05 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad **2%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **12,44 mln PLN**, co stanowi ponad **6%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.* w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 4.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowane są **92 projekty**, w tym **30** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, **2 projekty** z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, **53 projekty** z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii oraz **7 projektów** z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **82 projektów**, w tym **29** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, **46** z zakresu ochrony powietrza, **6** z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu oraz **1** z zakresu prewencji zagrożeń.

W ramach Osi priorytetowej 4 założono realizację 6 wskaźników produktu i 6 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowane są wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu, zarówno na poziomie podpisanych umów, jak i na poziomie wniosków o płatność. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 4 prezentuje *Tabela 10*.

Tabela 10. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
4.1	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej [szt.]	9	22	244,4	23	255,6
4.2	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami [szt.]	3	7	233,3	7	233,3
4.3	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza [szt.]	41	46	112,2	53	129,3
4.4	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej [szt.]	16	15	93,8	15	93,8
4.5	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń [szt.]	2	1	50	2	100
4.6	Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności [szt.]	6	6	100	7	116,7

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki rezultatu						
4.7	Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów [km ²]	0,01	0,15	1 500	0,15	1 500
4.8	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów [osoby]	31 000	136 005	438,7	136 005	438,7
4.9	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów [osoby]	48 713	46 068	94,6	48 713	100
4.10	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów [osoby]	14 000	28 504	203,6	29 800	212,9
4.11	Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych [MW]	4,25	6,2	145,9	6,49	152,7
4.12	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów [ha]	9	10,1	112,2	11,12	123,6

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację, spośród 12 wskaźników 5 zostanie osiągniętych w granicach 25% rozbieżności od wartości zakładanej. Natomiast pozostałych 7 wskaźników przekroczy zakładaną wartość. Przekroczenie wartości wynika m.in. ze zwiększenia alokacji na niektóre działania (4.1) i tym samym dofinansowania większej liczby projektów, wykorzystania powstałych oszczędności w ramach zakończonych naborów, a także ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników przyjętej na etapie programowania (4.1 oraz 4.3). Wskaźniki przekraczające założony cel stanowią wartość dodaną realizacji celów Osi 4.

Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **30 projektów**, z czego **23 projekty** ukierunkowane są na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej.

Inwestycje realizowane w ramach działania 4.1 odpowiadają na zidentyfikowane w Programie potrzeby, w tym słabe strony zdiagnozowane w analizie SWOT, tj. utrzymujące się zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pogarszająca się jakość wód podziemnych. Realizują one cel zdefiniowany przez Instytucję Zarządzającą: *poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz ochrona zbiorników wodnych*. Podejmowane zadania były szczególnie istotne ze względu na istniejące w regionie rezerwuary zasoby wód podziemnych, w tym jednego z największych rezerwuarów wody pitnej w Europie – zbiornika GZWP 333.

W 2007 r. z sieci kanalizacji korzystało w regionie 574 tys. osób, w 2013 - 635 tys. W 2007 r. 61% mieszkańców Opolszczyzny była obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków, w 2013 r. – blisko 71%. Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić poprawę warunków higieniczno – sanitarnych w gospodarstwach domowych. Zapewne spora część tej poprawy nastąpiła dzięki środkom wdrażanym w ramach działania 4.1.

Spośród **23 umów** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **22 projektów**.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

- wybudowano **201,4 km** sieci kanalizacji sanitarnej;
- zmodernizowano **1,7 km** istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych **28 504 osób**;

- wybudowano **1** oczyszczalnię ścieków;
- przebudowano **2** oczyszczalnie ścieków;
- zmodernizowano **25,58 km** sieci wodociągowej w wyniku realizacji kompleksowego projektu.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **2 projektów** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

Pierwszy z zakończonych projektów dotyczył *Budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe*. W 2010 r. w Gminie Ujazd zakończono proces sanitacji, obejmując siecią kanalizacyjną 90% obszaru. Prace te spowodowały istotny wzrost ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalni ścieków w Ujeździe, a co za tym idzie wzrost ilości osadów ściekowych. Osady ściekowe stanowią nieodłączny element oczyszczania ścieków. Zawierają one spore ilości suchej masy, która gromadzona na terenie oczyszczalni była źródłem odoru i zanieczyszczeń bakteriologicznych powietrza. Poza dużym problemem ze składowaniem tych odpadów, istniało duże ryzyko skażenia środowiska. Aby zapobiec niepożądanym skutkom beneficjent zdecydował o budowie słonecznych suszarni odpadów suchych, które po przetworzeniu w granulaty są produktem bezpiecznym dla środowiska i łatwiejszym do zagospodarowania. Przedsięwzięcie polegało na zaprojektowaniu i budowie słonecznej suszarni osadów komunalnych wytwarzanych na Oczyszczalni Ścieków Gminy Ujazd o zdolności wysuszenia od 65% do 90% suchej masy osadów ściekowych. Budowa suszarni polegała na wzniesieniu hali typ tunel foliowy o wymiarach 57m i 7 m o powierzchni 1017 m². Hale wykonano ze stalowej konstrukcji samonośnej pokrytej folią polietylową. Suszenie odbywa się poprzez nasłonecznianie; prąd wykorzystywany jest natomiast tylko do pracy przewracarki. Instalacja obsługuje ok. 7 tysięcy osób i ma moc do przerobu **1000** ton odpadów w skali roku.

Kolejną zakończoną w okresie sprawozdawczym inwestycją była *Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I – miasto Kietrz*. Przed realizacją projektu Gmina Kietrz, mimo, iż była zwodociągowana w 100%, to jedynie ulice w centrum miasta miały ujęcie kanalizacyjne. Długość sieci wynosiła 6 km. Poza terenem miasta istniały krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej obsługujące osiedla mieszkaniowe Kombinat Rolnego w Pilszcu i Lubotyńcu. Kanalizacja ta pochodzi z lat 70 i 80 XX wieku. Kietrz obsługuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków wybudowana w roku 1974 zlokalizowana we wschodniej części miasta. Przepustowość oczyszczalni wynosiła 800 m³/d. Istniejący system oczyszczania ścieków zakładał jedynie opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez wozy asenizacyjne. Taki stan wpływał na stan środowiska, a także na jakość życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy. Brak możliwości oczyszczenia ścieków przemysłowych ograniczał możliwości pozyskania inwestycji gospodarczych w regionie. Dzięki projektowi wybudowano **3,3 km** kanalizacji ciśnieniowej, do której podłączono ponad **1000 mieszkańców**. Projekt jest pierwszym etapem planowanej inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji na terenie gminy Kietrz obejmującym swym zakresem cały obszar zlewni rzeki Troja na terenie Gminy Kietrz, w tym pozostała część Kietrza oraz wioski: Kozłówki, Nowa Cerkwia, Rogożany i Wojnowice.

Obszar: Gospodarka odpadami

W ramach działania 4.1 podpisano umowy na realizację **7 projektów** dotyczących gospodarki odpadami. Wszystkie projekty zostały zakończone, wszystkie przed okresem sprawozdawczym.

Wszystkie ze zrealizowanych projektów odpowiadały na:

- zdefiniowany w Programie cel: *Zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów,*
- zidentyfikowane w Programie potrzeby, w szczególności na brak powszechnego i w pełni funkcjonującego systemu wykorzystywania odpadów obejmujących m.in. recykling, kompostowanie i odzysk biogazu ze składowisk. Instytucja Zarządzająca zwróciła uwagę na konieczność zwiększania stopnia segregacji, organizacji systemów zbiórki odpadów oraz ponownego ich wykorzystywania.

łącznie w ramach zakończonych projektów:

- zrehabilitowanych zostało **5 składowisk** o powierzchni **0,14 km²**,
- uzyskano **0,1 km²** powierzchni terenów zielonych,
- zakupiono **5 sztuk** wyposażenia do przetwarzania odpadów,
- **136 005 osób** objęto kompleksowym systemem zagospodarowania odpadów.

Obszar: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Analiza SWOT wykazała, iż w regionie istnieje niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zgodnie z *Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego*⁵ oraz dokumentem *Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego*⁶, do najbardziej zagrożonych wystąpieniem powodzi opadowych należą obszary pięciu południowych województw Polski, w tym województwa opolskiego. Tragiczna w skutkach okazała się powódź stulecia w 1997 r., a także mniejsza w skutkach powódź w 2010 r. Aby zapobiec kolejnym tragediom, wszczęto intensywne, szerokopłaszczyznowe działania, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, zarówno w kwestiach legislacyjnych, jak i infrastrukturalnych. W ramach działania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* RPO WO 2007-2013 realizowane są **2 projekty kluczowe** zawarte w „Programie dla Odry - 2006”, które mają na celu zniwelować ryzyko wystąpienia powodzi w regionie. Do tej pory zakończyła się realizacja projektu *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500*, dzięki któremu:

- wybudowano zbiornik o pojemności **1 683 m³ wody**, który zapewnia możliwość retencjonowania maksymalnie **1 583 000 m³ wody**;
- ochroną przeciwpowodziową objęto **46 068 mieszkańców** regionu w **7 miejscowościach**;
- zabezpieczono przed skutkami powodzi **1 601,2 ha** terenów.

Obszar: Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

Zadania realizowane w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, były odpowiedzią na zidentyfikowane w analizie SWOT słabe strony, m.in. niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii i uciążliwą niską emisję, tj. emisję komunikacyjną, emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Działania te wpisują się w cele Polityki Energetycznej Polski do 2025 r. W dokumencie tym stwierdzono konieczność podniesienia efektywności energetycznej poprzez podejmowanie działań prowadzących do uzyskania oszczędności energetycznej, poprawę efektywności użytkowania energii w celu zmniejszenia rozpiętości pomiędzy maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniem na energię. Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia ukierunkowane na termomodernizację obiektów publicznych wraz z wymianą/ uzupełnieniem tradycyjnych źródeł energii na nowoczesne, wykorzystujące energię odnawialną (instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła), wdrażają ww. cele w życie.

Dużą część realizowanych projektów dotyczy działań termomodernizacyjnych. W wyniku tych przedsięwzięć, termomodernizacją objęto 80 budynków publicznych, zaoszczędzona zostanie energia cieplna w wysokości **42 839,93 GJ/rok**. Częstym elementem projektów była instalacja jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystujących energię odnawialną. Najczęściej projektodawcy wybierali instalacje pozyskujące energię słoneczną. Dzięki **15 realizowanym projektom** powstanie **496** jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii promieniowania słonecznego - **469**; przy wykorzystaniu energii wodnej - **5**; energii geotermicznej - **19**; energii z biomasy i biogazu - **3**. W ten

⁵ *Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego*, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2012 r.

⁶ *Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego*, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013 r., s. 17

sposób uzyskana będzie dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych w wielkości **6,49 MW**.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **4 projektów**, z których 2 dotyczyły termomodernizacji, 1 odnawialnych źródeł energii, a 1 był mieszany.

Pierwszym z zakończonych w okresie sprawozdawczym projektów był projekt pn. *Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II*". Gmina Kędzierzyn-Koźle przed realizacją projektu zmagala się z dużymi uciążliwościami, których źródłem było zanieczyszczone powietrze przez zastosowania tradycyjnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (budynek Krytej Pływalni). W budynku basenu zainstalowany był wyeksploatowany, nieracjonalny system grzewczy, charakteryzujący się nieodpowiednim poziomem sprawności oraz funkcjonalności, co powodowało emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Beneficjent zwracał uwagę na niską efektywność i nadmierną kapitałochłonność działania systemu ciepłowniczego basenu. Najistotniejszym powodem, który skłonił beneficjenta do realizacji projektu należy wymienić obecny poziom stężenia substancji zanieczyszczających na analizowanym obszarze. Przekracza on wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, plasując Kędzierzyn-Koźle na pierwszym, niechlubnym miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast na Opolszczyźnie. Rozwiązanie zidentyfikowanych problemów nastąpiło poprzez instalację urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w ww. budynku, co zapewniło komfort cieplny na odpowiednim poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki instalacji **16 jednostek** wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, zaoszczędzono blisko **150 MWh/rok** energii oraz osiągnięto cel projektu tj. *poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykonanie instalacji OZE w obiekcie basenu krytego MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu wraz z termomodernizacją budynku*.

Kolejnym ciekawym, zakończonym w okresie sprawozdawczym projektem było przedsięwzięcie: *Zwiększenie efektywności energetycznej SWSNPC w Branicach, poprzez kompleksową termomodernizację szpitala – etap 1*. Problem identyfikowany przez beneficjenta przed realizacją inwestycji polegał na wysokiej stracie ciepła w budynku placówki. Budynek wybudowany został w pierwszej dekadzie XX wieku, stąd zastosowane technologie były bardzo przestarzałe i niedostosowane do obecnych standardów. Budynek charakteryzował się nieocieplaną elewacją, starą, nieuszczelną stolarką drzwiową i okienną, niedostatecznie ocieplonym stropodachem, co powodowało duże straty ciepła. Dotychczas beneficjent miał ograniczone możliwości finansowe realizacji odpowiednich przedsięwzięć, m.in. ze względu na prowadzenie innych inwestycji. Istniejące w szpitalu warunki godziły w pracujący tam personel, ale przede wszystkim w pacjentów. Ponadto istniejący stan generował wysokie koszty utrzymania placówki, głównie w sezonie grzewczym. Dzięki termomodernizacji oraz instalacji **50 jednostek** wytwarzania energii z promieni słonecznych o mocy **0,07 MW**, zaoszczędzono **871,2 MWh/rok**. Poza rezultatami ekologicznymi, otrzymano także, niemniej istotne, efekty ekonomiczne.

Obszar: Ochrona bioróżnorodności

W ramach działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* realizowanych jest **7 projektów**, w przypadku **6 inwestycji** złożone zostały wnioski o płatność końcową, przy czym w okresie sprawozdawczym nie zakończyła się realizacja żadnego z kolejnych projektów.

W związku ze zidentyfikowanymi w regionie interesującymi ze względów biologicznych terenami, Instytucja Zarządzająca zdecydowała się na realizację działań wspierających bioróżnorodność i ich ochronę. Celem działania było *zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego*.

W ramach projektów zakończonych do 30 czerwca br.:

- na obszarze **10,1 ha** przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu;
- **27 gatunki** objęto reintrodukcją;

- **36 gatunkom zagrożonym** zapewniono lub odtworzono właściwy stan ochrony;
- **13 gatunków** uzyska/odzyska możliwość migracji/przemieszczania się na przedmiotowym obszarze;
- objęto zakresem projektu **6 zbiorowisk roślinnych**.

OŚ PRIORYTETOWA 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Celami Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* są:

- podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie,
- wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych na rynku pracy,
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym,
- wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 5 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu przedmiotowej Osi przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **2 000 000 Euro** pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Całkowita kwota alokacji na tę Oś wynosi w ramach EFRR **44 714 481 Euro**, co stanowi **9%** środków na Program z EFRR. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono **31 873 719 Euro** (71% alokacji na Oś).

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana jest m.in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 5.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **10 naborów wniosków w trybie konkursowym** oraz złożono pełną dokumentację konkursową dla **2 projektów kluczowych**: *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* oraz *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **44,71 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **35,75 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **8,96 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **154 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **455,06 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **293,82 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **140 wniosków** na całkowitą wartość **380,14 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **244,59 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **128 projektów**, na całkowitą wartość **345,38 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **216,71 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **126 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **302,66 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **185,75 mln PLN**,

⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **101%**.

Wnioski o płatność


⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **180,20 mln PLN**, co stanowi ponad **98%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **177,71 mln PLN**, co stanowi ponad **97%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 22-23.

Wykres 22. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

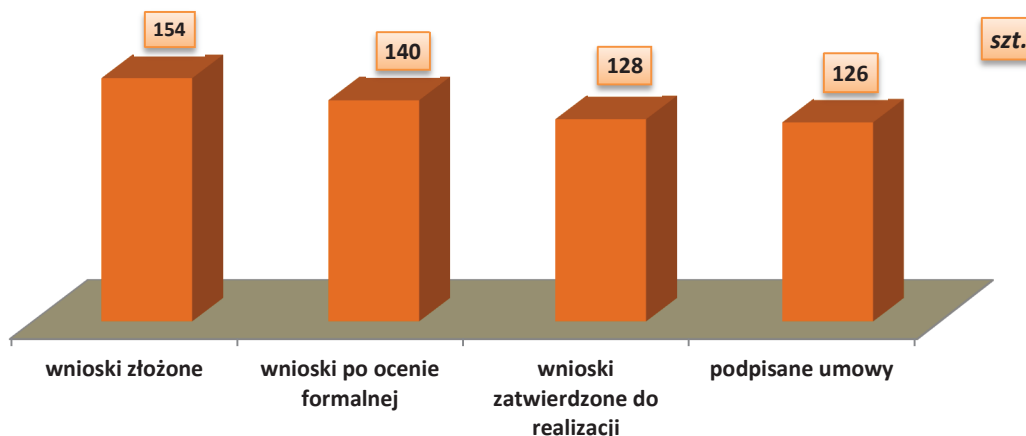

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

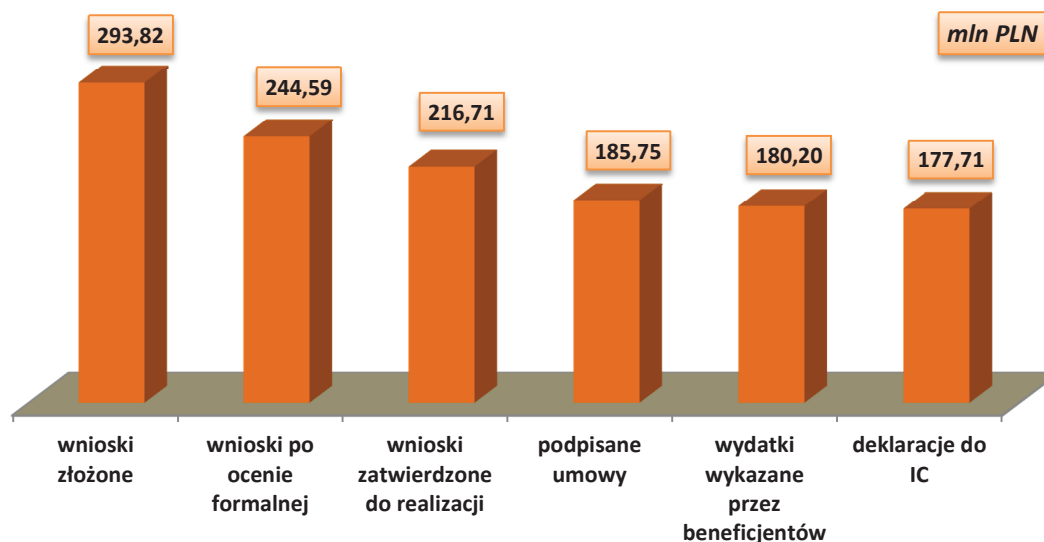

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach Osi 5.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, nie dokonywano oceny formalnej wniosków w ramach Osi priorytetowej 5.

Wnioski zaakceptowane, podpisane umowy

⇒ nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Osi priorytetowej 5.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **2,12 mln PLN** (kwota dofinansowania z EFRR) w ramach następujących działań/poddziałów:

- 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* – **0,54 mln PLN**,
- 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej* – **1,06 mln PLN**,
- 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* – **0,52 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad **1%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **0,68 mln PLN**, co stanowi około **0,4%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.* w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 5.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowanych jest **126 projektów**, w tym **63** z zakresu edukacji, **37** z zakresu ochrony zdrowia oraz **26** z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **123 projektów**, w tym **61** z zakresu edukacji, **37** z zakresu ochrony zdrowia, **25** z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego i kultury.

W ramach Osi priorytetowej 5 założono realizację 8 wskaźników produktu oraz 4 wskaźników rezultatu i obecnie wszystkie te wskaźniki są realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 5 zaprezentowany został w *Tabeli 11*.

Tabela 11. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
5.1	Liczba projektów z zakresu edukacji [szt.]	44	61	138,6	63	143,2
5.2	Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem [szt.]	119	137	115,1	142	119,3
5.3	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia [szt.]	37	37	100	37	100
5.4	Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: [szt.]	69	69	100	69	100
a	szpitale i kliniki [szt.]	18	18	100	18	100
5.5	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	502	501	99,8	503	100,2
5.6	Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [szt.]	16	15	93,7	15	93,7
5.7	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	9	9	100	10	111,1
Wskaźniki rezultatu						
5.8	Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów [osoby/rok]	24 798	24 962	100,7	23 938	96,5
5.9	Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów [osoby/rok]	41 700	41 330	99,1	37 369	89,6
5.10	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem [szt./rok]	316 904	331 919	104,7	321 904	101,6
5.11	Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem [osoby/rok]	348 933	355 042	101,7	344 983	98,9

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację spośród 12 wskaźników **11 zostanie osiągniętych** w granicach 25% rozbieżności od wartości zakładanej. Natomiast 1 wskaźnik przekroczy zakładaną wartość. W ramach przeglądu śródkresowego Programu dokonano zmian wartości docelowych wskaźników ze względu na dodatkowe środki skierowane na obszar edukacji oraz wynikające ze zmiany metodologii szacowania wartości wskaźników.

Obszar: Infrastruktura edukacyjna

Biorąc pod uwagę, iż stan infrastruktury społecznej, w tym oświatowej, bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców, Instytucja Zarządzająca zaplanowała w ramach RPO WO 2007-2013 zadania, których celem było *podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie*. W ramach Poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* oraz 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej* zaplanowano zadania skierowane zarówno do placówek oświatowych na podstawowym i gimnazjalnym poziomie, jak i szkół wyższych, a także placówek oświatowych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (CKU/CKP), służące stworzeniu efektywnego, zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy, systemu kształcenia kadr.

Od uruchomienia Programu realizowane są **63 projekty** z zakresu infrastruktury edukacyjnej, w tym **33** na poziomie regionalnym oraz **30** na poziomie lokalnym. Realizacja **61 projektów** już się zakończyła, w tym **33** z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie regionalnym oraz **28** z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **137** placówek oświatowych o zasięgu regionalnym i lokalnym,
- **30** obiektów zostało dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakupiono ponad **10,5 tys.** zestawów komputerowych i oprogramowania,
- z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów korzysta rocznie: około **25 tys. studentów** oraz ponad **41 tys. uczniów i słuchaczy**.

Regionalna infrastruktura edukacyjna

Instytucja Zarządzająca programując wsparcie na okres 2007-2013 zwróciła uwagę na konieczność poprawy bazy lokalowej i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej na poziomie wyższym, policealnym i ponadgimnazjalnym oraz placówek edukacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. Szczególną uwagę skierowano do potrzeb nauki, która przyczynia się do rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu, zwłaszcza w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne.

Do 30 czerwca br. zakończyła się realizacja **wszystkich 33 zakontraktowanych projektów** w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. Wśród zakończonych projektów **20** realizowanych było przez powiaty, a **13** na uczelniach wyższych i wojewódzkich jednostkach doskonalenia nauczycieli. Łącznie dofinansowano **45** placówek oświatowych, przy czym **14** obiektów dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Około **25 tys.** studentów oraz około **24 tys.** uczniów i słuchaczy skorzystało z efektów projektów. W ramach zrealizowanych inwestycji zakupiono również ponad **10,5 tys.** sztuk sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 2 projektów Miasta Opola dotyczących wsparcia Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Były to *Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu* oraz *Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu-etap II*.

Podstawowym celem ww. projektów była poprawa warunków kształcenia zawodowego w Opolu, prowadząca do zwiększenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i dostosowania umiejętności mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy. Projekty zakładały zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu/wyposażenia, bezpośrednio przeznaczonego do celów dydaktycznych wraz z montażem. W wyniku realizacji obu inwestycji powstały nowoczesne pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Wyposażone zostały m.in. pracownia hotelarska, mechatroniki, obróbki mechanicznej, odnawialnych źródeł energii, diagnostyki samochodowej czy budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Podniósł się standard wyposażenia dydaktycznego CKP, co z kolei wpłynęło na uatrakcyjnienie oferty opolskich szkół zawodowych i zachęciło uczniów do nauki na kierunkach zawodowych zintegrowanych z potrzebami rynku pracy. Z efektów projektów korzysta

1 140 uczniów. Zwiększenie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych przyczyni się do zmniejszenia poziomu zjawisk takich jak bezrobocie czy wykluczenie społeczne, a to w dłuższym okresie czasu do poprawy jakości życia mieszkańców.

Lokalna infrastruktura edukacyjna

Mimo dostosowanej do potrzeb regionu sieci placówek szkolnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, w województwie identyfikowano słabą jakość infrastruktury edukacyjnej oraz niski stopień wykorzystania narzędzi ICT, szczególnie na obszarach wiejskich. W ramach poddziałania 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej* realizowane są projekty mające na celu podniesienie standardu infrastruktury placówek oświatowych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w celu dostosowania ich do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania.

W poddziałaniu realizowanych jest **30 projektów**, a do końca czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **28** z nich. W ramach zakończonych projektów unowocześniono istniejącą infrastrukturę i wyposażenie w **92** placówkach oświatowych szczebla podstawowego i gimnazjalnego, w **16** obiektach dostosowano infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z efektów projektów korzysta już blisko **18 tys.** uczniów.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 2 projektów z zakresu lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

Pierwszy z projektów realizowany przez Powiat Namysłowski dotyczył *Modernizacji bazy dydaktycznej Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim*. Celem ogólnym projektu była poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym, szczególnie w kontekście zwalczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów wiejskich. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował remont budynku w którym funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w skład którego, prócz szkoły podstawowej i gimnazjum, wchodzi również zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Podkreślić należy, że działania w ramach przedmiotowego projektu doprowadziły do poprawy: warunków nauczania, prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacji niepełnosprawnych uczniów ZSS oraz poszerzenia oferty zajęć pozaszkolnych. Osoby niepełnosprawne poruszają się w otoczeniu pozbawionym barier architektonicznych, dzięki czemu zyskały łatwiejszy dostęp do pomieszczeń rehabilitacyjnych i pomieszczeń nauczania.

Drugi projekt zakończony w okresie sprawozdawczym to *Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku*. Inwestycja polegała na przebudowie budynku SOSW w Głogówku i dostosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace w ramach ww. projektu objęły m.in. termomodernizację budynku SOSW, remont dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania czy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zakupiono ponadto sprzęt i wyposażenie trzech klasopracowni, a także oprogramowanie komputerowe pozwalające na prowadzenie zajęć. Wyposażenie klasopracowni w sprzęt komputerowy i multimedialny pozwoliło na wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania, umożliwiło także dostęp do Internetu wychowankom Ośrodka a także dzieciom uczęszczającym do Świetlicy Socjoterapeutycznej. Niewątpliwie projekt Powiatu Prudnickiego przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z miasta i wsi. Warto podkreślić, iż szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne są szkołami bezobwodowymi, uczęszczają do nich uczniowie z miast i wsi całego regionu. Uczniowie biorą udział w zajęciach pozaszkolnych i w kółkach zainteresowań. W zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną, która działa przy MOPS w Głogówku, uczestniczą zarówno dzieci upośledzone ze szkoły jak i inne dzieci, w tym mieszkające na wsi.

Obszar: Ochrona zdrowia

Instytucja Zarządzająca na etapie programowania RPO WO 2007-2013 oceniła, iż ochrona zdrowia ludności województwa opolskiego, rozpatrywana zarówno pod względem personelu medycznego, jak i infrastruktury nie jest zadowolająca. Zaplanowana w ramach działania 5.2 *Rozwój bazy medycznej w*

regionie interwencja, jest odpowiedzią na identyfikowaną w regionie dekapitalizację infrastruktury oraz ograniczony dostęp do kosztownych i nowoczesnych technologii medycznych. Zadania ukierunkowane na budowę, przebudowę infrastruktury, zakup wyposażenia, w szczególności specjalistycznego sprzętu medycznego realizowane są zarówno na rzecz stacjonarnej (Poddziałanie 5.2.1) jak i ambulatoryjnej opieki medycznej (Poddziałanie 5.2.2).

Od uruchomienia Programu zrealizowano wszystkie projekty zakontraktowane w ramach ww. poddziałań ukierunkowanych na ochronę zdrowia. Zrealizowano łącznie **37** projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym **13** w ramach stacjonarnej opieki medycznej oraz **24** w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparcie otrzymało **69** placówek medycznych, w tym **18** szpitali,
- przebudowano **9** instytucji ochrony zdrowia,
- zakupiono **501** sztuk sprzętu medycznego,
- na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie realizowanych jest rocznie **około 332 tys.** specjalistycznych badań medycznych,
- z usług medycznych korzysta ponad **162 tys.** osób.

Stacjonarna opieka medyczna

W ramach poddziałania 5.2.1 realizacja wszystkich projektów zakończyła się przed okresem sprawozdawczym. Ze środków unijnych wsparto **18** placówek medycznych i przebudowano **2** instytucje ochrony zdrowia. Zakupiono **255 sztuk** sprzętu medycznego (m.in. tomografy komputerowe, mammografy, elektroencefalografy, aparaty RTG i USG), który posłuży do realizacji ponad **81 tys.** specjalistycznych badań medycznych rocznie – łącznie z usług medycznych skorzysta ponad **56 tys. osób.**

Ambulatoryjna opieka medyczna

Podobnie, jak w Poddziałaniu 5.2.1, w ramach Poddziałania 5.2.2 realizacja wszystkich projektów zakończyła się przed okresem sprawozdawczym. W ramach zrealizowanych projektów wsparciem objęto **51 placówek medycznych** oraz przebudowano **7 instytucji ochrony zdrowia**. Zakupiono **246 szt.** specjalistycznej aparatury medycznej (m.in. aparaty ultrasonograficzne, rentgenowskie, EKG, USG, EMG), na której będzie można przeprowadzić ponad **250 tys. badań rocznie**. Szacuje się, że liczba osób korzystających z usług ambulatoryjnej opieki medycznej przekroczy **106 tys. osób rocznie**.

Obszar: *Kultura i dziedzictwo kulturowe*

Województwo opolskie charakteryzuje się bogactwem kulturowym, opartym głównie na uwarunkowaniach historycznych przenikających się kultur polskiej, czeskiej i niemieckiej. W regionie znajdujemy wiele zabytków, szczególnie sakralnych. Jednocześnie jednak analiza SWOT RPO WO 2007-2013 wykazała brak atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów turystycznych. Zauważalne są także niższe niż średnie w kraju wskaźniki widzów, słuchaczy, czytelników w instytucjach kultury. Mając jednak na uwadze, iż wsparcie kultury wspomaga społeczno-gospodarczy rozwój regionu oraz buduje przewagi konkurencyjne w oparciu o wykorzystanie potencjału regionalnego, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zdecydowała o wsparciu obszaru kultury. W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia dotyczące rozwoju infrastruktury instytucji kultury, tworzenia urozmaiconej oferty kulturowej regionu, ochrony zabytków i dziedzictwa kultury oraz dziedzictwa naturalnego wspomagające społeczno-gospodarczy rozwój regionu.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **26** projektów, w tym **16** projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego i **10** z zakresu kultury. Realizacja **25** projektów już się

zakończyła, w tym **15** projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz **10** projektów z zakresu kultury.

W ramach zakończonych projektów:

- przebudowano **9** obiektów instytucji kultury i **12** obiektów dziedzictwa kulturowego,
- w przebudowywanych **10** obiektach instytucji kultury oraz w **7** obiektach dziedzictwa kulturowego został zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
- **40** obiektów/zbiorów zostało poddanych konserwacji, a **12** zostało zabezpieczonych,
- szacuje się, że ponad **355 tys. osób** rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem i niemal **429 tys. osób** skorzysta z instytucji kultury.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 1 projektu z zakresu kultury, który dotyczył *Przebudowy Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik przy ul. Wałowej w Nysie*. Potrzeba realizacji projektu wynikała przede wszystkim z niewystarczającej dostępności infrastruktury kulturalnej (NDK) dla mieszkańców Gminy Nysa i południowo – zachodniej części Opolszczyzny. Obiekt posiadał szereg barier architektonicznych uniemożliwiających udział w życiu kulturalnym regionu osobom niepełnosprawnym. Do najbardziej istotnych problemów związanych z niedostosowaniem stanu infrastruktury kulturalnej można było zaliczyć m.in. niewystarczające zaplecze do prowadzenia różnego rodzaju kół zainteresowań, ograniczone możliwości organizowania cyklicznych wystaw, prezentacji (np. malarstwa, fotografii), seminariów, konferencji oraz brak stosowanego wyposażenia i kompleksowej infrastruktury do obsługi tego typu imprez. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji powyższe problemy zostały rozwiązane. Modernizacja umożliwiła pełną dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym. Podwyższony został standard techniczny i estetyczny budynku Nyskiego Domu Kultury. Budynek został dostosowany do wymogów bezpieczeństwa (przeciwpożarowego, sanitarnego, antywłamaniowego, zostaną zapewnione bezpieczne warunki pracy), poprawiła się także funkcjonalność obiektu. Usprawniono układ komunikacyjny, stworzono miejsca na widowni dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, zamontowano windy i podnośniki dla pracowników i użytkowników, poszerzono funkcjonalność obiektu o nowy punkt gastronomiczny i miejsca przeznaczone na wystawy oraz sale konferencyjne. Z kolei wprowadzenie nowoczesnych usług związanych z ICT pozwoliło np. na swobodne kupowanie biletów, czy uzyskanie informacji kulturalnych przez Internet. Najbardziej odczuwalne skutki remontu widoczne są jednak na sali widowiskowej. Nowe oświetlenie, wymiana wykładziny i wygodne fotele zwiększyły komfort uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Inne założenia projektu – a więc m.in. zakup cyberkiosków, tablicy diodowej typu LED oraz infrastruktury medialnej – przyczyniły się do promocji projektu i przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez NDK oraz pozwoliły na uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej na potrzeby mieszkańców Gminy Nysa.

OSŃ PRIORYTETOWA 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Celem Osi priorytetowej 6 jest nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach

Za wdrażanie Osi priorytetowej odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Na realizację przedmiotowej Osi przeznaczono kwotę **34 171 585 Euro**, co stanowi **7%** alokacji na Program. Oś 6 jest jedyną Osią w RPO WO na lata 2007-2013, na którą nie zostały skierowane dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania. Na realizację *Strategii Europa 2020* przeznaczono całą alokację zapisaną na Oś priorytetową 6.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające na: zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni miejskich, porządkowaniu historycznych centrów miast oraz przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji terenom zdegradowanym (w tym poprzemysłowym i powojkowym).

Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 6.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

- ⇒ przeprowadzono **5 naborów wniosków**, w tym **4 w ramach procedury konkursowej** oraz **1 w procedurze pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **35,13 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **30,80 mln Euro**. Na procedurę pozakonkursową obejmującą indywidualny projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF* przewidziano **4,33 mln Euro**.

Nabory wniosków

- ⇒ złożono łącznie **69 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **351,94 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **236,10 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **65 wniosków** na całkowitą wartość **326,10 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **218,13 mln PLN**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **69 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **351,94 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **236,10 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **65 wniosków** na całkowitą wartość **326,10 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **218,13 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **47 projektów**, na całkowitą wartość **277,57 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **178,37 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **45 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **223,49 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **143,92 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **101%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **140,42 mln PLN**, co stanowi ponad **98%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **140,26 mln PLN**, co stanowi ponad **98%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 24-25.

Wykres 24. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

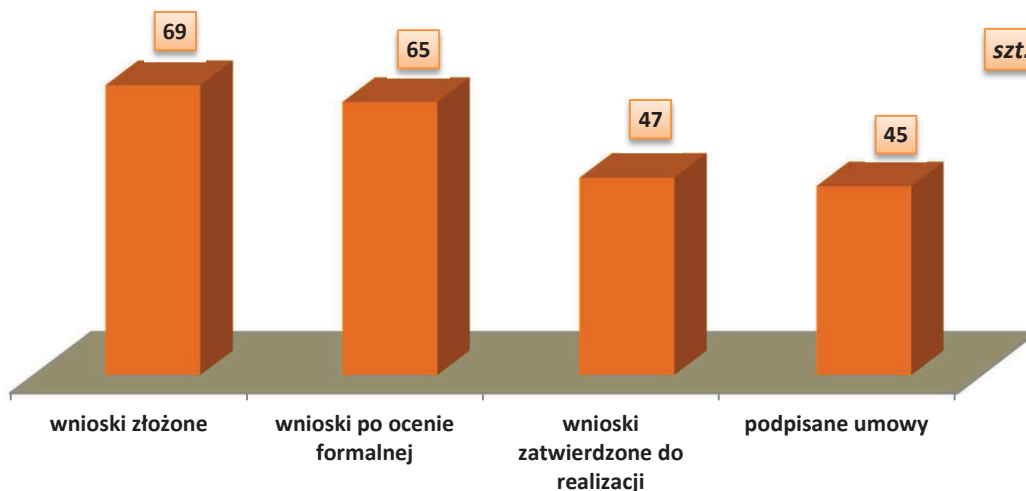

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 25. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

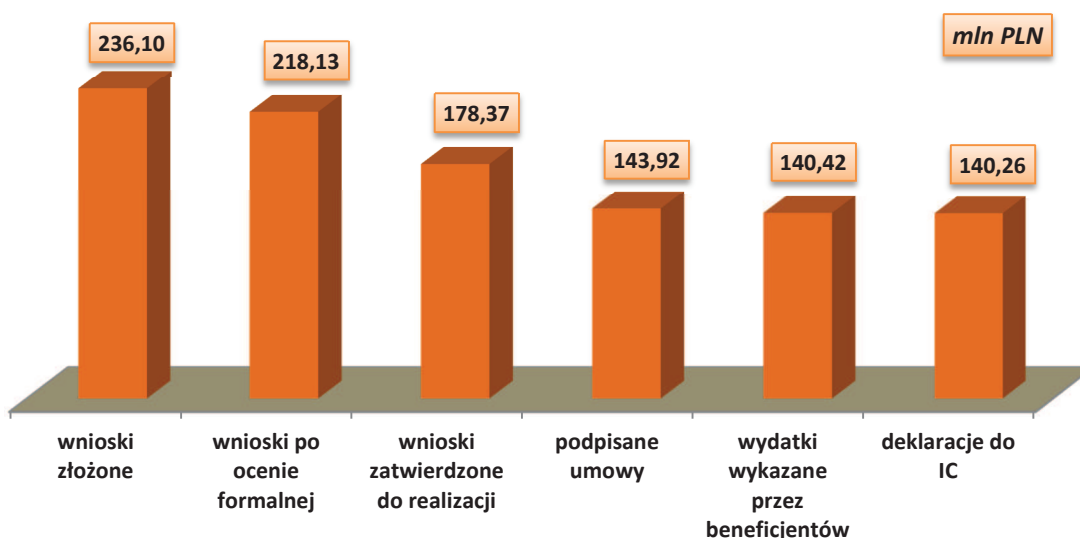

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach Osi 6.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, nie dokonywano oceny formalnej wniosków w ramach Osi priorytetowej 6.

Wnioski zaakceptowane, podpisane umowy

⇒ nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Osi priorytetowej 6.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **3,53 mln PLN**, co stanowi około **2,5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wydatki te wykazano w ramach następujących działań:

- 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – **0,41 mln PLN**,
- 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – **3,12 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **4,84 mln PLN**, co stanowi ponad **3%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 27 października 2014 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 6.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowanych jest **45** projektów, w tym **31** z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz **14** projektów z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **42** projektów, w tym **29** z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i **13** z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych.

W ramach Osi priorytetowej 6 założono realizację 3 wskaźników produktu i 4 wskaźników rezultatu. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 6 prezentuje *Tabela 12*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Tabela 12. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
6.1	<i>Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast [szt.]</i>	30	29	96,7	31	103,3
6.2	<i>Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii [szt.]</i>	4	3	75	3	75
6.3	<i>Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych [szt.]</i>	4	14	350	15	375

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki rezultatu						
6.4	<i>Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym: [km²]</i>	1,87	1,325	70,9	1,349	72,1
a	<i>miejskich [km²]</i>	1,76	1,184	67,3	1,208	68,6
b	<i>zdegradowanych [km²]</i>	0,11	0,141	128,2	0,141	128,2
6.5	<i>Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych [szt. EPC]</i>	35	56	160	57	162,9

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

W ramach Osi priorytetowej 6 do końca okresu sprawozdawczego rozpoczęła się realizacja wszystkich wskaźników. Na podstawie szacowanej realizacji wskaźników 2 spośród 7 zostaną osiągnięte w granicach 25% rozbieżności od wartości zakładanej. 3 wskaźniki przekroczą założoną na etapie programowania wartość docelową. Wartość docelowa wskaźnika *Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych* zostanie ponad 3-krotnie przekroczona, jednak stanowi to wartość dodaną realizacji celów Osi 6, jak również idea realizowanych projektów wpisuje się w jeden z priorytetów *Strategii Europa 2020*.

W przypadku 2 spośród 7 wskaźników tj. *Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu* oraz *Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich* istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej, gdyż na obecnym etapie wartości osiągnięte są na poziomie odpowiednio 72,1% oraz 68,6%. Osiągnięcie wartości na poziomie niższym niż dopuszczalne odchylenie 25% od wartości docelowej jest wynikiem błędnej interpretacji wskaźnika przez beneficjentów na etapie składania wniosków o dofinansowanie i tym samym korygowania tych wartości w trakcie realizacji projektów, jak również wynikiem rezygnacji beneficjentów z dalszej realizacji inwestycji i rozwiązania umów o dofinansowanie.

Obszar: Rewitalizacja obszarów miejskich

Rewitalizacja jako narzędzie wpływające na zrównoważony rozwój miast i podniesienie standardów życia mieszkańców, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla polityki regionalnej.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **31** projektów z zakresu *rewitalizacji obszarów miejskich* na terenie 15 miast Opolszczyzny. Do końca I półrocza 2015 r. zakończyła się realizacja **29** projektów w tym obszarze, w ramach których:

- utworzono **61** miejsc pracy;
- zrewitalizowano **28** obszarów o powierzchni **1,184 km²**;
- zrewitalizowano **25** budynków mieszkalnych;
- zagospodarowano **1** teren poprzemysłowy;
- ponad **263,6 tys.** osób rocznie skorzysta z obiektów poddanych rewitalizacji.

Rewitalizacja obszarów miejskich wprowadza rozwiązania w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Z jednej strony wpływa na wzmocnienie lub odnowę funkcji centrotwórczych, integrujących społeczności lokalne, ale wpływa na budowanie trwałych powiązań między obszarami zurbanizowanymi i wiejskimi. Bardzo istotne jest także podnoszenie atrakcyjności obszarów miejskich, wspieranie wzrostu i tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **1** inwestycji w ramach działania 6.1. Projekt polegał na *Remoncie Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz przebudowie zaplecza dla potrzeb kulturalno – oświatowych integracji młodzieży w Kędzierzynie – Koźlu*. Przedsięwzięcie dotyczyło budynku powstałego w XVIII w. dla zakonu franciszkanów. Zabytkowa budowla, umiejscowiona w historycznym centrum Koźła, ucierpiała w trakcie powodzi tysiąclecia w 1997 r. Obiekt ze względu na fatalny stan techniczny został wyłączony z użytkowania. Niszczeniu podlegały nie tylko mury kościoła i zabudowań poklasztornych, ale również znajdujące się wewnątrz dzieła sztuki o znaczeniu historycznym. Pogarszający się stan zabytkowego obiektu kościoła oraz jego zaplecza wymagał podjęcia natychmiastowych prac renowacyjnych i konserwatorskich zmierzających do ocalenia budynków. Kolejnym problemem, który zdecydował o przystąpieniu do realizacji projektu była niedostateczna liczba obiektów w Kędzierzynie – Koźlu niezbędnych do prowadzenia działalności na rzecz integracji lokalnej społeczności. Obszar, na którym położony jest kościół wraz z zapleczem (Stare Miasto Koźle) charakteryzuje się dużym nagromadzeniem negatywnych zjawisk, takich jak przestępczość oraz długotrwałe bezrobocie – wskaźniki najwyższe w skali miasta. Powstałe centrum integracji młodzieży pozwoli na przeciwdziałanie nasilaniu się patologii społecznych. Prowadzona w obiekcie działalność oświatowa i wychowawcza umożliwi młodym ludziom szeroko pojęty rozwój osobisty. Realizacja projektu, dzięki jego wieloaspektowemu oddziaływaniu (społecznemu, gospodarczemu i przestrzennemu), wpływa na przewyżczanie negatywnych zjawisk. W ramach projektu powstało **1** miejsce pracy. Natomiast dzięki poprawionej infrastrukturze, z efektów realizacji projektu korzystają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści z regionu, kraju oraz zagranicy, w liczbie blisko **34 tys.** osób.

Obszar: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Tereny zdegradowane to obszary, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje: mieszkaniowe, rekreacyjne, produkcyjne, usługowe itd. Dotyczą one głównie terenów powojennych, przemysłowych, popolitycznych, zdegradowanych środowiskowo. Na obszarach tych wspierane jest działanie na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego, zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy warunków wzrostu zatrudnienia.

W ramach działania 6.2 realizowanych jest **14** projektów, w tym **13** projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym oraz projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii*.

Do końca I półrocza 2015 r. zakończyła się realizacja **13** projektów w tym obszarze, w ramach których:

- powstało **56** miejsc pracy;
- powierzchnia zdegradowanych obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu wyniosła **0,14 km²**.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 3 projektów:

- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zrealizowało przedsięwzięcie w wyniku identyfikacji problemów związanych m.in. z otoczeniem społeczno-gospodarczym Korfantowa;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w ramach projektu zagospodarowała tereny i budynki zdegradowane m.in. w wyniku powodzi w 1997 r. na cele dydaktyczno-oświatowe.

Trzeci zakończony w okresie sprawozdawczym projekt nosił tytuł: *Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich*. Przedmiotowy projekt był odpowiedzią na występujące na terenie powiatu strzeleckiego problemy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, rozwoju szeroko rozumianych usług społecznych oraz ochrony środowiska. Zasadniczy problem polegał na utracie walorów ekonomicznych, społecznych i przestrzennych przez zdefiniowany dla niniejszego projektu teren. Obszar, wraz z istniejącym budynkiem, był bardzo zaniedbany i

zdeprawiony. Ze względu na zły stan techniczny, obiekt wyłączony był z użytkowania. Istniejący stan miał wpływ na generowanie się negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. W wyremontowanym budynku powstał multiplex usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców całego powiatu, oferujący bibliotekę powiatową (wraz z czytelnią), regionalną izbę pamięci oraz nowoczesną salę konferencyjną wykorzystywaną przede wszystkim do celów kulturalnych i edukacyjnych. W obiekcie powstał także inkubator dla organizacji pozarządowych. Dzięki realizacji inwestycji, stworzone zostały warunki lokalowe i infrastrukturalne do rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej, co pośrednio wpływa na przeciwdziałanie powstawaniu dysfunkcji społecznych oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu mieszkańców. W ramach projektu założono zatrudnienie **7 osób, w tym 3 kobiet**.

Biorąc pod uwagę dotychczas podpisane umowy w obszarze zagospodarowania terenów zdegradowanych powstanie **57 miejsc pracy**.

OŚ PRIORYTETOWA 7 *Pomoc techniczna*

Ze środków Osi priorytetowej 7 realizowane są zadania, których celem jest wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Na realizację zadań z zakresu przedmiotowej Osi przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **500 000 Euro** pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania. Całkowita kwota alokacji na tę Oś wynosi w ramach EFRR **13 314 344 Euro**, co stanowi **3%** środków na Program z EFRR.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia wspierające IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjno – promocyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu pomocy technicznej RPO WO 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w ramach Osi przedstawiono w punkcie 6. *Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej*.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **15 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ ich całkowita wartość wyniosła **67,36 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **59,42 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **8 umów o dofinansowanie** oraz podjęto **7 decyzji o dofinansowaniu** projektów w ramach pomocy technicznej o całkowitej wartości **66,08 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **60,00 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **101%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **57,13 mln PLN**, co stanowi około **96%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **57,13 mln PLN**, co stanowi około **96%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 7.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 7 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresie 26 oraz w Tabeli 13.

Wykres 26. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

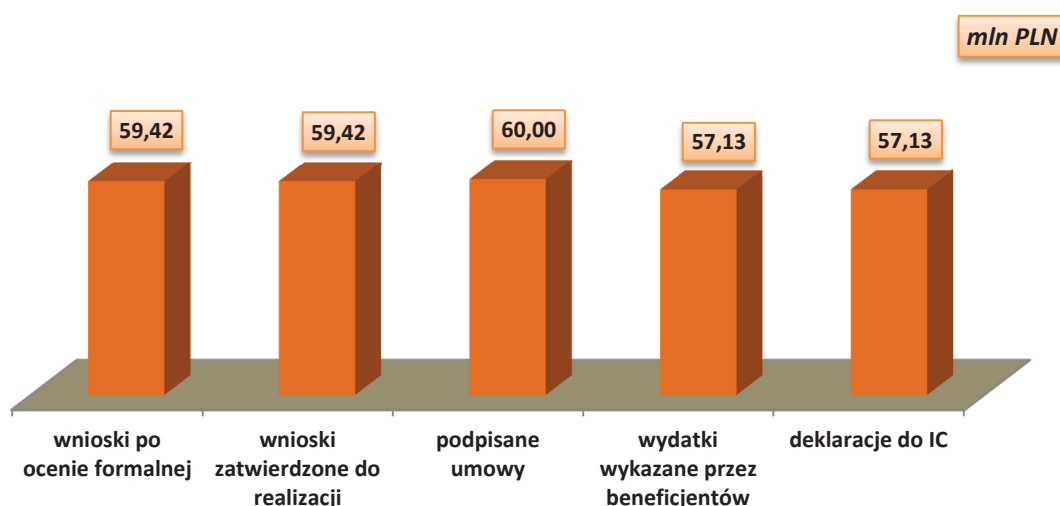

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Tabela 13. Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 – podpisane umowy/ wydane decyzje od uruchomienia Programu

[mln PLN]			
Lp.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej	Liczba umów/ decyzji	Wartość dofinansowania EFRR podpisanych umów/ podjętych decyzji
1.	IZ RPO WO 2007-2013	7	39,34
2.	IP II stopnia	8	20,66
	SUMA	15	60,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 w okresie sprawozdawczym

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymał **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2014 rok – etap II** (Instytucji Pośredniczącej II stopnia);
- ⇒ całkowita wartość ww. planu działań wyniosła **1,80 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **1,80 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym zawarto **1 umowę o dofinansowanie** o całkowitej wartości **1,80 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **1,80 mln PLN**;
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **3%**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **0,74 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **2,13 mln PLN**, co stanowi około **4%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 7.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowanych jest łącznie **15 RPDzPT**. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja **14 RPDzPT** (na lata 2007-2008, na 2009 r., na 2010 r., na 2011 r., na 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r.).

W ramach Osi priorytetowej 7 założono realizację 6 wskaźników produktu oraz 3 wskaźników rezultatu. Wszystkie wskaźniki są obecnie realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 7 prezentuje *Tabela 14*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Tabela 14. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wnioski o płatność		Umowy	
			wartość obecna	%	wartość obecna	%
Wskaźniki produktu						
7.1	Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: [szt. (EPC)]	105	130,14	123,9	39,88	38
a	kobiety	78	106,98	137,2	35,58	45,6
b	mężczyźni	27	23,16	85,8	4,3	15,9
7.2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) [szt.]	121	122	100,8	122	100,8
7.3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów [szt.]	500	565	113	511	102,2
7.4	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów [szt.]	63	55	87,3	57	90,5
Wskaźniki rezultatu						
7.5	Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu [osoby]	14 000	11 683	83,5	9 652	68,9
7.6	Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych [osoby]	90 000	112 226	124,7	94 451	104,9
7.7	Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych [szt.]	1 025 000	1 078 883	105,3	641 683	62,6

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz RPDzPT na lata 2007-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 etap II. Zgodnie z danymi w Załączniku I.

W ramach Osi priorytetowej 7 na obecnym etapie, biorąc pod uwagę szacowaną realizację, 4 wskaźniki zostaną osiągnięte w granicach 25% rozbieżności od wartości docelowej.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację wskaźników w przypadku wskaźników, których wartości zostały osiągnięte na poziomie niższym niż dopuszczalny poziom odchylenia tj. 75% od wartości docelowej określonej na etapie programowania, realizacja ich jest zagrożona. Jednak biorąc pod uwagę zakończone wnioski o płatność, wartości te są osiągnięte.

Ze względu na fakt, iż decyzja o dofinansowaniu *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2015 rok* IZ RPO WO 2007-2013 została wprowadzona do systemu KSI (SIMIK 07-13) już po zakończeniu okresu sprawozdawczego, szacowana wartość wskaźnika *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: kobiety, mężczyźni* odzwierciedla tylko i wyłącznie liczbę miejsc pracy wykazanych przez IP II stopnia w *Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2014 rok - II etap*.

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2015 rok IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, że w ramach Programu finansowane jest 7 etatów, co łącznie z wartością wskaźnika wskazaną przez IP II stopnia daje **46,88 etatów** na poziomie całego Programu. Szacowana wartość wskaźnika nie odpowiada rzeczywistej ilości osób zaangażowanych w realizację Programu, gdyż ze względu na bardzo ograniczone środki PT RPO WO 2007-2013, etaty finansowane do tej pory w ramach PT RPO WO 2007-2013 zaczęto finansować w ramach PT RPO WO 2014-2020 (niezależnie od tego czy osoby zajmujące te etaty zajmowały się realizacją RPO WO 2007-2013 czy RPO WO 2014-2020). Pomiar przedmiotowego wskaźnika w 2015 r. na podstawie rocznych planów działań jest więc niemiarodajny, ze względu na okres przejściowy pomiędzy starą i nową perspektywą finansową i stopniowym angażowaniem coraz większej ilości pracowników we wdrażanie RPO WO 2014-2020.

W przypadku wskaźnika *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: kobiety, mężczyźni* uzasadnionym jest przyjęcie za wartość końcową wartości podanej w RPDz na rok 2014, tj. **130,14**. Odzwierciedla ona rzeczywistą wartość tego wskaźnika z punktu widzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach osi priorytetowej 7 ukierunkowane są na wsparcie procesu wdrażania RPO WO 2007-2013 poprzez wsparcie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Środki te ukierunkowano na wsparcie dwóch obszarów. Po pierwsze mają zapewnić odpowiednie zaplecze kadrowe, stąd wydatkowane są na zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Druga grupa środków dotyczy wzmocnienia organizacyjno – technicznego procesu wdrażania. Ze środków tych dokonywane są zakupy materiałów oraz wyposażenia, zlecane są ekspertyzy, analizy, badania oraz działania informacyjno – promocyjne. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej w ramach Osi 7.

Obszar: Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

Zdolności administracyjne zaangażowanych we wdrażanie Programu instytucji warunkują jego skuteczną i zgodną z prawem realizację.

Zdolności administracyjne zapewnione do obsługi RPO WO 2007-2013 odzwierciedla wskaźnik *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej*, który w ramach dotychczas zrealizowanych RPDzPT wynosi **130,14 etatów**, w tym **106,98 etaty** dla kobiet, natomiast **23,16 etatów** dla mężczyzn.

Od początku wdrażania Programu dla zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych, pozwalających na efektywne i sprawne wdrażanie RPO WO 2007-2013, Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewniły finansowanie udziału pracowników w różnych formach kształcenia zawodowego w obszarze wdrażania funduszy strukturalnych oraz realizowały szkolenia przeznaczone dla pracowników. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją zadań w różnych obszarach wdrażania RPO WO 2007-2013, m.in. w zakresie różnych aspektów zamówień publicznych.

Sprawną pracę osób zaangażowanych w realizację programu, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie środków funduszy strukturalnych warunkuje odpowiednie przygotowanie miejsc pracy

wraz z ich kompletnym i nowoczesnym wyposażeniem. Od uruchomienia Programu zakupiono **122** sztuki zestawów komputerowych, co stanowi prawie **101%** założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)*.

Obszar: Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

W ramach osi priorytetowej 7 współfinansowane są głównie działania związane z monitorowaniem i ewaluacją oraz działania informacyjno-promocyjne, które umożliwią rozpropagowanie wiedzy na temat Programu, a także podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie dostępu i możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych. Ponadto, promocja Programu służy podniesieniu poziomu świadomości opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju regionalnego oraz rezultatach tego wsparcia.

Od uruchomienia Programu przeprowadzono **565** szkoleń, konferencji i seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu. Uczestniczyło w nich łącznie **11 683 osób**. Organizacja różnego rodzaju spotkań z beneficjentami zwiększyła dostęp do informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz obowiązków beneficjenta w zakresie realizacji, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli projektów. Udział w szkoleniach pozwolił ponadto nabyć beneficjentom praktyczne umiejętności w aspekcie rozliczania wniosków o płatność czy promocji projektów unijnych przy wykorzystaniu standardowych i niestandardowych kanałów komunikacji.

Znaczącą rolę w zakresie działań informacyjno-promocyjnych odegrała Sieć Punktów o Funduszach Europejskich, których działania obejmowały w szczególności udzielanie pełnej i kompleksowej informacji o Programie, prowadzonej drogą telefoniczną, e-mailową, korespondencyjną oraz w formie konsultacji bezpośrednich. Ponadto, punkty prowadziły bieżącą wymianę informacji w ramach Sieci oraz współpracowały z organizacjami pozarządowymi z obszaru województwa (wymiana informacji, newslettery, spotkania robocze).

Od uruchomienia Programu materiały opracowywane w zakresie działań informacyjno-promocyjnych znalazły ponad **112 tys. odbiorców**.

W celu sprawnej i efektywnej realizacji Programu od początku wdrażania opracowano **55** ekspertyz i analiz, tym samym wskaźnik *Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów* został osiągnięty na poziomie ponad **87%**. Zlecane ekspertyzy, badania i analizy były odpowiedzią na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania RPO WO 2007-2013, w obszarach wymagających dodatkowej specjalistycznej wiedzy.

Zarówno IZ RPO WO 2007-2013 jak i IP II stopnia prowadziły strony internetowe (www.rpo.opolskie.pl oraz www.ocrg.opolskie.pl), na których na bieżąco zamieszczane i aktualizowane były wszystkie dokumenty z zakresu wdrażania Programu oraz informacje przydatne beneficjentom/ potencjalnym beneficjentom. Strony internetowe obu instytucji odwiedziło około **1,08 mln osób**.


Nakłady przeznaczone na wdrażanie Osi priorytetowej 7 wpłynęły na sprawną i efektywną realizację RPO WO 2007-2013. Poniesione wydatki umożliwiły sprawne funkcjonowanie procesów zarządzania i wdrażania Programem poprzez m.in.: zagwarantowanie odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego zespołu pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażania RPO WO 2007-2013, doksztalcanie personelu, zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego sprawną i efektywną pracę.

W okresie sprawozdawczym ani Instytucja Pośrednicząca II stopnia ani Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie realizowały żadnych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu.

III. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013

IZ RPO WO 2007-2013, mając na celu usprawnienie wdrażania RPO WO 2007-2013 i zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów, opracowuje dokumenty o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym, w tym: dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego, dokumenty dla beneficjentów (Schemat 1).

Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013

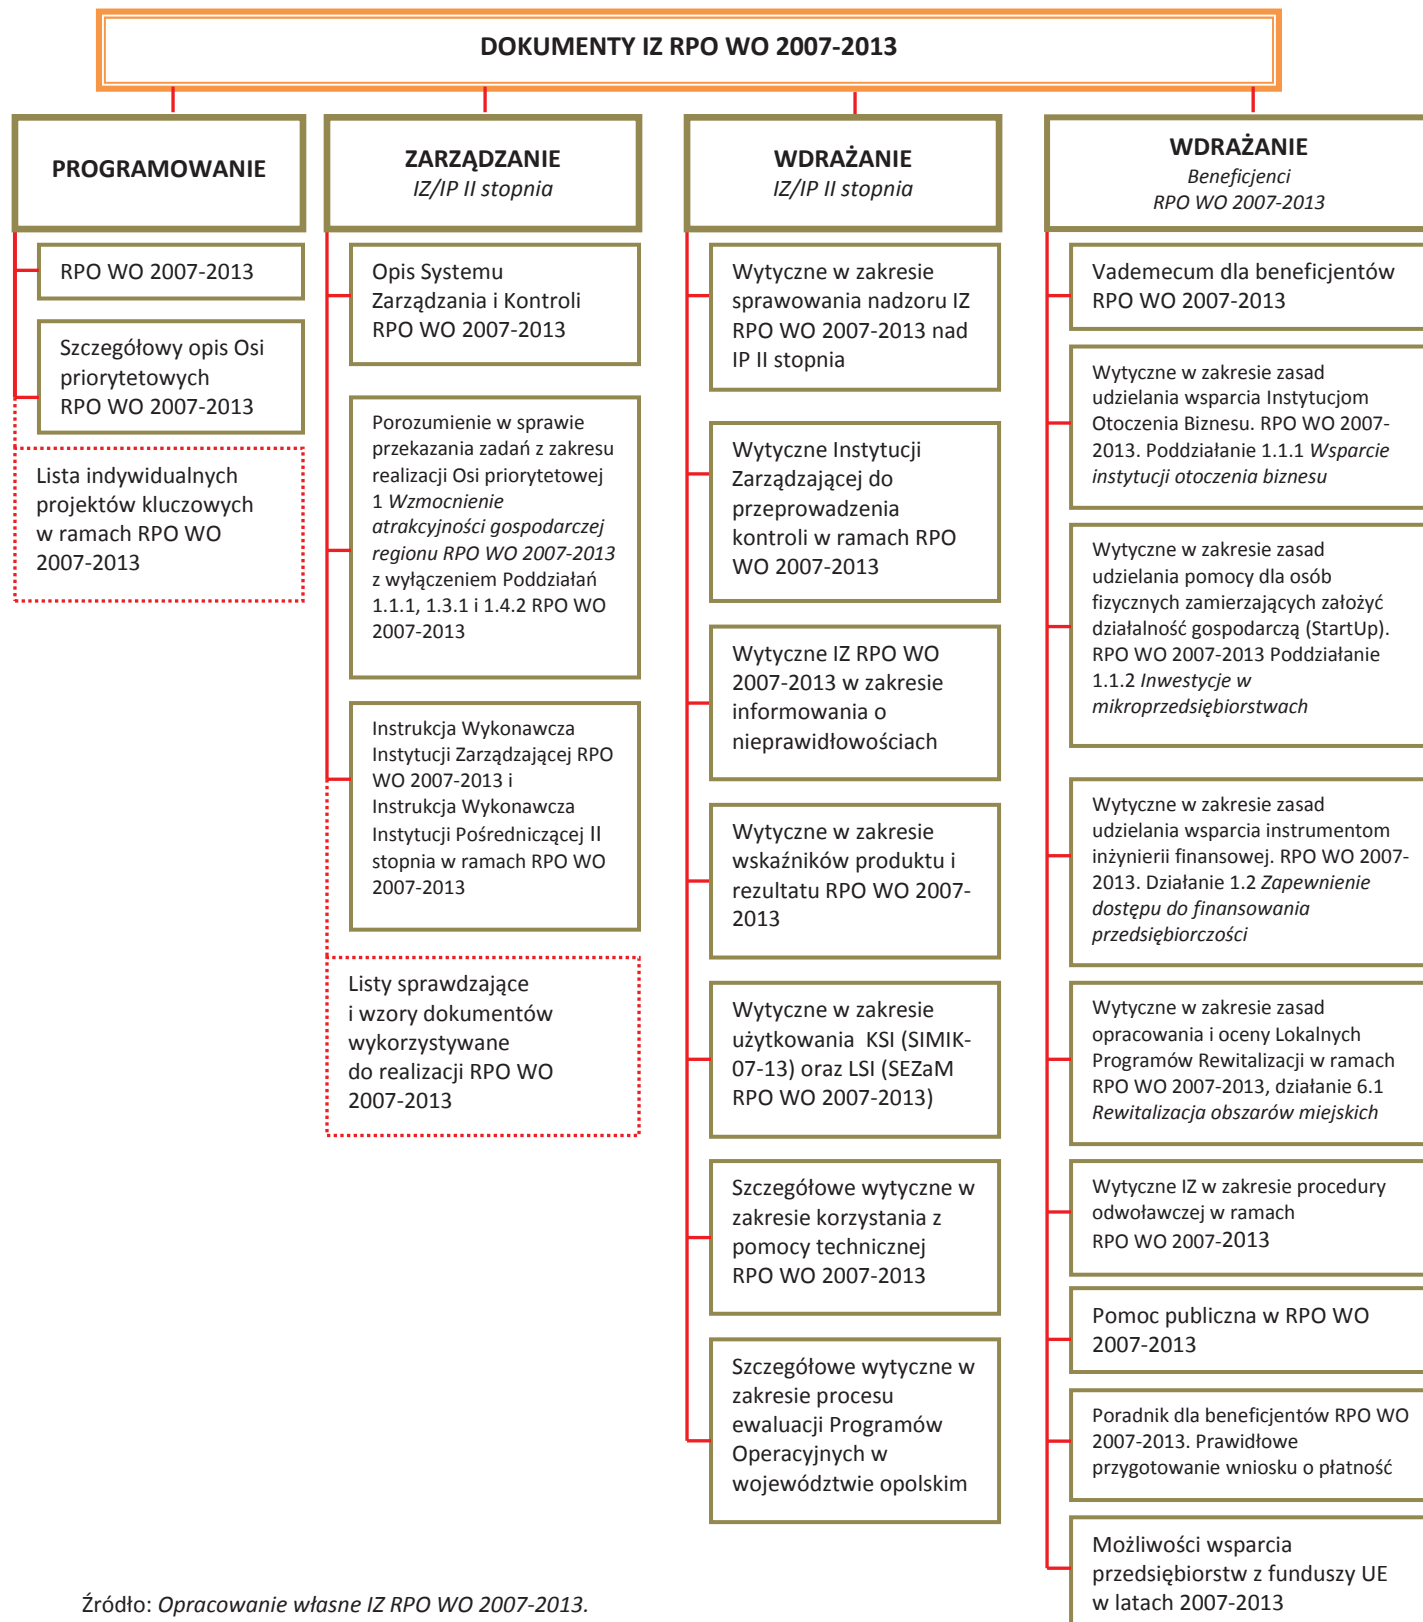

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013.

Dokumenty programowe IZ RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym IZ RPO 2007-2013 realizowała zadania związane z opracowaniem/zmianą następujących dokumentów:

➤ ***Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1324/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 3 stycznia 2008 r. z późn. zm. Dokument jest dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Wszystkich aktualizacji zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cztery aktualizacje.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu dotyczyły m.in.:

- poziomu wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej;
- wielkości kwoty, jaką IP II stopnia otrzyma z budżetu państwa na realizację projektów objętych pomocą publiczną;
- zmian finansowych w ramach Osi priorytetowych 1 i 3.

Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1164/2007* Zarządu Województwa Opolskiego z 26 listopada 2007 r. i stanowi Załącznik 4 *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

➤ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1855/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. Dokument podlega opiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC). W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

➤ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1936/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. Dokument podlega opiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną aktualizację dokumentu.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu polegały m.in. na:

- aktualizacji zapisów procesu 3 w zakresie odwołania do obowiązujących dokumentów;
- modyfikacji zapisów podprocesu 4.4 zgodnie z zaleceniami IPOC ujętymi w Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w IP II;
- aktualizacji zapisów procesu 10 zgodnie z zaleceniami IPOC ujętymi w Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w IP II.

Jednocześnie dokumentem uzupełniającym do Instrukcji wykonawczych IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia są **Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO 2007-2013**. Ww. dokument posiada status akceptacji na poziomie Dyrektora Departamentu Koordynacji

Programów Operacyjnych. Pierwsza wersja przedmiotowego dokumentu została przyjęta przez Dyrektora DPO 30 listopada 2007 r.

Dokument zawiera wzory list sprawdzających oraz pism/notatek wykorzystywanych na poszczególnych poziomach realizacji procedur, tj. na etapie wyboru projektów, wdrażania i zarządzania finansowego, rozliczania i odzyskiwania kwot oraz sprawozdawczości, monitoringu i nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym dokonano jednej aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

➤ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1854/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. z późn. zm. Aktualizacji zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego. Dokument podlega zaopiniowaniu przez IPOC. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną aktualizację. Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu polegały m.in. na:

- zaktualizowaniu spisu wytycznych wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- zaktualizowaniu zapisów dot. IP II zgodnie z Regulaminem organizacyjnym OCRG przyjętym uchwałą ZWO nr 182/2015 z 20 stycznia 2015 r.;
- zaktualizowaniu zadań komórek Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2015 Dyrektora DPO z 1 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień (...).

➤ **Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przygotowany przez IZ RPO WO 2007-2013 dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Składa się z trzech tomów:

- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.

Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną aktualizację Vademecum Tom III. Zmiany w dokumencie wynikają z podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego decyzji o wprowadzeniu zapisów odnośnie definicji podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo w przypadku zamówień udzielanych przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązany do stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz dodaniu, w konsekwencji, załącznika nr 8: *Oświadczenia z wyboru wykonawcy/dostawcy*.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W I półroczu 2015 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia stwierdziły wciąż utrzymujące się sytuacje zakłócające i opóźniające wdrażanie Programu polegające m.in. na wydłużaniu przez beneficjentów okresu realizacji projektów. W celu rozwiązywania lub minimalizowania skutków pojawiających się problemowych zagadnień w/w instytucje korzystały z dotychczas wypracowanych mechanizmów i narzędzi. Ww. przypadki jak i mechanizmy naprawcze zostały przedstawione w poprzednich sprawozdaniach okresowych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu m.in. w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013.

Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Od uruchomienia Programu odbyły się łącznie **33 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013**, natomiast w okresie sprawozdawczym miały miejsce **2 posiedzenia**, na których zgodnie z *Regulaminem prac Komitetu* do zatwierdzenia przedłożone zostało sprawozdanie okresowe (za II półrocze 2014 r.) oraz sprawozdanie roczne (za 2014 r.).

Ponadto zaprezentowano zaktualizowany Zintegrowany Plan Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015, który przyjęto Uchwałą Nr 2/2015.

Tabela 15. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2015 r.

Termin spotkania	Tematy
11 marca 2015 r.	<ul style="list-style-type: none">przyjęcie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> (za II półrocze 2014 r.),przedstawienie zaktualizowanego <i>Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015</i>.
09 czerwca 2015 r.	<ul style="list-style-type: none">przyjęcie <i>Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> (za rok 2014),

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z protokołów KM RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym, w związku z wyborami samorządowymi w listopadzie 2014 r. dokonano następujących zmian w składzie Komitetu:

- Zarząd Województwa Opolskiego w miejsce Pani Barbary Kamińskiej wskazał Pana Grzegorza Sawickiego – Członka Zarządu Województwa Opolskiego;
- Z ramienia Urzędu Miasta Opola, do prac w Komitecie desygnowano Pana Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola i Pana Piotra Dancewicza – Naczelnika Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta;
- Urząd Miejski w Namysłowie zarekomendował na nowego członka Komitetu Pana Juliana Kruszyńskiego – Burmistrza Namysłowa i na jego stałego zastępcę, Pana Rafała Nowowiejskiego – Zastępcę Burmistrza Namysłowa;
- Urząd Miejski w Kietrze do prac w Komitecie desygnował Pana Krzysztofa Łobosa – Burmistrza Kietrza, jako członka Komitetu i Pana Dariusza Kamińskiego – Zastępcę Burmistrza Kietrza, w charakterze jego zastępcy.

Zgodnie z przyjętą procedurą informacja nt. zmian została przedstawiona na XXXII posiedzeniu, a nowi członkowie otrzymali akty nominacyjne.

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2015 r. zostało zrealizowanych **16 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 oraz **1 badanie** dot. RPO WO 2007-2013 zrealizowane w ramach projektu w poddziałaniu 5.2.1 PO KL pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie monitorowania polityk publicznych*.

W okresie sprawozdawczym **przeprowadzono badanie ewaluacyjne** pn.:

➤ ***Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych w województwie opolskim***

Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu 5.2.1 PO KL pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie monitorowania polityk publicznych*.

Głównym celem badania była ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych, w szczególności zrealizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej tych obszarów i ich mieszkańców oraz opracowanie rekomendacji w zakresie skutecznego dopasowania interwencji publicznej i poprawy zarządzania tego rodzaju obszarami w okresie 2014-2020.

Celowi głównemu badania zostały podporządkowane następujące cele szczegółowe:

- analiza i ocena dotychczasowych kierunków interwencji i działań podejmowanych na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i terenów zdegradowanych w województwie opolskim w okresie 2007-2013;
- identyfikacja terenów zdegradowanych i obszarów miejskich wymagających rewitalizacji w województwie opolskim;
- ocena skuteczności, użyteczności i wpływu projektów podejmowanych na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i terenów zdegradowanych, w tym w ramach działania 6.1 i 6.2 RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim;
- identyfikacja potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych w województwie opolskim w latach 2014-2020.

W badaniu zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

- analiza danych zastanych, w tym dokumentacji projektów oraz lokalnych programów rewitalizacji;
- wywiady kwestionariuszowe z JST województwa opolskiego (67 wywiadów) oraz z beneficjentami działań 6.1 i 6.2 RPO WO 2007-2013 (31 wywiadów);
- zogniskowane wywiady grupowe FGI z mieszkańcami obszarów objętych wsparciem (12 wywiadów), z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach RPO WO 2014-2020 (12 wywiadów) oraz z przedstawicielami JST województwa opolskiego (1 wywiad);
- studia przypadku – dobre praktyki;
- benchmarking;
- wewnętrzny panel ekspercki.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem tabeli wdrażania rekomendacji z przedmiotowego badania przez Jednostkę Ewaluacyjną we współpracy z adresatami rekomendacji, wobec czego wnioski i rekomendacje z badania możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2015 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym **podjęto następujące działania** w ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w I półroczu 2014 r.:

- **Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki**
 - przekazanie do wiadomości ZWO raportu z badania ewaluacyjnego (14.04.2015 r.);
 - podjęcie przez ZWO uchwały w sprawie przyjęcia tabeli wdrażania rekomendacji z badania (14.04.2015 r.);
 - przedstawienie wyników i rekomendacji z badania na posiedzeniu KM RPO WO 2007-2013 (25.09.2015 r.);
 - upowszechnienie wyników badania wśród adresatów rekomendacji oraz interesariuszy badania.

W ramach w/w działań w okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu 14 kwietnia 2015 r. przyjął **Tabelę wdrażania rekomendacji** z zakończonego badania ewaluacyjnego:

- **Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki**

W wyniku przeprowadzonych analiz opracowano i przyjęto do realizacji rekomendacje dot.:

 - finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, OZE oraz transportem niskoemisyjnym, realizowanych przez JST w ramach dotacji;
 - dalszego stosowania dofinansowania w formie dotacji w przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, które wiążą się jednocześnie z wysokim ryzykiem inwestycyjnym;
 - prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska jako elementu projektów związanych z ochroną środowiska;
 - wyodrębnienia osobnego działania/poddziałania dotyczącego wsparcia w zakresie działań prośrodowiskowych w ramach pierwszego priorytetu inwestycyjnego lub zastosowanie punktacji opartej o mierzalne kryteria, preferującej innowacyjne działania prośrodowiskowe;
 - włączenia przedsiębiorców jako beneficjentów działań z zakresu efektywności energetycznej.

Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem

W okresie sprawozdawczym w dniu 23 lutego 2015 r. miało miejsce drugie spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM). Tematyką spotkania było przedstawienie m.in. planu badań, analiz, ekspertyz i ewaluacji na 2015 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego, stanu realizacji prac badawczych w ramach *Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego* oraz stanu realizacji działań ewaluacyjnych w ramach *Jednostki Ewaluacyjnej*.


Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych

Zgodnie z zapisami *Szczegółowych wytycznych w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim* monitoring wdrożenia rekomendacji odbywa się raz w roku przy współpracy z adresatami rekomendacji. Najbliższy monitoring będzie miał miejsce w II półroczu 2015 r.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym⁷

⁷ Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce:
	18 sierpnia 2015 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na etapie procesu oceny projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 tj. oceny formalnej oraz oceny merytorycznej I i II stopnia, w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym nie ma konieczności podejmowania działań zapobiegawczych w przedmiotowym zakresie.

Na etapie wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, IZ RPO WO 2007-2013 była zobowiązana do dnia 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania części dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych przed opublikowaniem jej przez beneficjenta. Od ww. terminu, czyli od czasu przyjęcia nowych wzorów umów o dofinansowanie projektu, IZ RPO WO 2007-2013 nie weryfikuje dokumentów dotyczących zamówienia publicznego przed jego ogłoszeniem. Na etapie weryfikacji wniosków o płatność weryfikowana jest zgodność pod kątem przedmiotowym i podmiotowym treści zawartej umowy z wykonawcą z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Prawidłowość stosowania prawa zamówień publicznych jest szczegółowo weryfikowana na etapie kontroli realizacji projektu, odbywającej się na miejscu u Beneficjenta.

Na etapie kontroli projektów IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła występowania problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach, 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych

przez przedsiębiorstwa, 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny, 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT, 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713), rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1599 i Dz. U. z 3.12.2013, poz. 1431);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711), rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1535);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317) zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1562) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. (poz.801);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787).

Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy (Załącznik nr III).*

⇒ **Pomoc publiczna przekazana od uruchomienia Programu do końca I półrocza 2015 r.**


Pomoc publiczna została przekazana 706 podmiotom w wysokości 604,93 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym m.in.: 669 przedsiębiorstwom, gminom i ich jednostkom organizacyjnym (14 projektów), jednostkom badawczo – rozwojowym (4 projekty), kościołowi katolickiemu (3 projekty) i organizacji pracodawców (2 projekty) oraz innym podmiotom (14 projektów).

- **Pomoc de minimis została przekazana na realizację 380 projektów na kwotę 102,53 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny, co stanowi **16,95%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.1.2 (344 projekty na kwotę 90,85 mln PLN), 1.4.1 (35 projektów na kwotę 11,40 mln PLN) oraz 1.1.1 (1 projekt na kwotę 0,28 mln PLN), z czego 372 projekty realizowane są przez mikroprzedsiębiorstwa, 7 projektów przez małe przedsiębiorstwa, oraz 1 projekt przez fundację.

- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 297 projektów na kwotę 428,82 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **70,89%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.3.2 (209 projektów na kwotę 240,19 mln PLN), 1.4.1 (78 projektów na kwotę 144,20 mln PLN), 1.4.2 (10 projektów na kwotę 44,43 mln PLN). Beneficjentami pomocy są małe przedsiębiorstwa (119 projektów) mikroprzedsiębiorstwa (95 projektów), średnie przedsiębiorstwa (67 projektów), jednostki samorządu terytorialnego (10 projektów), kościół katolicki (3 projekty), duże przedsiębiorstwo (2 projekty) oraz stowarzyszenie (1 projekt).
- **Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **16 projektów na kwotę 50,55 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **8,35%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie otrzymało 6 mikroprzedsiębiorstw, 2 organizacje pracodawców, 2 jednostki samorządu terytorialnego, 2 średnie przedsiębiorstwa, 2 duże przedsiębiorstwa, 1 małe przedsiębiorstwo, oraz 1 fundacja.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostkom badawczo – rozwojowym i województwu (**5 projektów na kwotę 10,81 mln PLN** wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **1,79%** całości udzielonej pomocy publicznej.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki** w ramach działania 4.3 udzielono dużym przedsiębiorstwom działającym na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (**4 projekty na kwotę 8,22 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **1,36%** całości udzielonej pomocy publicznej.
- **Pomoc na rewitalizację** w ramach działań 6.1 i 6.2 udzielona została na realizację **4 projektów na kwotę 4,0 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **0,66%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie udzielono jednostkom samorządu terytorialnego, uczelni wyższej oraz wspólnocie mieszkaniowej.


Udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej przedstawia Wykres 27, natomiast udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy przedstawia Wykres 28.

Wykres 27. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej

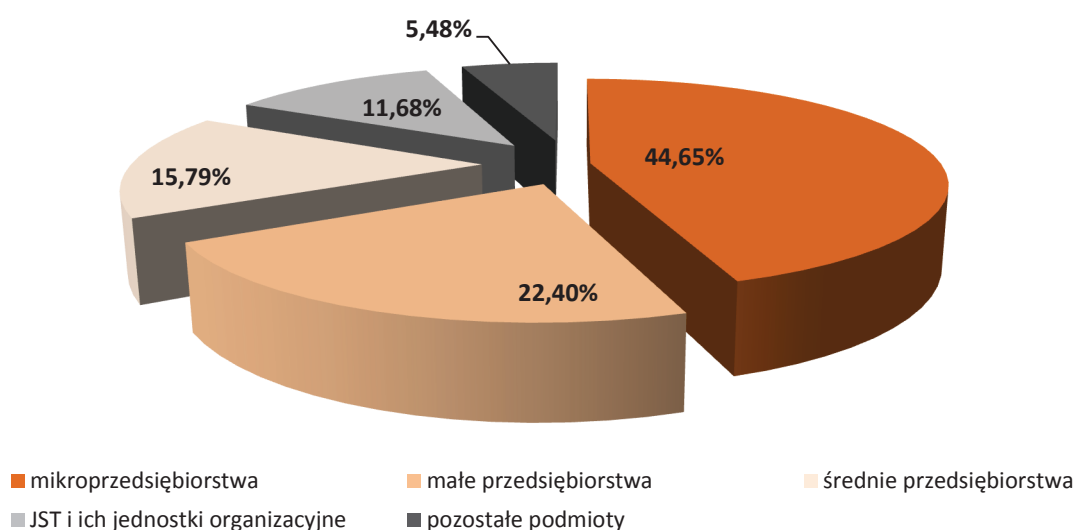

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 28. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

⇒ **Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym**

W I półroczu 2015 r. pomoc publiczna została przekazana 46 podmiotom w wysokości 24,83 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 41 przedstawicielom sektora MSP, oraz 5 innym podmiotom.

Wartość pomocy udzielonej w I półroczu 2015 r. stanowi ponad 4% całości pomocy udzielonej beneficjentom od początku realizacji Programu.

Wykres 29. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej

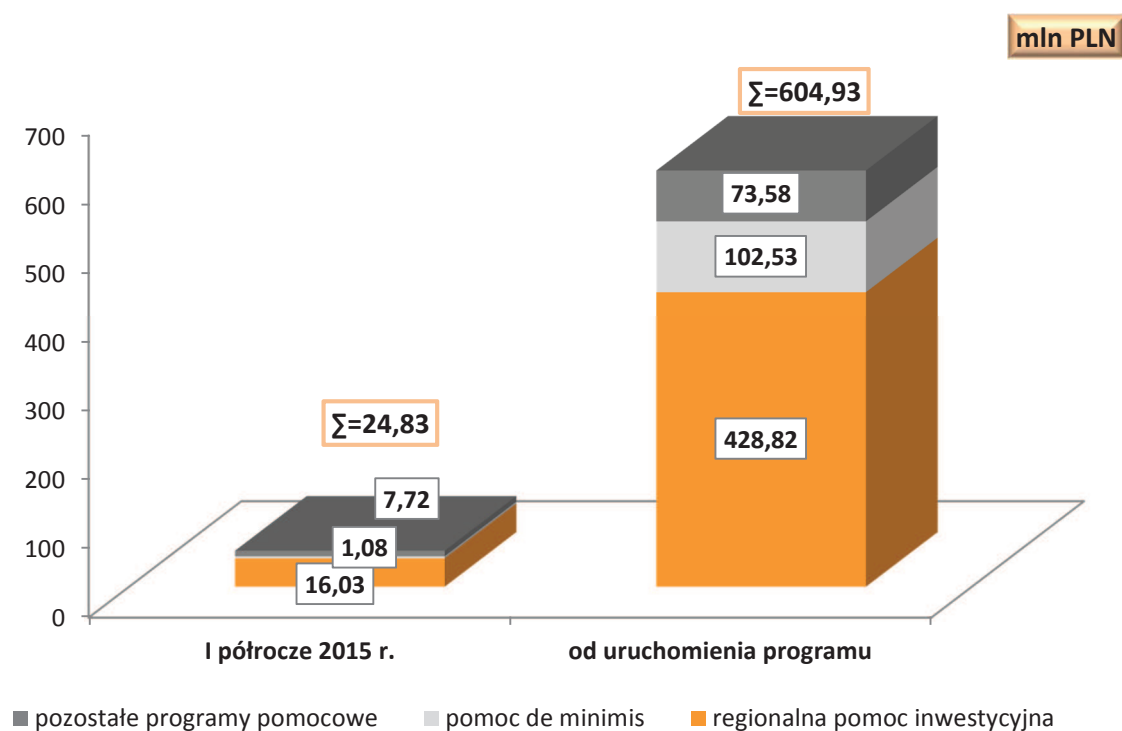

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali **2 projekty**. Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2014 rok – etap II*. Natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 realizowała projekt: *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2015 rok*, w ramach którego decyzja o dofinansowaniu została wprowadzona do KSI już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Łączna kwota realizowanych projektów wyniosła **2,50 mln PLN**.

W okresie sprawozdawczym w KSI (SIMIK 07-13) został zarejestrowany **1 wniosek o płatność** (wniosek końcowy IZ RPO WO 2007-2013 w ramach *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2014 rok*) o ogólnej wartości wydatków i wartości dofinansowania z EFRR **0,74 mln PLN**. Obejmował on finansowanie kosztów związanych głównie z zatrudnieniem, utrzymaniem biur, realizacją działań informacyjno-promocyjnych, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, badaniami ewaluacyjnymi i ekspertyzami.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano istotnych problemów związanych z wdrażaniem projektów pomocy technicznej.

Tabela 16. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	628 832,11	628 832,11
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	891,00	891,00
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	42 517,62	42 517,62
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	4 011,85	4 011,85
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	1 536,89	1 536,89
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	38 150,50	38 150,50
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	2 775,44	2 775,44
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	19 314,22	19 314,22
9.	Obsługa procesu kontroli projektów	0,00	0,00
RAZEM		738 029,63	738 029,63

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz danych z wniosków o płatność Beneficjenta.

Tabela 17. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	1 020 799,39	1,70%
2.	Zatrudnienie	-	41 393 465,06	68,99%
3.	Sprzęt komputerowy*	-	7 573 952,77	12,62%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych*	-		
5.	Promocja	-	5 612 663,91	9,36%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo*	-	1 326 508,64	2,21%
7.	Ewaluacje*	-		
8.	Kontrola/audyt	-	59 374,64	0,10%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów*	-	1 780 521,93	2,97%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów*	-		
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 086 605,10	1,81%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,24%
RAZEM		15	59 996 251,23	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz załączników do Decyzji/Umów o dofinansowanie.

* Ze względu na to, iż pozycje „Sprzęt komputerowy” i „Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych” stanowią część jednej kategorii wydatków w ramach Rocznych Planów Działań, związanej z utrzymaniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, dane nt. kosztów w ramach obydwu rodzajów wydatków wykazano sumarycznie, podobnie jak ma to miejsce w składanych przez obie Instytucje wnioskach o płatność. Z tego względu wydatki te nie zostały rozdzielone na odrębne rodzaje, wskazane w Tabeli nr 17. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do pozycji:

- „Organizacja procesu wyboru projektów” i „Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” w przypadku IP II RPO WO 2007-2013;
- „Ekspertyzy/ doradztwo” i „Ewaluacje”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Ewaluacje, analizy, ekspertyzy” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. druk ogłoszeń prasowych, ulotek, publikacje ogłoszeń, wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.)” (kat. 86) lub „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” (kat. 85) w przypadku IP II RPO WO 2007-2013.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie realizowały w I półroczu 2015 r. żadnych działań informacyjnych ani promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013. Wobec powyższego **Załącznik nr IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji** nie został wypełniony i dołączony do sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej


Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Marta Sobańska
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 485, m.sobanska@opolskie.pl fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	18 sierpnia 2015 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 510, marszalek@opolskie.pl, fax 77 54 16 512
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	
	<p>MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA</p>  <p>Andrzej Buła</p>

Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

UWAGI OGÓLNE:

1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,1289 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

3) Wartości docelowe dla roku 2010 podano na podstawie 33 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (przed renowacjami Programu), przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 1657/2011 z 28 grudnia 2011 r.

4) Wartości docelowe dla lat 2013 i 2015 roku podano na podstawie 69 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (po renowacjach Programu), przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 731/2015 z 16 czerwca 2015 r.

5) Większa wartość wskaźnika w wierszu "realizacja" niż "szacowana realizacja" wynika z faktu, iż beneficjent osiągnął większą wartość wskaźnika niż zakładał na etapie umowy.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	6	10	16	20	24	36	42	59	66	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	64	-	80								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	17	24	43	66	68									
- w MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2	2	2	4	8	18	21	33	40	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	30	-	38									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	2	8	21	40	41									
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	57	61	68	127	127	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	112	-	140									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	10	55	57	116	127	143									
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	418	453	493	515	559	576	623	657	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	262	-	-	540	-	674									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	408	476	549	607	663	696									
- mikro: do 9 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	327	356	390	397	418	424	449	463	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	204	-	-	380	-	475									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	323	370	423	443	468	494									

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- małe: 10–49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	57	61	67	80	94	98	114	124	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	105	-	-	-	131	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	58	67	83	105	126	129	-	-	-	-	-	
- średnie: 50–249 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	18	24	34	36	36	38	47	54	60	70	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	54	-	-	-	68	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	30	39	43	59	69	73	-	-	-	-	-	
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73	77	82	88	104	113	126	143	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	112	-	-	-	140	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	75	85	96	122	146	151	-	-	-	-	-	
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	8	8	13	16	18	21	23	23	23	23	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	18	-	-	-	22	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	23	24	24	24	-	-	-	-	-	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	5	14	28	63	89	106	120	134	142	148	148	160	167	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	158	-	-	-	197	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	91	125	159	166	171	186	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	18	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	29	-	-	-	36	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	19	18 ⁴	18	-	-	-	-		
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	18	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	23	-	-	-	29	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	19	18 ⁴	18	-	-	-	-		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32	24,90	23,91	24,32	24,5	24,4 ²	24,7	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20,4	-	25,5	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10,84	9,5	18,55	18,12	24,4	24,7	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	17	36	45	60	76	89	95	109	112	131	139	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	139	-	174	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	65	79	108	126	140	143	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	10,81	13,80	13,91	13,85	14,02	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	13,7	-	17,1	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	12,75	13,85	13,89	14,07	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	5	7	7	10	15	27	34	50	57	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	54	-	68	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	10	15	35	57	58	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	6	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	27	-	34	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	9	9	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	6	11	23	30	46	51	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	27	-	34	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8	11	28	48	49	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym: ⁵	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	67	182	424	1 012,5	1 285,5	1 582,5	1 763,5	1 993,5	2 142,4	2 345,38	2 422,38	2 719,88	2 864,08	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	616	-	-	-	2 464	-	3 080	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1 665	1 930	2 352	2 700,5	2 949,5	3 050,5	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	30	83	203,5	258,5	307,5	370,5	434,5	461,5	477,5	494,5	572,5	594,5	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-	-	1 232	-	-	-	-	1 540	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	379	414	476	569	622	621 ⁴	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	62	152	341	809	1 027	1 275	1 393	1 559,0	1 680,9	1 867,88	1 927,88	2 147,38	2 269,58	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-	-	1 232	-	-	-	-	1 540	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 286	1 516	1 876	2 131,5	2 327,5	2 429,5	-	-	-	-	-	-
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	89	130	291	516	629	704	822	869,8	983,75	1 016,75	1 178,25	1 242,45	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	296	-	-	-	-	1 186	-	-	-	-	1 482	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	637	779	1 055	1 186	1 319	1 366	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	51	154	216	299	412	494	580	669	700	899	940	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	717	-	-	-	-	896	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	288	445	660	784	908	908	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	21	64	93	102	170	183	220	224	234	301	309	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	358	-	-	-	-	448	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	105	183	222	249	290	290	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	30	90	123	197	242	311	360	445	466	598	631	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	358	-	-	-	-	448	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	183	262	438	535	618	618	-	-	-	-	-	-
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	31	92	125	159	225	244	310	328	447	473	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	378	-	-	-	-	473	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	120	166	302	387	449	449	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	23	27	52	52	137	137	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	136	-	-	-	-	170	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	17	35	51	161	206	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	2,83	8,69	26,58	37,75	46,72	59,10	72,96	76,58	94,42	99,17	126,51	136,03	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	39,46	-	-	-	-	137,0	-	-	-	-	171,2	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	50,14	62,73	95,05	116,18	142,63	150,99	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484	548	574	618	638 ³	637 ⁶	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	416	-	-	-	-	520	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	82	202	409	409	529	529	-	-	-	-	-	-	

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

² Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

³ Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

⁴ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

⁵ Na wartość wskaźnika agregują się wartości dotyczące miejsc pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 (wskaźnik 8), 1.3.2 (wskaźnik 27) oraz 1.4.1 (wskaźnik 35).

⁶ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z korekty wskaźnika.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 1 **Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu**

1.1																						
Rozwój przedsiębiorczości																						
1.1.1																						
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																						
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1:			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	10	12	21	23	-	
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu	szt.	P.5.1.1	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	18		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	12	27	33						
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 2:			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6	17	23	27	52	52	137	137	-		
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	136	-	-	170					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	17	35	51	161	206								
Wskaźnik 3:			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	915	961	1 051	2 150	2 190	3 949	4 832	-		
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	R.5.1.1	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	1 980	-	-	2 475					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	926	1 942	2 189	4 943	5 443								
Wskaźnik 4:			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	27	53	57	90	105	-		
Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	R.3.2.3	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	74					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	21	34	57	131	175								
Wskaźnik 5:			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	1,0	1,11	1,24	1,5	8,32	9,1	-		
Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	22,52	-	-	28,1					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,05	0,29	1,48	1,69	9,46	11,74							
1.1.2																						
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 6:			Realizacja	-	0	0	3	20	39	81	221	252	285	300	319	324	328	331	336	342	-	
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	278	-	-	347					
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	271	309	335	337	343	370							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	4	-	4	-	4	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	4	11	22	54	79	92	103	110	115	116	116	118	119	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	114	-	142	-	142	-	142	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	73	102	120	119	118 ⁵	134	-	134	-	134	-	134	-
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	18	18	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	29	-	36	-	36	-	36	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14	20	19	18 ⁵	18	-	18	-	18	-	18	-
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	18	18	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	23	-	29	-	29	-	29	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14	20	19	18 ⁵	18	-	18	-	18	-	18	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 8: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	55	108	199	580,5	698,5	790,5	832,5	918,5	924,3	938,25	945,25	971,75	989,75	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	902	-	1 128	-	1 128	-	1 128	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	772	864	966	981	1 001	1 091	-	1 091	-	1 091	-	1 091	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	1	11	30	102,5	115,5	133,5	139,5	150,5	153,5	160,5	165,5	171,5	174,5	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	451	-	564	-	564	-	564	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	141	153	158	167	170	182	-	182	-	182	-	182	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	54	97	169	478	583	657	693	768	770,8	777,75	779,75	800,25	815,25	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	451	-	564	-	564	-	564	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	631	711	808	814	831	909	-	909	-	909	-	909	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	26	52	79	184	286	332	369	418	426,8	431,75	433,75	437,25	442,25	-		
			Wartość docelowa								240						456				569			
			Wartość bazowa																				0	
			Szacowana realizacja										321		364		450		452		460		486	
Wskaźnik 9: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	1,02	2,83	7,83	10,6	12,6	14,15	16,77	16,33	16,98	17,46	17,92	18,66	-		
			Wartość docelowa								7,58						30,32				37,9			
			Wartość bazowa																				0	
			Szacowana realizacja										13,74		14,54		18,45		18,66		19,29		20,92	
1.2		Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości																						
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32	24,9	23,91	24,32	24,50	24,4 ¹	24,7	-		
			Wartość docelowa								2						20,4				25,5			
			Wartość bazowa																				0	
			Szacowana realizacja										10,84		9,50		18,55		18,12		24,4		24,7	
Wskaźnik 11: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.	P.5.8.1 P.5.8.2	Realizacja		-	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	-		
			Wartość docelowa								1						5				6			
			Wartość bazowa																				0	
			Szacowana realizacja										3		3		3		3		5		5	
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484	548	574	618	638 ²	637 ⁶	-		
			Wartość docelowa								11						416				520			
			Wartość bazowa																				0	
			Szacowana realizacja										82		202		409		409		529		529	
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych kredytów i pożyczek	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	0	1,83	11,34	14,52	14,12	15,18	18,37	19,72	21,43	23,43	24,17 ²	24,4	-		
			Wartość docelowa								2						19,4				24,3			
			Wartość bazowa																				0	
			Szacowana realizacja										5,47		9,12		18,00		17,58		23,49		23,78	
1.3		Innowacje, badania, rozwój technologiczny																						
1.3.1		Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw																						

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	16	16	18	21	26	26	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	34	-	-	42	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	15	16	22	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	57	61	68	127	127	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	112	-	-	140	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10	55	57	116	127	143	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	19	-	-	24	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	9,5	-	-	12	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	9,5	-	-	12	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 17: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,33	0,47	0,77	0,74	0,91	1,03	1,3	1,32	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	9,2	-	-	11,5	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,28	0,48	0,55	0,83	1,09	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 18: Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	16	16	26	32	43	58	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	16	-	-	20	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5	16	16	42	38	59	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015																						
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II																						
Wskaźnik 19: Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	R.3.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	5	7	12	-																					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8	-																					
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	11	11	11	11	20	-																					
1.3.2																						Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																					
Wskaźniki produktu																																											
Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	4	8	18	21	33	40	-																						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30	-	-	-	38	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	21	40	41	-																										
- w MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	4	8	18	21	33	40	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	38	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	2	2	2	8	21	40	41	-																											
Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	10	32	48	66	84	91	100	113	141	153	178	202	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	143	-	-	-	179	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	85	102	123	163	206	212	-																													
- mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	4	7	9	14	20	20	29	32	42	46	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	30	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	16	24	35	49	48 ⁵	-																													
- małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	6	19	27	37	44	45	49	60	70	72	82	92	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	91	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	44	51	61	74	94	97	-																													
-średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	4	12	17	22	31	32	31 ⁵	33	42	49	54	64	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	58	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	27	35	38	54	63	67	-																													

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73	77	82	88	104	113	126	143	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	112	-	-	140				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	75	85	96	122	146	151							
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	4	9	12	14	17	19	19	19	19	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	18				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8	15	19	20	20	20							
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	2	2	4	4	6	8	10	10	13	16	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	16	-	-	20				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5	9	13	17	20	19 ⁵							
Wskaźnik 22: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	10,81	13,80	13,91	13,85	14,02	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	13,7	-	-	17,1				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	12,75	13,85	13,89	14,07							
Wskaźnik 23: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	P.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	7	9	9	9	9	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	7				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	9	9	9							
Wskaźnik 24: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	P.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	6	6	6	6	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	7	7							
Wskaźnik 25: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	P.6.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R- etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	3	4	6	6	8	13	25	32	47	54	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	35	-	-	44							
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6	8	13	32	54	55									
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	5	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	17,5	-	22								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	3	6	8	8									
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	5	10	22	29	44	49	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	17,5	-	22								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	7	10	26	46	47									
Wskaźnik 27: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	39	185	304	397	526	582	644	731,1	831,13	870,13	947,13	1 034,33	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	56	-	-	-	932	-	1 164								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	592	695	819	1 043,5	1 154,5	1 165,5									
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	5	34	44	57	83	87	127	129	135	137	143	155	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	-	466	-	582								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	121	110	137	202	214	201 ⁵									
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	34	151	260	340	443	495	517	602,1	696,13	733,13	804,13	879,33	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	-	466	-	582								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	471	585	682	841,5	940,5	964,5									
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	23	37	49	144	178	182	185	205	263	276	315	348,2	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	-	372	-	465								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	183	255	313	372	435	456									

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 28: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,35	4,18	8,9	11,97	16,5	19,78	24,48	25,51	32,64	35,34	41,68	46,94	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	-	35,68	-	-	44,6	-	-	-	44,6	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	15,63	24,19	34,11	44,01	52,58	54,52	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów/usług	szt.	R.7.4.1	Realizacja	-	0	0	0	0	8	47	68	121	183	213	272	291	343	361	395	423	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	286	-	-	357	-	-	-	357	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	144	285	314	388	442	449	-	-	-	-	-	449
Wskaźnik 30: Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.	R.7.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	6	12	19	31	35	46	57	66	104	118	146	168	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	78	-	-	97	-	-	-	97	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	42	55	75	128	170	175	-	-	-	-	-	175
Wskaźnik 31: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla	tony/rok	R.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,43	1,43	1,43	1,68	1,68	1,68	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12,5	-	-	15,68	-	-	-	15,68	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,68	1,68	16,48	16,48	16,48	-	-	-	-	-	16,48
Wskaźnik 32: Zmiana ilości wytwarzanych odpadów	tony/rok	R.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	8 000	8 121	8 137,76	8 150,86	8 151,86	1,651,86 ⁴	1 766,86	1 766,86	1 815,56	2 541,56	2 541,56	2 541,56	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	7 834	-	-	9 792	-	-	-	9 792	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	8 127,68	9 636,86	1 766,86 ⁴	1 811,86	1 811,86	1 811,86	-	-	-	-	-	1 811,86
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																						
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 33: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	78	90	92	109	113	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	118	-	-	148	-	-	-	148	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	52	65	91	107	114	114	-	-	-	-	-	114
Wskaźnik 34: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	78	90	92	109	113	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	118	-	-	148	-	-	-	148	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	46	65	91	107	114	114	-	-	-	-	-	114

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	33	42	51	53	61	61	71	75	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	98	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	38	45	64	71	76	76							
- małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	13	16	18	20	24	26	32	32	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	32	-	-	40	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	16	22	31	32	32								
- średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	5	6	6	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	10	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	4	5	5	6	6								
oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	2	4	7	8	10	13	18	19	22	22	29	32	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	28	-	-	35	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13	14	26	30	33	33								
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	40	128	190	266	349	431	487	576	607	801	840	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	630	-	-	788	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	301	371	567	676	794	794								
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	57	86	91	144	157	179	182	192	258	265	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	315	-	-	394	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	117	151	181	200	238	238								
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	21	71	104	175	205	274	308	394	415	543	575	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	315	-	-	394	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	184	220	386	476	556	556								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	14	14	30	86	119	153	219	238	289	307	426	452	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	358	-	-	448	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	133	160	292	362	424	424	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	25	29	213	333	373	410	459	459	558	590	954	954	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	598	-	-	747	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	610	477	621	611	1 009	1 009	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 37: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	0,46	0,49	1,74	3,83	7,07	11,37	15,17	16,28	21,38	22,31	35,56	37,5	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	25,36	-	-	31,7	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	7,36	11,2	23,15	29,71	37,73	38,19	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2		Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																						
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 38: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	2	9	10	11	14	15	17	19	20	22	26	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	21	-	-	26	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	13	14	17	19	26	29	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja		-	0	0	0	0	0	11	26	26	33	63	63	93	93	93	98	100	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	86	-	-	108	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	39	74	93	108	114	114	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	0	2	7	7	11	26	26	41	42	42	43	44	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	43	-	-	54	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	14	32	41	49	52	52	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	0	9	19	19	22	37	37	52	51	51	55	56	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	43	-	-	54	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	25	42	52	59	62	62	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	21	21	21	21	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	20	-	-	25	-	-	25	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	6	6	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Wskaźnik 40: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	10,22	13,02	14,77	16,61	21,27	21,53	21,73	22,51	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	13,92	-	-	17,4	-	-	17,4	-		
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	13,08	12,03	17,31	21,28	22,48	23,12	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

² Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

³ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

⁴ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta.

⁵ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

⁶ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z korekty wskaźnika.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	7	10	17	18	21	23	26	30	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	32	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	13	20	25	33	33	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	149,33	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	149	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	149,33	149,33	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3 003	4 ¹	15	16	70	70	84	93	113	134	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	203	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	580	101 ¹	131	182	182	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	148 600	185 997	185 997	185 997	185 997	185 997	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	148 600	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	-
- w tym na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	10 000	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-
Wskaźnik 5: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	R.10.1.3 R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	170	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	177	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	170	170	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		26		-		33		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0		28		28		
- szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	142	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		115		-		144		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		111		111		142		142		
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		32		-		40		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		40		40		40		40		

¹ Zmiana wartości wskaźnika wyniku z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta.

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 2 *Społeczeństwo informacyjne*

2.1		Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	4	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	149,33	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	119	-	-	-	-	149	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	149,33	149,33	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	148 600	185 997	185 997	185 997	185 997	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	148 600	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	-
- w tym na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	10 000	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-
Wskaźnik 4: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	R.10.1.3 R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	170	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	177	-	
		R.10.1.4	Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	170	170	-	-	-	-	-
- jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	33	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	28	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	142	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	144	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	142	142	-	-	-	-
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	40	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	-	-	-	-
2.2		Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	14	15	18	20	23	26	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	28	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	12	17	22	29	29	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	szt.	P.11.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	23	23	58	82	259	284	300	318	338	368	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-	-	-	399	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	149	175	295	334	413	413	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 7: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 003	4 ¹	15	16	70	70	84	93	113	134	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	203	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	580	101 ¹	131	182	182	-	-	-	-	-	-	

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

UWAGI OGÓLNE DOT. WSKAŹNIKÓW OSI PRIORYTETOWEJ 3:

1) Dla większości wskaźników produktu dane pochodzą z systemu KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM 07-13) ze względu na przyjęte przez IZ RPO szersze definicje wskaźników, np. wskaźnik Długość nowych dróg obejmuje zarówno długość wybudowanych dróg, obwodnic oraz mostów i wiaduktów. Wobec powyższego brak kodu przy tego typu wskaźnikach.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	1	12	24	40	48	71	84	90	97	102	105	112	117	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	13	-	-	-	81	-	101	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	38	-	85	-	99	-	106	-	118	-	126	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	15,47	18,35	22,31	22,91	23,58	23,58	28,79	30,36	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22	-	27	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,14	-	18,34	-	22,90	-	25,14	-	31,69	-	32,72	-	-	-
- regionalne (wojewódzkie),	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	10,25	10,25	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	10	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	6,50	-	6,50	-	6,50	-	11,40	-	11,46	-	-	-
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	15,80	16,40	17,07	17,07	18,54	20,11	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	17	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,14	-	11,84	-	16,40	-	18,64	-	20,29	-	21,26	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	7	23,34	43,79	67,67	70,55	124,5	135,64	152,40	165,91	182,2	192,82	214,12	223,14	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	18	-	-	-	150	-	188	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	75,27	-	143,6	-	171,93	-	192,69	-	223,47	-	230,68	-	-
- regionalne (wojewódzkie),	km		Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	64,52	76,43	78,19	93,86	101,2	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	-	63	-	79	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	19,24	-	51,41	-	66,28	-	78,18	-	101,2	-	101,65	-	-
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	96,99	101,39	105,77	114,63	120,26	121,94	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	12	-	-	-	87	-	109	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	56,03	-	92,19	-	105,65	-	114,51	-	122,27	-	129,03	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
			Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa	Szacowana realizacja	Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	38	38	40	43	-				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	1	-	3	-	12	-	33	-	38	-	38	-	38	-	40	-	51	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																									
Wskaźnik 6: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	7 101 270,00	8 144 611,82	9 248 851,86	10 829 547,48	10 955 032,49	20 483 056,65	14 839 511,70 ¹	16 813 064,10	17 434 968,34	18 410 678,23	18 737 768,69	20 174 927,11	20 955 438,59	-				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 846 599	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	7 101 270	-	13 636 710,00	-	11 427 532,49	-	14 868 873,13	-	18 320 243,32	-	18 755 273,57	-	24 123 122,50	-	25 977 437,76	-	-	-	-	
Wskaźnik 7: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	3 688	3 938	4 148	-					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	130	-	1 345	-	3 045	-	3 545	-	3 545	-	3 795	-	4 839	-	-	-	-	
Wskaźnik 8: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 266 018	1 266 018	-					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 533 000
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	-	-

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi priorytetowej 3 Transport

3.1		Infrastruktura drogowa																				
3.1.1		Drogi regionalne																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	17	20	23	26	28	29	32	34	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23	-	-	29	-	-	-	-	29	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	6	22	26	29	35	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	10,25	10,25	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-	-	10	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	6,50	6,50	6,50	11,40	11,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	64,52	76,43	78,19	93,86	101,2	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	-	63	-	-	79	-	-	-	-	79	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	7	15	19,24	51,41	66,28	78,18	101,2	101,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	7 101 270,00	7 101 270,00	7 101 270,00	7 355 618,92	7 353 475,33	10 005 559,60	3 826 162,62 ¹	4 716 276,36	4 975 801,38	5 558 172,86	5 830 282,22	7 200 051,94	7 442 877,24	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891 992,38	-	-	-	-	7 364 990,48	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	7 101 270	13 636 710,00	7 793 744,30	4 009 598,07	5 342 766,04	5 619 457,10	10 488 569,44	12 159 611,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2		Drogi lokalne																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	19	31	35	49	58	61	65	68	70	73	75	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	53	-	-	66	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	31	58	67	71	76	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	15,80	16,40	17,07	17,07	18,54	20,11	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	17	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5,14	11,84	16,40	18,64	20,29	21,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	96,99	101,39	105,77	114,63	120,26	121,94	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	87	-	-	-	-	109	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	56,03	92,19	105,65	114,51	122,27	129,03	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 043 341,82	2 147 581,86	3 473 928,56	3 601 557,16	10 477 497,05	11 013 349,08	12 096 787,74	12 459 166,96	12 852 505,37	12 907 486,47	12 974 875,17	13 512 561,35	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 785 286,82	-	-	-	-	13 481 608,52	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 633 788,19	10 859 275,06	12 977 477,28	13 135 816,47	13 634 553,06	13 817 826,71	-	-	-	-	-	-	
3.2 Transport publiczny																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6	6	7	8	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6	6	7	11	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 11: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	38	38	40	43	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	12	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	38	40	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 12: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	3 688	3 938	4 148	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	-	-	1 300	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 795	4 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 13: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 266 018	1 266 018	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	1 533 000	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	-		

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

UWAGI OGÓLNE DOT. WSKAŹNIKÓW OSI PRIORYTETOWEJ 4:

1) Wg metodologii IZ RPO wartości wskaźników nr 3 z Osi oraz nr 14 z Działania 4.3 są zliczane z projektów realizowanych w kategorii 39-43. Natomiast wskaźnik nr 4 z Osi oraz nr 13 z Działania 4.3 jest zliczany z projektów realizowanych w kategorii 39-42.

2) Wg metodologii IZ RPO wartości wskaźników nr 11 z Osi oraz nr 15 i 16 z Działania 4.3 są zliczane z projektów realizowanych w kategorii 40-42.

3) Wg metodologii IZ RPO wartość wskaźnika nr 3 z Działania 4.1 jest zliczana z projektów realizowanych w kategorii 46 oraz 54 (dla których wybrano wyłącznie wskaźniki z kategorii 46 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej).

4) Wg metodologii IZ RPO wartość wskaźnika nr 9 z Działania 4.1 jest zliczana z projektów realizowanych w kategorii 44 oraz 54 (dla których wybrano wyłącznie wskaźniki z kategorii 44 z zakresu gospodarki odpadami).

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	13	17	18	20	21	22	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	9							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	14	18	21	23	23									
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	6	7	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	2	-	3									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	5	6	7	7									
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	4	12	15	17	20	25	27	41	46	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	33	-	41									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	17	21	31	45	53									
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	14	15	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	13	-	16									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	9	15	15									
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2									
Wskaźnik 6: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	5	6	6	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	4	5	7	7	7									

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSJ (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Wskaźnik 8: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 295	10 295	10 295	136 005	136 005	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	24 800	-	-	-	31 000	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	136 005	136 005	136 005	136 005	136 005	136 005	136 005
Wskaźnik 9: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 068	46 068	46 068	46 068	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	48 713	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068
Wskaźnik 10: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	18 270	23 138	25 748	26 699	27 454	28 504	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	11 200	-	-	-	14 000	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 923	12 764	20 649	27 078	27 844	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800
Wskaźnik 11: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	2,24	0,91 ¹	1,09	2,3	2,82	5,88	6,2	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	4,25	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	1,19	2,73	2,73	6,16	6,16	6,49	6,49	-
Wskaźnik 12: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	5,05	5,05	9,9	9,9	10,1	10,1	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	9	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	5,05	6,07	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12

¹Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędów

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska*

4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	13	17	18	20	21	22	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	9			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	8	14	18	21	23	23						
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	6	7	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	3			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	7	7						
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	8,69	8,69	26,67	59,57	87,72	106,41	114,18	158,81	181,24	190,6	197,98	201,37	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	86	-	107					
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8,69	77,38	140,91	193,19	194,19	211,07	211,07						
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	21	-	26					
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,2	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70						
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	P.46.1.5 P.46.1.6	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2					
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3						
Wskaźnik 6: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	2					
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,08	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	0,15
Wskaźnik 8: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	18 270	23 138	25 748	26 699	27 454	28 504	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	11 200	-	-	-	14 000	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1 923	-	12 764	-	20 649	-	27 078	-	27 844	-	29 800	-	29 800	-
Wskaźnik 9: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 295	10 295	10 295	136 005	136 005	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	24 800	-	-	-	-	31 000	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	-	136 005	-	136 005	-	136 005	-
4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 11: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 068	46 068	46 068	46 068	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	-	48 713	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 068	-	46 068	-	46 068	-	48 713	-
Wskaźnik 12: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601,2	1 601,2	1 601,2	1 601,2	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	-	-	3 348,2	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 601,2	-	1 601,2	-	1 601,2	-	3 348,2	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
4.3				Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 13: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	14	15	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	16	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	15	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 14: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	12	15	17	20	25	27	41	46	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	41	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21	31	45	53	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	17	183,18	184	304	327	333	394	466	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	397	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	303	307	358	465	496	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 16: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	2,24	0,91 ¹	1,09	2,3	2,82	5,88	6,2	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	4,25	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	2,73	6,16	6,49	-	-	-	-	-	-
4.4				Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 17: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	5	6	6	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 18: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	5,05	5,05	9,9	9,9	10,1	10,1	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	9	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	-	-	-	-	-	-

¹Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	20	25	30	36	39	40	48	52	57	61	-	
			Wartość docelowa	-					2						35				44			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-					27		38		43		55		62		63			
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	7	17	41	69	89	100	104	111	119	126	133	137	-		
			Wartość docelowa	-				2						95				119				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-				83		103		114		131		141		142				
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	33	34	35	36	37	37	37	37	-	
			Wartość docelowa	-				5						30				37				
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-				12		28		36		38		38		37 ²		37		
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	65	66	67	68	69	69	69	69	-	
			Wartość docelowa	-				5							55				69			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		2		14		60		68		70		70		69 ²		69		
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	
			Wartość docelowa	-				3							14				18			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		2		14		18		18		18		18		18		18		
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	383	436	454	455	491	501	501	501	501	501	-	
			Wartość docelowa	-				2							402				502			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		80		257		402		467		503		503		503		503		
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	3	9	12	12	13	13	14	14	14	15	15	-		
			Wartość docelowa	-				1							13				16			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-				11		14		14		14		15		15		15		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	8	8	8	8	9	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	9	-	-	-	-	9	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	7	8	9	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	20 095	23 938	24 270	24 770	24 770	24 962	24 962	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 450	-	-	19 838	-	-	24 798	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938
Wskaźnik 9: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	4 082	4 315	12 879	11 279 ¹	12 178	36 425	36 995	40 323	40 867	40 811 ³	41 167	41 330	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	33 360	-	-	41 700	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	8 934	12 453	34 845	36 058	36 763	37 219	37 369	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 10: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	195 353	236 740	286 872	298 744	303 744	304 744	319 632	325 748	325 480 ³	331 919	331 919	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4 600	-	-	253 523	-	-	316 904	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	2 109	55 278	256 040	320 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	
Wskaźnik 11: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	338 091	347 482	347 381 ³	355 042	355 042	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	19 000	-	-	279 146	-	-	348 933	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	287 183	335 233	338 983	342 933	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu.

² Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

³ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika ze sprawozdań złożonych przez beneficjentów w rok po zakończeniu realizacji projektów i/lub błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność do KSI (SIMIK 07-13).

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

5.1		Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																			
5.1.1		Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej																			
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	11	11	12	15	17	17	24	28	31	33	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	17	-	21							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	16	20	30	33	33								
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	18	18	19	23	25	25	32	39	43	45	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	26	-	33								
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	19	24	28	42	45	45								
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	3	7	8	8	8	13	14	14	14	14	14	14	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	12	-	15								
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	12	14	14	14	14								
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	P.75.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	5	7	8	9	9	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	4	-	5								
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	4	8	8	9	9								
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	20 095	23 938	24 270	24 770	24 770	24 962	24 962	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 450	-	-	19 838	-	24 798							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938							
Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	6 511	6 511	6 511	23 396	23 396	23 467	23 574	23 574	23 671	23 671	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	20 753	-	25 941							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8 934	5 574	22 459	22 459	22 459	22 459	22 459							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
5.1.2				Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	14	18	21	22	23	24	24	26	28	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	18	-	-	23	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	15	22	23	25	29	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	23	51	70	77	79	86	87	87	90	92	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	69	-	-	86	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	64	79	86	89	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	12	12	13	13	14	16	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	10	-	-	12	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	12	12	13	16	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 10: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	6 368	4 768 ¹	5 667	13 029	13 599	16 856	17 293	17 237 ³	17 496	17 659	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12 607	-	-	15 759	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6 879	12 386	13 599	14 304	14 760	14 910	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2				Rozwój bazy medycznej w regionie																		
5.2.1				Stacjonarna opieka medyczna																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	13	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Wskaźnik 12: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	14	-	-	18	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		14		-		18		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		2		14		18		18		18		18		18		18		18
Wskaźnik 13: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		2		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		2		2		2		2		2		2
Wskaźnik 14: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	-
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		206		-		257		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		80		257		257		257		257		257		257		257		257
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 15: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	59 813	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	81 959	81 811	81 811	81 673	81 673	-
			Wartość docelowa	-		-		-		3 600		-		-		61 178		-		76 473		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		2 109		55 278		76 473		76 473		76 473		76 473		76 473		76 473		76 473
5.2.2	Ambulatoryjna opieka medyczna																					
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	4	11	16	20	21	22	23	24	24	24	24	24	-
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		20		-		24		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		15		23		25		25		24 ⁴		24		
Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	38	43	47	48	49	50	51	51	51	51	51	-
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		41		-		51		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		42		50		52		52		51 ⁴		51		
Wskaźnik 18: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	6	6	7	7	7	7	7	-
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		5		-		6		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		5		8		8		7 ⁴		7		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźnik 19: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	109	128	181	199	200	236	246	246	246	246	246	-
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	196	-	-	-	-	-	245	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	145	210	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 20: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	135 540	160 427	210 559	222 431	227 431	228 431	237 673	243 937	243 669 ³	250 246	250 246	-
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1 000	-	-	-	192 345	-	-	-	-	-	240 431	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	179 567	244 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431
5.3	Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																				
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 21: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	13	14	14	14	15	15	-
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	16	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
Wskaźnik 22: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	8	8	8	8	9	-
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	9	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	7	7	7	8	9	9	9	9	9	10
Wskaźnik 23: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.58.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	-
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	6	7	7	7	7	8	9	9	9	9	8 ⁴	8
Wskaźnik 24: Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.59.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	8	9	9	9	9	10	-
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	10	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 25: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	P.58.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	36	38	38	38	39	40	40	40	40	40	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	32	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	37	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Wskaźnik 26: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	9	10	10	10	10	11	10 ²	11	12	12	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	10	-	-	11	12	12	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	338 091	347 482	347 381 ³	355 042	355 042	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	279 146	-	-	348 933	-	-	348 933	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	287 183	335 233	338 983	342 933	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu.

² Spadek wartości wskaźnika wynika z błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność. W styczniu 2014 r. wartość została skorygowana i wynosi 11.

³ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika ze sprawozdań złożonych przez beneficjentów w rok po zakończeniu realizacji projektów i/lub błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność do KSI (SIMIK 07-13).

⁴ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	15	23	26	28	29	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	30	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	27	30	31	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	7	11	12	13	14	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14	15	15	15	15	15	15	15
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034	0,065	0,404	1,021	1,192	1,243	1,31	1,325	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,87	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,454	1,273	1,345	1,349	-	-	-	-	-	-
- miejskich	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	0,373	0,977	1,099	1,146	1,183	1,184	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	1,76	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,096	0,413	1,141	1,207	1,208	-	-	-	-	-	-
- zdegradowanych	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,029	0,031	0,044	0,093	0,097	0,127	0,141	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,11	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,138	0,141	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	24	25	29	56	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	35	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	36	54	57	-	-	-	-	-

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

6.1		Rewitalizacja obszarów miejskich																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	P.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	14	22	25	27	28	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	24	-	30									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	19	26	29	30										
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	15	23	26	28	29	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	24	-	30									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	9	20	27	30	31										
Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2									
Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	9	10	11	11	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	11	12	12								
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 5: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²	P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	0,373	0,977	1,099	1,146	1,183	1,184	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0,01	-	-	1,41	-	1,76									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,096	0,413	1,141	1,207	1,208								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015																						
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II																					
6.2																						Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																					
Wskaźniki produktu																																											
Wskaźnik 6: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-																						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1																														
Wskaźnik 7: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	-																						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3																														
Wskaźniki rezultatu																																											
Wskaźnik 8: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,029	0,031	0,044	0,093	0,097	0,127	0,141	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0,014	-	-	0,09	-	0,11																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,138	0,141																														
Wskaźnik 9: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	24	25	29	56	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28	-	35																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4	7	36	54	57																														

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym:	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	117,25	124,50	124,5	129,23	129,23	123,34	123,34	130,14	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	105	-	-	105 ¹	-	105	-	105	-	105	-	105	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	120,25	120,25	125,5	125,5	130,65	130,65	127	127	131,14	131,14	131,14	131,14	39,88 ³
- kobiety,	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	95,75	101,65	101,65	108,22	108,22	102,63	102,63	106,98	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	78	-	-	78 ¹	-	78	-	78	-	78	-	78	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	93,75	93,75	104,85	104,85	106,05	106,05	105,04	105,04	107,98	107,98	107,98	107,98	35,58 ³
- mężczyźni	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	21,5	22,85	22,85	21,01	21,01	20,71	20,71	23,16	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	27	-	-	27 ¹	-	27	-	27	-	27	-	27	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	26,5	26,5	23	23	24,60	24,60	21,96	21,96	23,16	23,16	23,16	23,16	4,3 ³
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szt.	P.85.1.3	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	99	110	110	119	119	119	119	122	122	122	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	232	-	-	232	-	232	-	232	-	232	-	232	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	85	85	91	91	112	112	119	119	119	119	122	122	122	122	122
Kat 86		Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	P.85.1.2	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	254	336	336	407	407	468	468	539	544	565	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	100	-	400	-	400	-	400	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	150	150	220	220	282	282	352	352	443	443	485	485	510	510	511
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szt.	P.86.1.1	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	26	40	33	39	37 ²	46	46	49	49	55	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	12	-	50	-	50	-	50	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	7	7	17	17	35	35	44	44	53	53	53	53	56	56	57

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	3 307	5 993	5 993	7 727	7 727	8 930	8 930	10 007	10 007	11 221	11 246	11 683	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	14 000								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	2 900	4 300	5 696	7 356	7 849	9 360	9 515	9 652									
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	57 397	94 006	94 006	106 292	106 292	110 126	110 126	112 226	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5 100	-	-	80 000	-	90 000								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	39 622	50 622	87 231	94 017	94 451	94 451									
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	754 416	871 768	871 768	942 885	942 885	1 019 030	1 023 892	1 078 883	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	36 000	-	-	900 000	-	1 025 000								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	317 147	457 147	564 499	585 616	637 623	641 683									

¹ Wykazana jednostka miary oraz wartości docelowe w 2013 r. zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*, natomiast w wyniku przeoczenia nie zostały zmienione w zapisach renegotjowanego programu. Chcąc zapewnić poprawność prezentowanych danych, przedstawiono je na podstawie zapisów *Uszczegółowienia*.

² Spadek wartości wskaźnika wynikał z błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność. Obecnie, w systemie widnieje prawidłowa wartość wskaźnika.

³ Niższa wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie odpowiada rzeczywistej liczbie osób zaangażowanych w realizację programu. Szczegółowe wyjaśnienia w sprawozdaniu w opisie Osi Priorytetowej 7.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2015 r.

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie						
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr. publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	103	1 362	3 015 190 903,26	2 493 265 166,58	1 400 842 128,80	27	789	1 793 678 047,89	1 476 688 310,17	842 379 949,83	750 707 616,44	99,49%
2 Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	0	68	219 902 868,12	211 680 250,49	180 073 998,31	0	33	142 245 138,52	139 040 930,84	118 109 340,21	118 109 340,21	100,55%
3 Oś priorytetowa - Transport	3	150	1 055 544 934,87	1 034 103 308,53	795 437 146,36	5	126	784 308 074,69	759 910 303,48	589 708 429,31	586 642 881,27	100,49%
4 Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	0	134	594 591 897,24	514 876 464,35	354 856 666,43	0	92	345 619 799,44	274 524 987,38	202 773 355,46	201 506 886,71	100,65%
5 Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	0	140	380 136 360,68	355 773 230,75	244 594 761,19	0	126	302 663 741,93	273 816 661,75	185 754 599,68	185 754 599,68	101,46%
6 Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	0	65	326 097 780,58	296 503 999,79	218 921 678,78	0	45	223 488 187,65	197 727 316,41	144 554 305,72	143 915 625,85	100,84%
7 Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	1	15	67 356 310,75	67 356 310,75	59 424 346,49	1	15	66 084 588,42	66 084 588,42	59 996 251,23	59 996 251,23	100,57%
OGÓŁEM:	107	1 934	5 658 821 055,50	4 973 558 731,24	3 254 150 726,36	33	1226	3 658 087 578,54	3 187 793 098,45	2 143 276 231,44	2 046 633 201,39	100,25%

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa
ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr. publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
13	14	15	16	17	18
1 802 976 764,23	1 418 171 177,18	806 821 116,84	718 148 591,02	95,17%	1
136 016 891,57	133 243 356,17	113 183 316,86	113 183 316,86	96,36%	2
744 890 523,35	720 162 502,11	575 862 565,52	573 241 162,40	98,20%	3
327 721 796,13	263 102 877,80	193 833 853,70	192 600 904,57	96,20%	4
294 891 816,40	266 052 203,43	180 196 654,19	180 196 654,19	98,43%	5
215 044 750,67	190 853 102,04	140 817 281,42	140 415 008,45	98,38%	6
63 261 127,98	63 031 493,57	57 130 026,82	57 130 026,82	95,76%	7
<u>3 584 803 670,33</u>	<u>3 054 616 712,30</u>	<u>2 067 844 815,35</u>	<u>1 974 915 664,31</u>	<u>96,74%</u>	OGÓŁEM:

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Oś priorytetowa		Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
		wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE (postawa certyfikacji)	kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE	
0		1	2	3
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	219 578 162,71		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	31 296 552,32		
3	Oś priorytetowa - Transport	168 768 277,88		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	61 283 268,89		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	63 786 201,79		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	45 434 847,35		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	15 152 703,78		
OGÓŁEM:		605 300 014,72	488 264 694,89	428 431 591,18

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik III

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7-8+10	8	9-8/7	10	11-10/7
1.1	Rozwój przedsiębiorczości	388	361	293 664 284,00	266 885 635,44	141 682 963,39	120 430 517,97	85,00%	21 252 445,42	15,00%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	217	214	498 502 269,26	469 782 286,65	250 998 762,76	214 165 092,61	85,33%	36 833 670,15	14,67%
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	124	123	417 147 409,36	403 701 655,29	200 028 902,18	171 546 468,11	85,76%	28 482 434,07	14,24%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Transport publiczny	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	4	4	17 041 067,90	16 582 999,81	8 219 660,87	6 986 711,74	85,00%	1 232 949,13	15,00%
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich	3	3	6 364 883,35	2 821 934,95	1 302 462,74	1 107 093,32	85,00%	195 369,42	15,00%
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	1	1	4 351 053,19	4 304 449,48	2 693 232,16	2 486 328,61	92,32%	206 903,55	7,68%
OGÓŁEM:		737	706	1 237 070 967,06	1 164 078 961,62	604 925 984,10	516 722 212,36	85,42%	88 203 771,74	14,58%

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik III

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis								Działanie
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa						
				kwota	%	mikro		małe		średnie		
						kwota	%	kwota	%	kwota	%	
12	13	14	15	16=18+20+22	17=16/7	18	19=18/16	20	21=20/16	22	23=22/16	
379	353	237 480 880,34	218 213 582,48	118 948 910,12	83,95%	110 070 038,58	92,54%	2 675 800,81	2,25%	6 203 070,73	5,21%	1.1
208	205	461 109 259,49	435 359 337,80	232 270 812,32	92,54%	64 110 670,93	27,60%	88 364 940,81	38,04%	79 795 200,58	34,35%	1.3
111	111	305 327 056,36	298 084 237,20	149 913 367,10	74,95%	95 938 084,23	64,00%	44 458 905,85	29,66%	9 516 377,02	6,35%	1.4
0		0,00		0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	2.1
0		0,00		0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	3.2
0		0,00		0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	4.1
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	4.3
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	6.1
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	6.2
698	669	1 003 917 196,19	951 657 157,48	501 133 089,54	82,84%	270 118 793,74	53,90%	135 499 647,47	27,04%	95 514 648,33	19,06%	
