

*Załącznik
do Uchwały nr 3754/2009
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 sierpnia 2009 r.*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

I. Informacje wstępne

| | |
|---|--|
| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: KONWERGENCJA |
| | Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2) |
| | Okres programowania: 2007-2013 |
| | Numer programu (CCI): 2007PL161PO012 |
| | Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 |
| SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Numer sprawozdania: I/2009/RPO/16 |
| | Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 – 30.06.2009 |

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|-----------|
| I. Informacje wstępne..... | 1 |
| <i>Spis tabel.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Spis wykresów i map.....</i> | <i>4</i> |
| II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem | 5 |
| 1. <i>Realizacja i analiza postępów.....</i> | <i>5</i> |
| 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego | 5 |
| 1.2 Informacje finansowe | 5 |
| 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej | 5 |
| 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego..... | 6 |
| 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu | 6 |
| 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów | 6 |
| 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii | 7 |
| 1.8 Analiza jakościowa..... | 10 |
| 2. <i>Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi</i> | <i>33</i> |
| 3. <i>Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....</i> | <i>36</i> |
| 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu..... | 36 |
| 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)..... | 37 |
| 3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach | 38 |
| 3.4 Raporty o nieprawidłowościach | 41 |
| 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania | 41 |
| 4. <i>Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</i> | <i>42</i> |
| 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych . | 42 |
| 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej | 42 |
| 5. <i>Informacja o realizacji dużych projektów.....</i> | <i>44</i> |
| 6. <i>Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....</i> | <i>44</i> |
| 7. <i>Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....</i> | <i>47</i> |
| 8. <i>Oświadczenie Instytucji Zarządzającej.....</i> | <i>48</i> |

Spis tabel

Tabela 1. Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013 (Załącznik nr I).

Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie/roczne plany działań oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych (Załącznik nr III).

Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych (Załącznik nr III).

Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco (Załącznik nr II).

Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w PLN).

Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu (Załącznik nr III).

Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu (Załącznik nr III).

Tabela 4a. Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu.

Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu (Załącznik nr III).

Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (Załącznik nr III).

Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (Załącznik nr III).

Tabela 8. Przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym w I półroczu 2009 r.

Tabela 9. Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 złożonych w I półroczu 2009 r.

Tabela 10. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 1* w II półroczu 2009 r.

Tabela 11. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 2* w II półroczu 2009 r.

Tabela 12. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 3* w II półroczu 2009 r.

Tabela 13. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 4* w II półroczu 2009 r.

Tabela 14. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 5* w II półroczu 2009 r.

Tabela 15. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 6* w II półroczu 2009 r.

Tabela 16. Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013

Tabela 17. Planowane nabory wniosków w ramach procedury indywidualnych projektów kluczowych w II półroczu 2009 r.

Tabela 18. Aktualizacja *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*.

Tabela 19. Aktualizacja *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

Tabela 20. Zestawienie *Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej*.

Tabela 21. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym).

Tabela 22. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie).

Spis wykresów i map

Wykres 1. Wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w podziale na kategorie interwencji.

Wykres 2. Procentowy udział środków z EFRR w ramach podpisanych umów w podziale na obszary realizacji projektów.

Wykres 3. Wzrost ilości wniosków złożonych, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (31.12.2008-30.06.2009).

Wykres 4. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków złożonych, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (31.12.2008-30.06.2009).

Wykres 5. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR.

Wykres 6. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (31.12.2008 – 30.06.2009).

Wykres 7. Wzrost poziomu realizacji celów Strategii Lizbońskiej (31.12.2008 – 30.06.2009).

Wykres 8. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 1* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

Wykres 9. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 3* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

Wykres 10. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 4* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 5* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

Wykres 12. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 6* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

Wykres 13. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 7* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

Mapa 1. Zestawienie wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2009 r.

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Informacje nt. wskaźników produktu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 zostały umieszczone w Tabeli 1. *Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013* (Załącznik nr I).

W związku z tym, iż część projektów w ramach *Osi 1, Osi 3, Osi 5* oraz *Osi 7* została w okresie sprawozdawczym zakończona, widoczny jest postęp w realizacji niektórych wskaźników produktu. W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI (SIMIK 07-13)). Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w sprawozdaniach okresowych należy wykazywać wartości wskaźników z wniosków o płatność wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13) do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego. Mają to być wskaźniki wyłącznie z projektów zakończonych, tzn. takich, dla których zatwierdzono wnioszek beneficjenta o płatność końcową.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) dla wskaźników „*Liczba projektów...*” zastosowała odrębną metodologię polegającą na tym, iż wartości zostały obliczone na podstawie ilości podpisanych umów zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 30 czerwca 2009 r. Dla pozostałych wskaźników podano wartości na podstawie wniosków o płatność końcową.

Szczegółowe informacje nt. postępu fizycznego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w Tabeli 2. *Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco* (Załącznik nr II).

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Z zaplanowanych w poprzednim sprawozdaniu okresowym prognoz na I i II kwartał 2009 r., poniesiono wydatki w ramach 1, 3, 5 oraz 7 *Osi priorytetowej*. W I półroczu 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 na rzecz beneficjentów wypłaciła 51 053 918,93 PLN, co stanowi 73,83% prognozy ujętej w poprzednim sprawozdaniu, tj:

- 7 189 348,42 PLN, w ramach *Osi priorytetowej 1*, co stanowi 37,30% płatności zaplanowanych w poprzednim sprawozdaniu okresowym,
- 36 137 968,03 PLN, w ramach *Osi priorytetowej 3*, co stanowi 193,46% płatności zaplanowanych w poprzednim sprawozdaniu okresowym,
- 4 520 693,28 PLN, w ramach *Osi priorytetowej 5*, co stanowi 24,60% płatności zaplanowanych w poprzednim sprawozdaniu okresowym,
- 3 205 909,20 PLN, w ramach *Osi priorytetowej 7*, co stanowi 47,36% płatności zaplanowanych w poprzednim sprawozdaniu okresowym.

W w/w kwotach ujęto wnioski o refundację oraz rozliczające zaliczki, które jednocześnie zostały zarejestrowane w systemie KSI (SIMIK 07-13) oraz wypłacone w okresie sprawozdawczym.

W ramach Osi 1 nie zostały ujęte wnioski o płatność na kwotę 1 508 970,97 PLN, które zostały wypłacone w grudniu 2008, a zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) w styczniu 2009 r.

Ponadto dwa wnioski o płatność na kwotę 576 190,68 PLN zostały wypłacone w czerwcu 2009 r., ale data wypłaty została wprowadzona w KSI (SIMIK 07-13) w lipcu 2009 r.

Rzeczywiste wykonanie prognozy w Osi 1 wynosi 7 765 539,10 PLN, co stanowi 40,29% planowanych płatności.

W ramach Osi 5 nie wykazano wniosków o płatność na kwotę 1 083 336,54 PLN, które zostały wypłacone w grudniu 2008 r., a zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) w styczniu i lutym 2009 r.

Ponadto jeden wniosek o płatność na kwotę 1 263 687,37 PLN został wypłacony w czerwcu 2009 r., natomiast data wypłaty do KSI (SIMIK 07-13) została wprowadzona w sierpniu 2009 r.

Rzeczywiste wykonanie prognozy w ramach Osi 5 wynosi 5 784 380,65 PLN, co stanowi 31,48% planowanych płatności.

W ramach Osi 7 nie wykazano wniosku o płatność na kwotę 120 188,65 PLN, który został wypłacony w grudniu 2008 r., natomiast zarejestrowany w KSI (SIMIK 07-13) w styczniu 2009 r.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Prognozy na cztery kolejne kwartały obejmują wartości wynikające z umów podpisanych w 2008 r. i 2009 r. (*załączników nr 6 do Umowy o dofinansowaniu projektu – Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność na następny rok*), co pozwala na bardziej realne określenie poziomu wydatków. Jedynie dla umów, które zostaną podpisane w II półroczu 2009 r. oraz w I półroczu 2010 r. dokonuje się oszacowania poziomu ich wydatków na cztery kolejne kwartały. Zgodnie z zapisami *Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013* przyjęte przez IZ RPO WO 2007-2013 procedury dotyczące wdrażania projektów, mają na celu zapewnienie sprawnej realizacji działań/poddziałań RPO WO 2007-2013, w tym realizację założonych płatności na rzecz beneficjentów.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej przekazanej IZ RPO WO 2007-2013 od początku realizacji programu wynosi 225 342,90 PLN, a w okresie sprawozdawczym 144 282,04 PLN.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas V posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, które miało miejsce dnia 8 lipca 2009 r., województwo opolskie wg stanu na koniec maja 2009 r. zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem przekazanych beneficjentom zaliczek (w ramach regionalnych programów operacyjnych). Do końca czerwca 2009 r. o zaliczki w ramach RPO WO 2007-2013 ubiegały się jednostki samorządu terytorialnego i zespoły opieki zdrowotnej. Z zaliczek skorzystali beneficjenci realizujący projekty m.in. w zakresie budowy dróg regionalnych, zakupu taboru kolejowego oraz zakupu sprzętu medycznego.

Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w PLN).

| Oś Priorytetowa | Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów | | Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje | |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | W okresie sprawozdawczym | Od początku uruchomienia programu | W okresie sprawozdawczym | Od początku uruchomienia programu |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Oś Priorytetowa 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś Priorytetowa 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś Priorytetowa 3 | 16 657 124,89 | 39 680 348,95 | 34 440 017,58 | 34 440 017,58 |
| Oś Priorytetowa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś Priorytetowa 5 | 3 468 684,12 | 3 468 684,12 | 1 305 249,76 | 1 305 249,76 |
| Oś Priorytetowa 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oś Priorytetowa 7 | 5 068 831,35 | 8 606 863,08 | 3 205 909,20 | 4 618 252,48 |
| OGÓŁEM | 25 194 640,36 | 51 755 896,15 | 38 951 176,54 | 40 363 519,82 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

UWAGI:

1. W ramach *Osi priorytetowej 3* wykazana została zaliczka na kwotę 10 095 365,80 PLN wprowadzona do KSI (SIMIK 07-13) i wypłacona w miesiącu lutym 2009 r., a następnie rozliczona w miesiącu kwietniu 2009 r. Natomiast data wypłaty środków została wprowadzona do KSI (SIMIK 07-13) w miesiącu lipcu 2009 r.

2. W ramach *Osi priorytetowej 7* w kolumnie 5 ujęty został wniosek o płatność o nr RPOP.07.01.00-16-001/08-02 rozliczający zaliczkę, dla którego omyłkowo wprowadzono w KSI (SIMIK 07-13) datę wypłaty środków (data została usunięta z KSI w miesiącu sierpniu); a także ta część środków z wniosku o nr RPOP.07.01.00-16-002/08-03, która stanowi rozliczenie zaliczki w kwocie 513 745,54 PLN natomiast pozostała kwota w wysokości 184 791,59 PLN (dot. dofinansowania z UE) jest refundacją.

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

W Tabeli 7 Załącznika nr III zaprezentowano wartości zawartych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, dla każdej możliwej w ramach RPO WO 2007-2013 kombinacji kodów.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. podpisano umowy w ramach następujących kategorii interwencji¹:

- 04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B + RT, w szczególności w MŚP;
- 05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw;
- 07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji;
- 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;
- 18 – Tabor kolejowy;
- 23 – Drogi regionalne/lokalne;
- 24 – Ścieżki rowerowe;
- 44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
- 46 – Oczyszczanie ścieków;


¹ Umowy w ramach kategorii interwencji 05 oraz 44 zostały omyłkowo wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13). W rzeczywistości umowy realizowane są w ramach innych kategorii interwencji (odpowiednio 08 i 46). Błędy zostaną skorygowane w kolejnym sprawozdaniu.

- 50 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów;
- 53 – Zapobieganie zagrożeniom;
- 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienie usług turystycznych;
- 58 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
- 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej;
- 75 – Infrastruktura systemu oświaty;
- 76 – Infrastruktura ochrony zdrowia;
- 85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola.

Najwięcej umów podpisano w ramach kategorii: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa (79 umów), 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedzina badań i innowacji (27 umów) oraz kategorii 23 Drogi regionalne/lokalne (21 umów o dofinansowanie).

Najwyższe kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zakontraktowane są w kategoriach: 23 – Drogi regionalne/lokalne (ponad 108 mln PLN), 46 – Oczyszczanie ścieków (blisko 70 mln PLN), 75 – Infrastruktura systemu oświaty (ponad 52 mln PLN). Podział środków pomiędzy poszczególne kategorie interwencji przedstawia poniższy Wykres 1.

Wykres 1. Wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w podziale na kategorie interwencji.

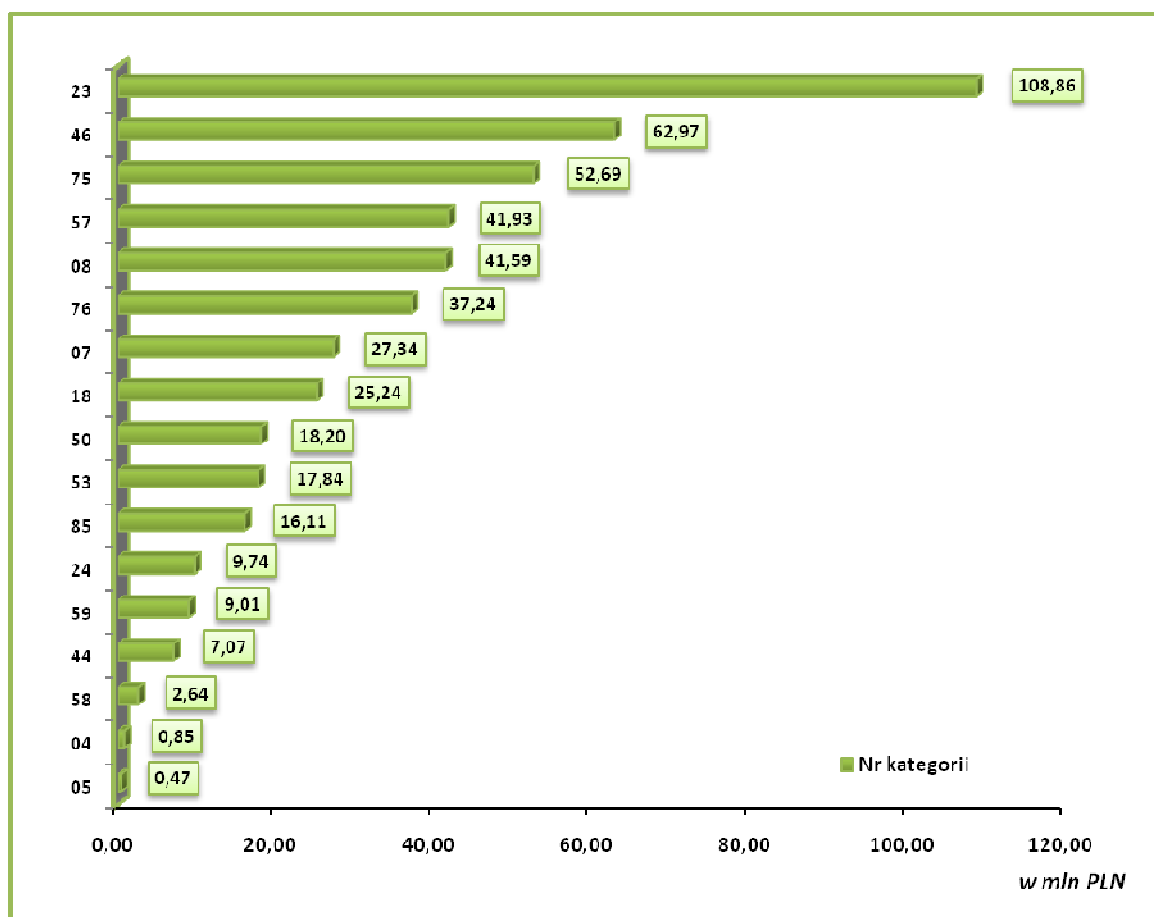


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Natomiast w zakresie działów gospodarki najwięcej środków unijnych przeznaczono na: transport (22 umowy o dofinansowanie na kwotę 134 mln PLN), opiekę społeczną, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne (12 umów o dofinansowanie na kwotę 70 mln PLN), edukację (11 umów o dofinansowanie na kwotę 53 mln PLN) oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia (17 umów o dofinansowanie na kwotę 39 mln PLN).

Analizując projekty ze względu na obszar realizacji, widać wyraźnie że dotychczas najwięcej środków (ponad 60%) zakontraktowano na rzecz obszarów miejskich (Wykres 2). Na terenach miejskich do końca czerwca 2009 r. dofinansowanie z EFRR otrzymało 112 beneficjentów na kwotę ponad 291 mln PLN. Na obszarach wiejskich realizowanych jest 71 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 171 mln PLN.

Wykres 2. Procentowy udział środków z EFRR w ramach podpisanych umów w podziale na obszary realizacji projektów.

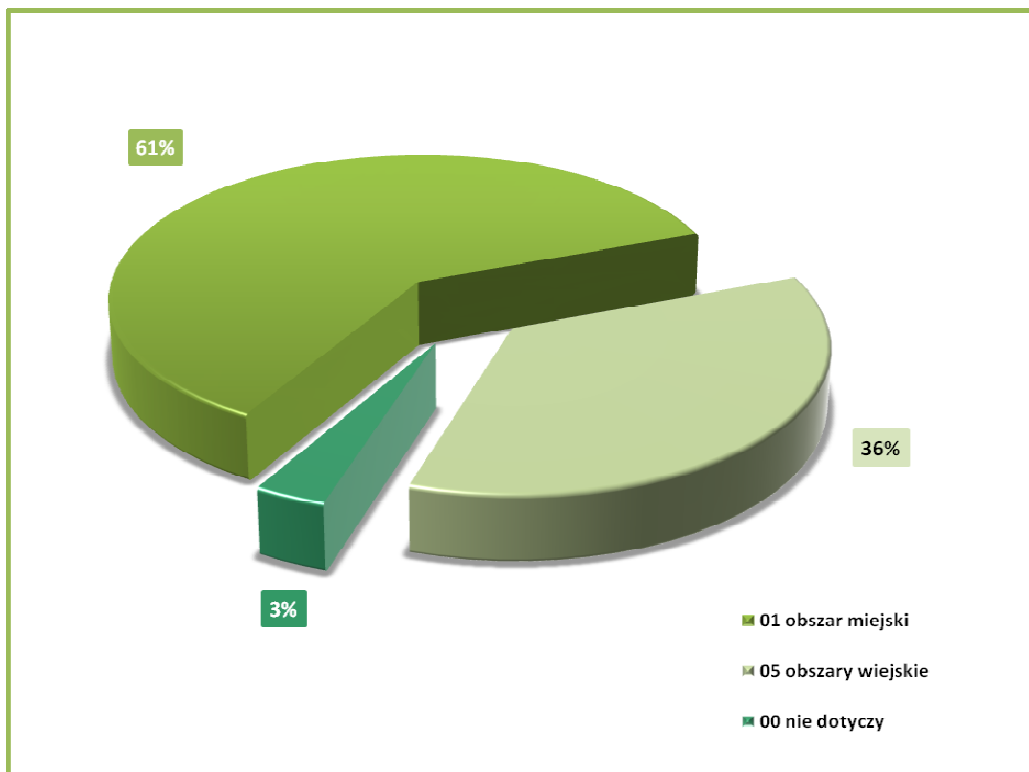

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Na terenach miejskich dofinansowanie otrzymali przedsiębiorcy, których projekty przyczynią się do wzmocnienia gospodarki regionu, tym samym do realizacji pierwszego celu w ramach Programu. W ramach Osi 1 do końca okresu sprawozdawczego wsparcie na obszarach miejskich uzyskały 64 przedsiębiorstwa (po 22 projekty z poddziałań 1.1.2 i 1.4.1 oraz 20 projektów z poddziałania 1.3.2). Jednostki samorządu terytorialnego unijne środki inwestują w rozwój turystyki i sportu, przebudowę dróg, poprawę warunków kształcenia oraz zakup sprzętu medycznego. Na terenach miejskich szkoły wyższe dofinansowanie unijne przeznaczyły na budowę, przebudowę bazy dydaktycznej oraz budowę studenckiego centrum kultury.

W ramach wsparcia dla obszarów wiejskich realizowane są przede wszystkim działania skierowane na rozwój przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym najwięcej projektów na obszarach wiejskich realizują przedsiębiorcy w ramach poddziałań 1.1.2 oraz 1.4.1 (po 18 projektów) a także 1.3.2 (8 projektów). Drugą grupę beneficjentów z obszarów wiejskich stanowią jednostki samorządu terytorialnego, które na terenach wiejskich realizują inwestycje w infrastrukturę techniczną, są to projekty z zakresu przebudowy dróg, zakupu taboru kolejowego oraz budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Na terenach wiejskich powstanie także zbiornik retencyjny na rzece Stobrawie.

1.8 Analiza jakościowa

W ramach *Analizy jakościowej* opisano następujące kwestie:

- I. Nabory wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2009 r.
- II. Informacje ogólne nt. wdrażania RPO WO 2007-2013
- III. Postęp realizacji Strategii Lizbońskiej
- IV. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych
- V. Opis postępów w realizacji Indywidualnych projektów kluczowych
- VI. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013

I. Nabory wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2009 r.

W I półroczu 2009 roku, zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*², zostało przeprowadzonych 5 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze konkursowej oraz złożono pełną dokumentację projektową dla 2 indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013*. W ramach procedury konkursowej 2 nabory przeprowadziła Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

Ponadto, w ramach *Osi priorytetowej 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* Instytucja Zarządzająca przeprowadziła konkurs Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Analizując przebieg procesu ubiegania się o wsparcie IZ RPO WO 2007-2013 stwierdza, iż największym zainteresowaniem ze strony beneficjentów wśród naborów przeprowadzonych w procedurze konkursowej cieszył się nabór wniosków przeprowadzony w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*. Wnioskowana kwota dofinansowania blisko 3-krotnie przekroczyła dostępną alokację na dzień zakończenia składania projektów.

Odmienne sytuacja kształtowała się w wypadku drugiego naboru w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* oraz 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*. W obu przypadkach wnioskowana kwota dofinansowania nie wyczerpała przeznaczonych na nabory alokacji.

Informacje nt. przeprowadzonych naborów przedstawiono w *Tabeli 8 i 9*.

Tabela 8. Przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym w I półroczu 2009 r.

| Lp. | Nr i nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach | 20 kwietnia – 4 maja |
| 2. | | 23 czerwca – 8 lipca |
| 3. | 3.1.1 Drogi regionalne | 23 lutego – 9 marca |
| 4. | 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna | 27 kwietnia – 11 maja |
| 5. | 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | 2 – 16 lutego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*.

² Dokument oraz jego zmiany każdorazowo akceptowane są przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Tabela 9. Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 złożonych w I półroczu 2009 r.


| Lp. | Nr i nazwa działania /poddziałania | Tytuł indywidualnego projektu kluczowego | Termin złożenia pełnej dokumentacji projektowej | Etap realizacji |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
| 1. | 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny | Utworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich” | 2 – 13 marca | Zaakceptowano do realizacji |
| 2. | 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie. | 5 – 20 stycznia | Podpisano umowę |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

II. Informacje ogólne nt. wdrażania RPO WO 2007-2013


Na zakończenie okresu sprawozdawczego w ramach RPO WO 2007-2013 złożono 553 wnioski poprawne pod względem formalnym o wartości dofinansowania z EFRR ponad 907 mln PLN. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji 410 projektów (dofinansowanie z EFRR około 730 mln PLN). Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz Instytucja Zarządzająca podpisały łącznie 187 umów na realizację projektów, których wartość dofinansowania z EFRR wynosi ponad 479 mln PLN. Najwyższy % poziom zakontraktowania podpisanych umów jest w ramach Osi 5 (ponad 52%), natomiast pod względem płatności najwięcej % środków wypłacono w ramach Osi 7 – ponad 10%. Postęp realizacji Programu w cyklu miesięcznym przedstawiono na poniższych Wykresach 3 i 4.

Wykres 3. Wzrost ilości wniosków złożonych, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (31.12.2008 – 30.06.2009).

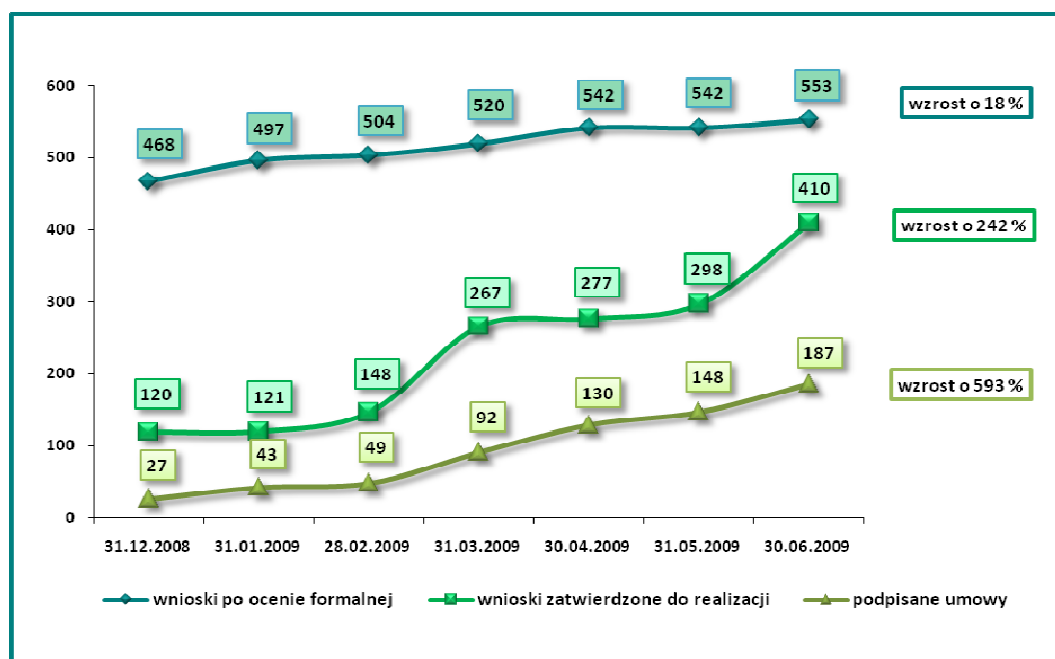

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 4. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków złożonych, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (31.12.2008 – 30.06.2009).

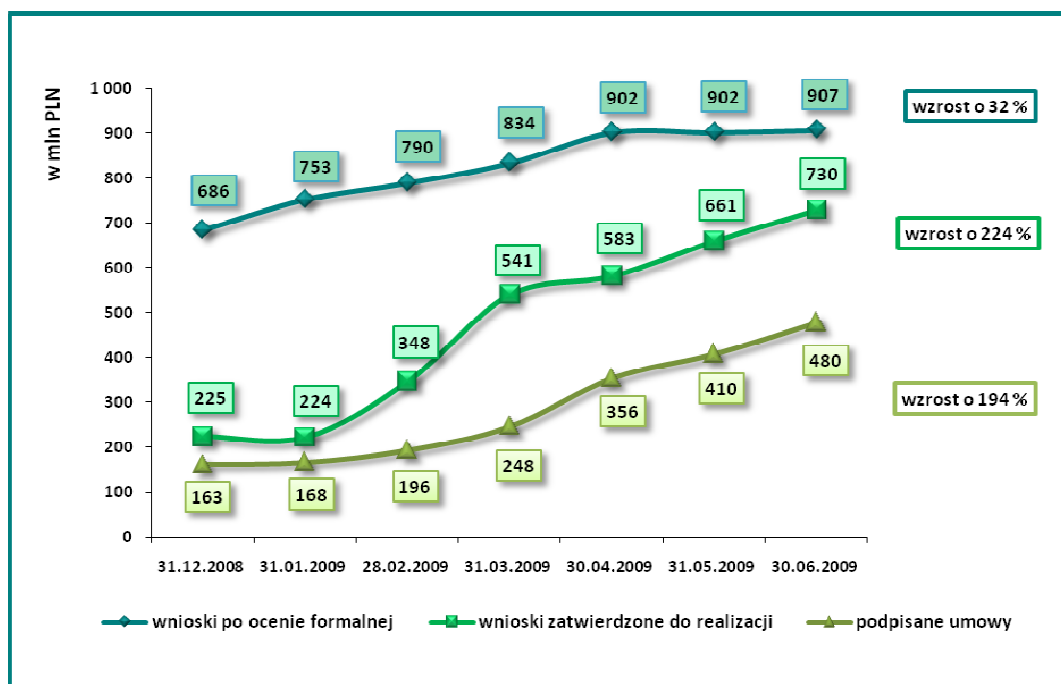

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


Pod względem typów beneficjentów największe środki pozyskały samorządy gminne, samorząd województwa, przedsiębiorcy oraz samorządy powiatowe (Wykres 5).

Największa grupa beneficjentów, jaką stanowią samorządy gminne otrzymała dofinansowanie na realizację projektów m.in. z zakresu turystyki, sportu i rekreacji (budowa, przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych), inwestycji drogowych (budowa, przebudowa dróg gminnych) oraz inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa oczyszczalni ścieków).

Samorządy powiatowe realizują projekty z zakresu przebudowy dróg powiatowych, przebudowy baz dydaktycznych regionalnych placówek oświatowych, zakupu sprzętu medycznego dla szpitali.

Województwo opolskie środki unijne przeznaczyło na przebudowę dróg wojewódzkich, zakup taboru kolejowego, budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę placówek ochrony zdrowia, a także przebudowę bazy dydaktycznej wojewódzkich jednostek oświatowych.

Wykres 5. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR.

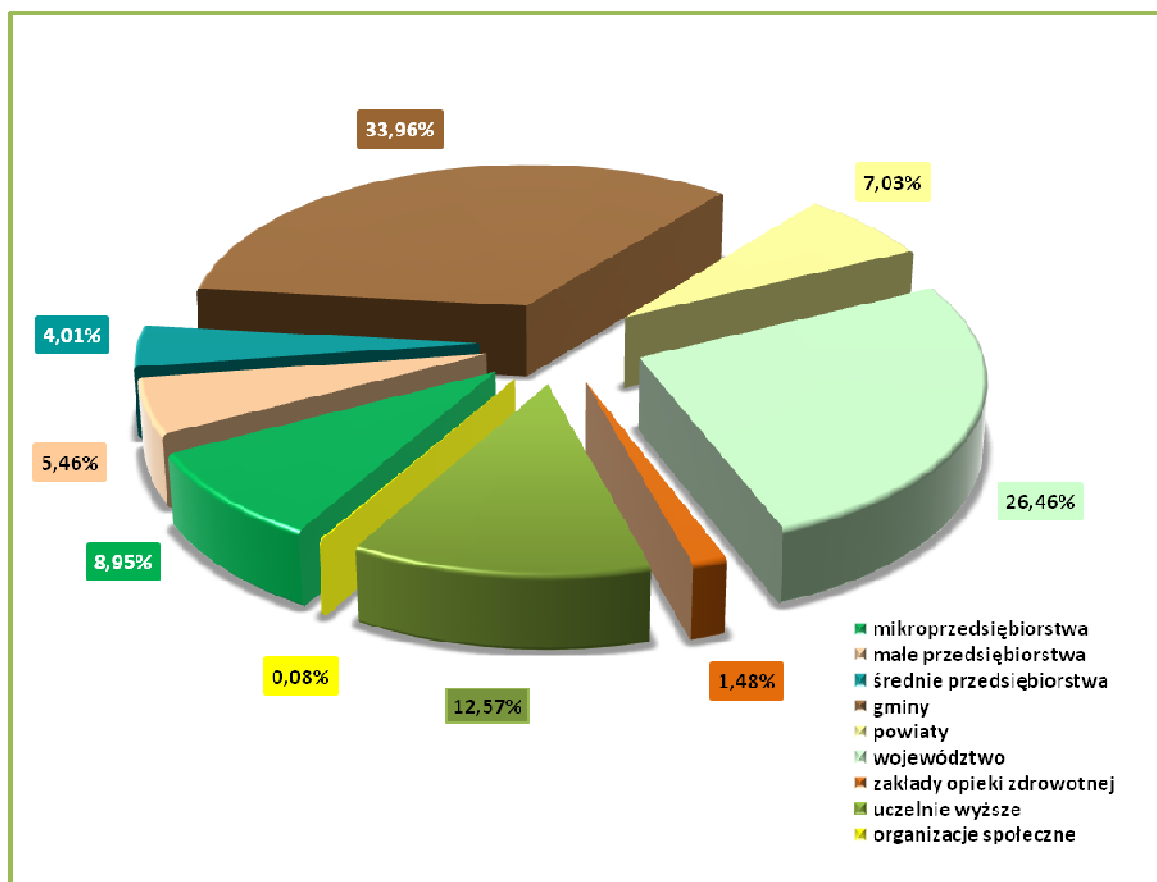


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Najwięcej umów podpisano z beneficjentami z Miasta Opola (42) oraz gmin: Kędzierzyn-Koźle (15), Krapkowic (9), Kluczborka (8), Nysy i Brzegu (po 7), Namysłowa i Strzelec Opolskich (po 6).


Najwięcej środków w ramach RPO WO 2007-2013 pozyskali dotąd beneficjenci z następujących gmin: Opola (niemal 240 mln PLN), Brzegu (18,3 mln PLN), Głubczyc (17,8 mln PLN), Ujazdu (14,7 mln PLN), Kluczborka (12,2 mln PLN), Kędzierzyna-Koźla (12 mln PLN), Olesna (11,6 mln PLN), Namysłowa i Nysy (po 11,1 mln PLN). Dane przedstawia *Mapa 1*.

Mapa nr 1. Zestawienie wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2009 r.

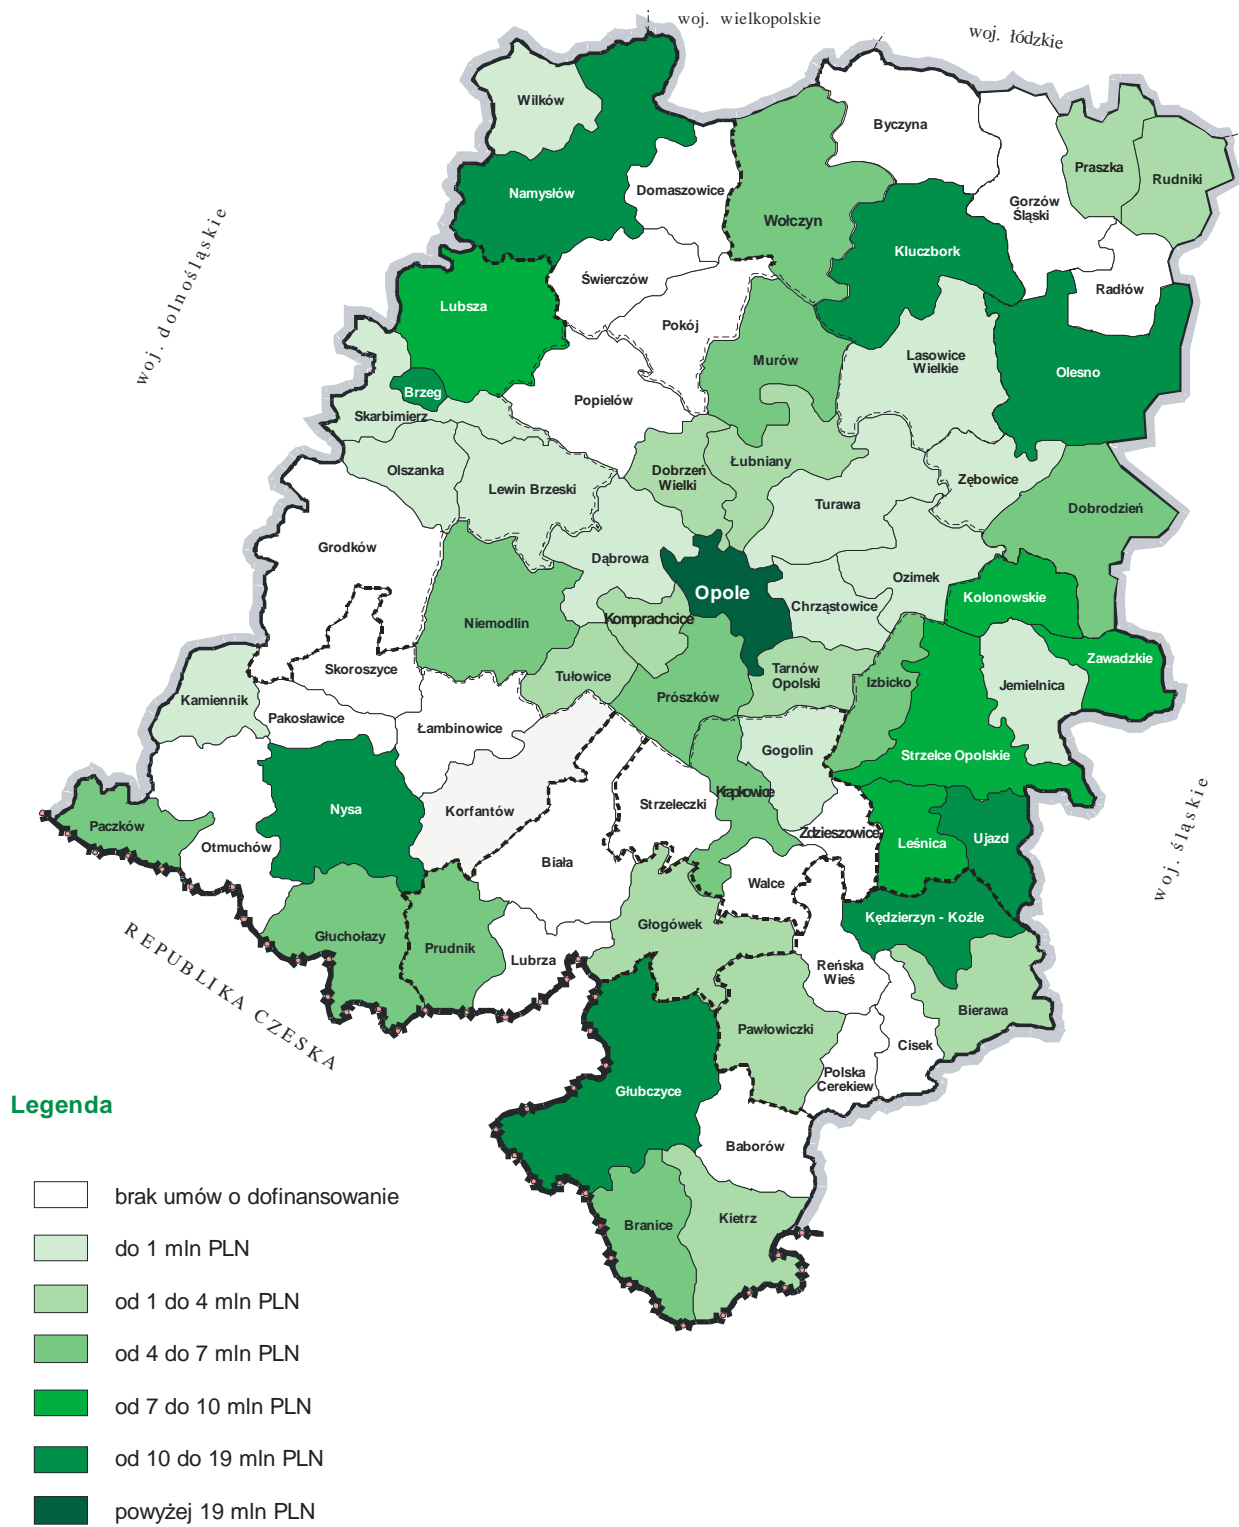

Beneficjenci złożyli wnioski potwierdzające poniesienie wydatków na kwotę blisko 63 mln PLN. Natomiast do Instytucji Certyfikującej przekazano deklaracje o wartości ponad 47 mln PLN (Wykres 6).

Wykres 6. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (31.12.2008 – 30.06.2009).

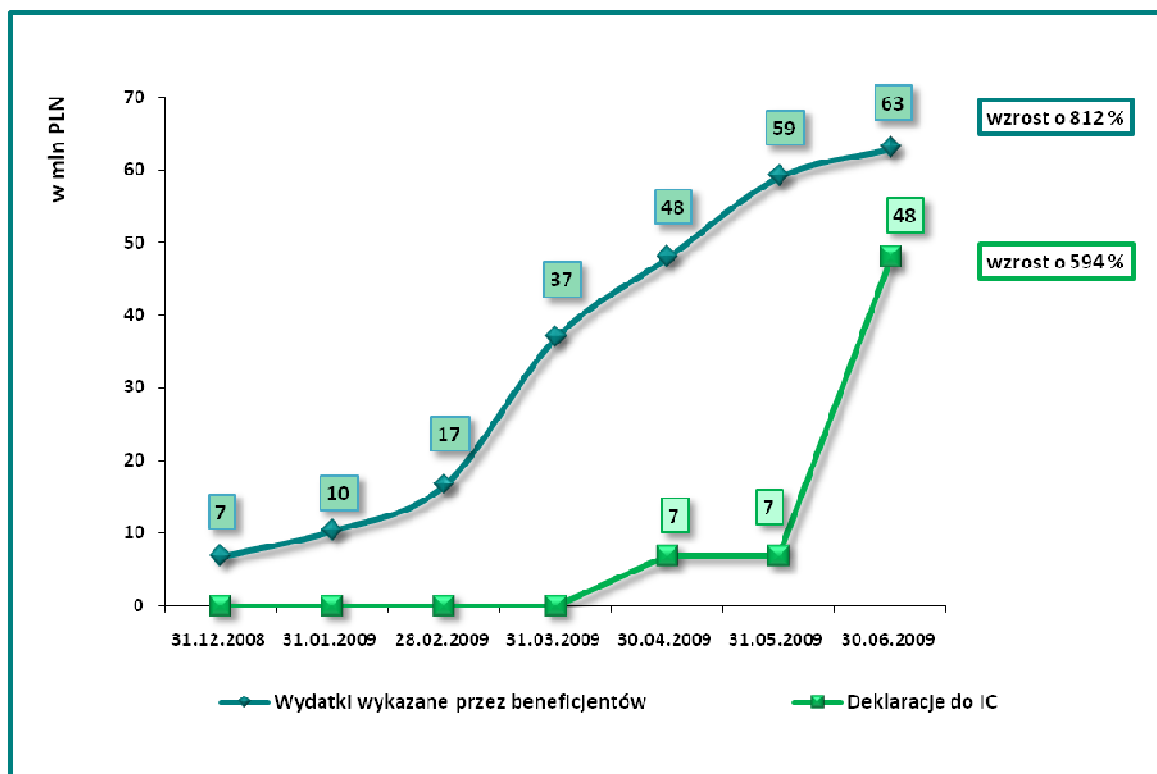

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 34 projektów. 23 dotyczyło bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (w tym 3 projekty dotyczyły zakresu turystyki, rekreacji i sportu); 1 z zakresu transportu; 8 projektów z zakresu ochrony zdrowia; 2 projekty w ramach pomocy technicznej.

W ich wyniku znaczne wsparcie inwestycyjne otrzymali przedsiębiorcy, utworzono pierwsze miejsca pracy, przebudowano fragmenty dróg w województwie, doposażone zostały placówki medyczne, a także przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013 oraz szerokiego grona beneficjentów.

Szczegółowe dane nt. postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych zostały opisane poniżej, w punkcie IV. Postęp w realizacji poszczególnych Priorytetów.

III. Postęp realizacji Strategii Lizbońskiej

W ramach RPO WO 2007-2013 43% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej (co stanowi ponad 184 mln Euro).

Do końca czerwca 2009 r. cele Strategii Lizbońskiej realizowane były w ramach *Osi Priorytetowej 1* w poddziałaniach:


- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach,*
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach,*

- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.*

Wszystkie umowy w obszarze *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość* (kategorie 04, 05, 07 i 08) realizują założenia Strategii Lizbońskiej, co wpływa na wzrost konkurencyjności i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wysoką jakość prac B+R. Do końca czerwca 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeznaczyła ponad 70 mln PLN na cele związane z realizacją Strategii Lizbońskiej. Wzrost poziomu realizacji celów Strategii Lizbońskiej w okresie od grudnia 2008 r. do końca czerwca 2009 r. przedstawia poniższy Wykres 7.

W stosunku do 31 grudnia 2008 r. % realizacji Strategii Lizbońskiej wzrósł o około 3,4%.

Wykres 7. Wzrost poziomu realizacji celów Strategii Lizbońskiej (31.12.2008 – 30.06.2009).

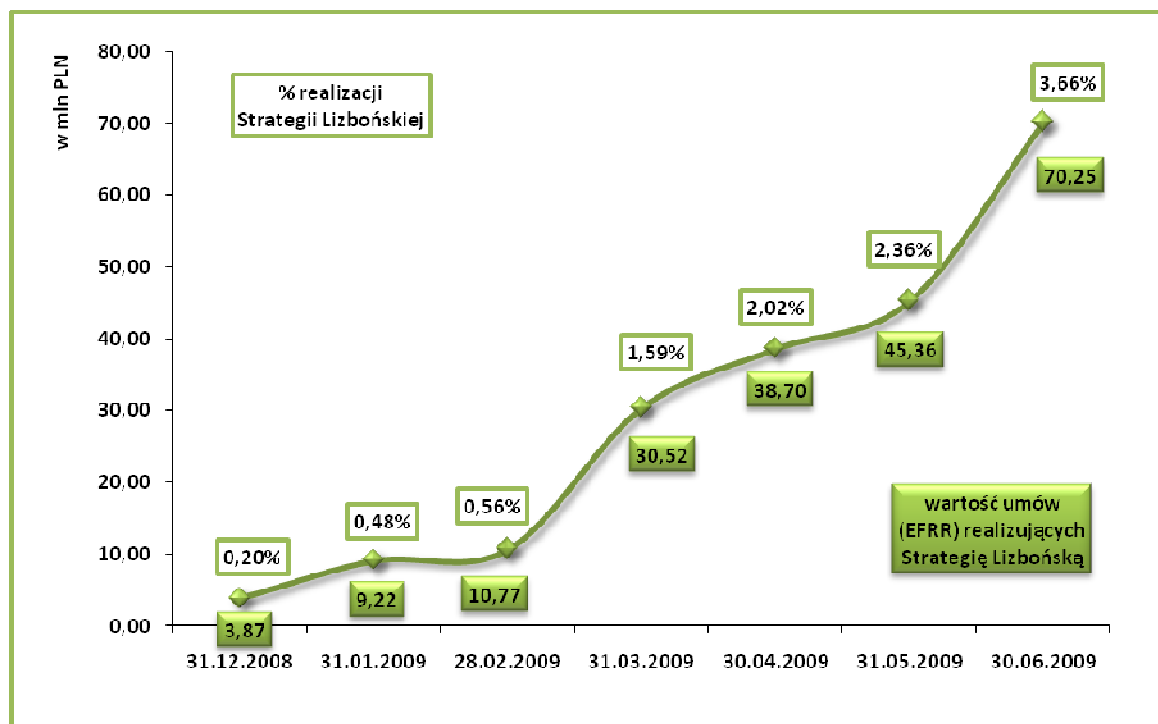

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

IV. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych

⇒ OŚ PRIORYTETOWA 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*

Nabory ogłoszone w ramach procedury konkursowej

W terminie od 20 kwietnia do 4 maja 2009 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*. Alokacja środków przeznaczona na ten nabór wyniosła ponad 16,8 mln Euro, tj. około 79,5 mln PLN³.

W odpowiedzi na konkurs złożono 151 wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości przekraczającej 95 mln PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wyniosła ponad 33 mln PLN. Wartość złożonych wniosków nie wyczerpała przewidzianej na ten nabór alokacji. W okresie sprawozdawczym nie zakończył się proces oceny formalnej wniosków.

³ wg kursu 1 Euro = 4,7260 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia, tj. 30 marca 2009 r.

Kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, miał miejsce od 23 czerwca do 8 lipca 2009 r. Nabór dotyczył jedynie zakupu oraz unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu. Kwota alokacji na nabór wyniosła ponad 13 mln Euro, tj. ponad 58,8 mln PLN⁴.

Projekty zaakceptowane do realizacji

W I półroczu 2009 r. wybrano do dofinansowania dodatkowe projekty w ramach naborów przeprowadzonych w 2008 roku:

- w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* 77 projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny merytorycznej II stopnia (dofinansowanie z EFRR ponad 10,5 mln PLN); 9 projektów pierwotnie zakwalifikowanych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (około 1 mln PLN z EFRR) oraz 8 projektów przywróconych w wyniku procedury odwoławczej (około 2,3 mln PLN z EFRR). Ostatecznie w ramach I naboru wniosków 1.1.2 wybrano do dofinansowania 144 projekty o kwocie dofinansowania z EFRR ponad 29,5 mln PLN.
- W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, zakończyła się procedura oceny projektów. Wybrano do dofinansowania 91 projektów o wartości dofinansowania z EFRR przekraczającej 112 mln PLN.
- W ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* przyjęto do dofinansowania kolejne 4 projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach procedury odwoławczej (o wartości dofinansowania z EFRR około 2,2 mln PLN). Ostatecznie w ramach I naboru wniosków 1.4.1 wybrano do dofinansowania 53 projekty o wartości dofinansowania z EFRR przekraczającej 41 mln PLN.

Podpisane umowy/podjęte decyzje o dofinansowaniu

W ramach *Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*, w I półroczu 2009 r. podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie projektów z przedsiębiorcami oraz pierwsze z beneficjentami z sektora publicznego. W I półroczu 2009 r. podpisano 102 umowy z przedsiębiorcami oraz 13 umów z przedstawicielami sektora publicznego.

Całkowity poziom zakontraktowania w ramach *Osi priorytetowej 1* według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. to 121 podpisanych umów o łącznej wartości ponad 331,7 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ponad 121 mln PLN.

Wnioski o płatność

Na dzień 30 czerwca 2009 r. w ramach *Osi priorytetowej 1* beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR 9,7 mln PLN, co stanowi 1,37% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Wskaźniki produktu

Do końca I półroczu 2009 r. w ramach *Osi priorytetowej 1* rozpoczęto realizację 108 projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (70 mikroprzedsiębiorstw, 28 małych oraz 10 średnich przedsiębiorstw) oraz 53 projekty na dofinansowanie projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu⁵. Wsparcie otrzymało 27 nowych przedsiębiorstw, tj. funkcjonujących nie dłużej niż 2 lata od powstania. 23 projekty zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.

Projekty te dotyczyły w szczególności branży budowlanej, działalności usługowej, branży restauracyjnej oraz działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego (centra ochrony zdrowia takie jak klinika stomatologiczna oferująca nowoczesne usługi oraz przychodnia z ogólnodostępną apteką).

⁴ wg kursu 1 Euro = 4,4910 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia, tj. 28 maja 2009 r.

⁵ Wskaźniki *Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw* oraz *Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu* dotyczą w niektórych przypadkach jednego projektu, dlatego suma poszczególnych typów projektów jest większa niż liczba realizowanych projektów.

Ponadto, niektóre z przedsięwzięć realizowanych w ramach *Osi*, polegały na wprowadzeniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii (m.in. w zakresie zagospodarowania pozostałości biodegradowalnych, poligrafii, obróbki metali).

Projekty te były bezpośrednio ukierunkowane na osiągnięcie celów RPO WO 2007-2013. Przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw za sprawą unowocześnienia ich oferty produktowej, usługowej i technologicznej oraz wzrostu ich możliwości inwestycyjnych. Realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się również do wsparcia aktywnej polityki zatrudnienia poprzez rozwój istniejących przedsiębiorstw.


Ponadto, przedsięwzięcia zrealizowane w zakresie turystyki, rekreacji i sportu wpłynęły na podniesienie standardu infrastruktury i jakości oferowanych usług, co w przyszłości przyczyni się do wzrostu ekonomicznego w regionie i podniesienia jego atrakcyjności dla mieszkańców oraz potencjalnych turystów i inwestorów.

Wartość wskaźnika *Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw* na poziomie *Osi priorytetowej 1* został osiągnięty w 41% (w stosunku do celu założonego na 2010 r.). W sytuacji, gdy wciąż trwa podpisywanie umów z przedsiębiorcami oraz ocena projektów złożonych w II i III naborze w ramach poddziałania 1.1.2, a także planowane są kolejne nabory wniosków – osiągnięcie założonej wartości wskaźnika nie wydaje się być zagrożone.

Natomiast w przypadku wskaźnika *Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu* wartość docelowa założona na rok 2010 została już przekroczona. Świadczy to o dużym zainteresowaniu beneficjentów tego typu projektami.

Stan wdrażania Osi 1 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wykres 8. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 1* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

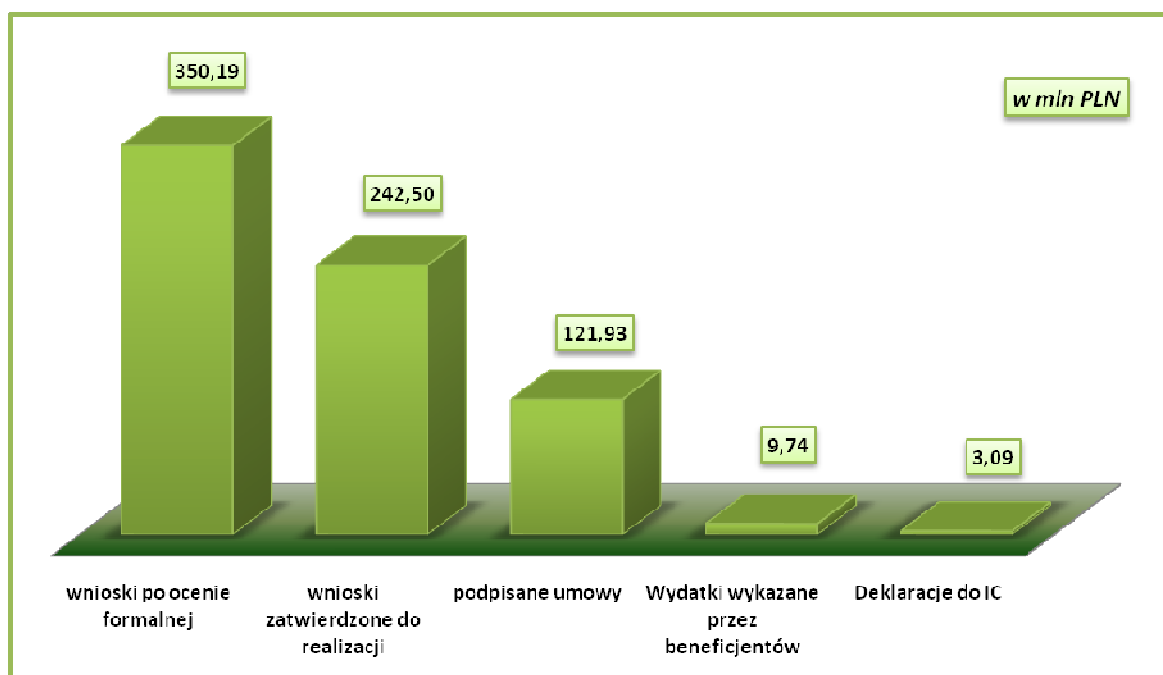

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory planowane

Na II półroczu 2009 r. w ramach *Osi Priorytetowej 1* zaplanowano 6 naborów w ramach procedury konkursowej oraz złożenie pełnej dokumentacji projektowej dla 1 projektu z listy indywidualnych projektów kluczowych.

Tabela 10. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 1 w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu | 16 – 27 listopada |
| 2. | 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach | 01– 14 września |
| 3. | 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości | 03 – 17 sierpnia |
| 4. | 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw | 15 – 30 września |
| 5. | 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach | 17 – 30 listopada |
| 6. | 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa | 31 sierpnia – 15 września |
| 7. | 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny (IPI) | 03 – 17 sierpnia |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

⇒ OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo informacyjne

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2009 r. nie odbyły się żadne nabory wniosków w ramach przedmiotowej Osi.

Nabory planowane

Pierwszy nabór w ramach Osi Priorytetowej 2 planuje się przeprowadzić w III kwartale 2009 r.

Tabela 11. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 2 w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|--|----------------------|
| 1. | 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT | 02 – 16 listopada |
| 2. | 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych | 01 – 15 października |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

⇒ OŚ PRIORYTETOWA 3 Transport

Nabory ogłoszone

W dniach od 23 lutego do 09 marca 2009 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Na nabór przeznaczono kwotę około 2,1 mln Euro, tj. ponad 9 mln PLN⁶. Złożono 3 wnioski o całkowitej wartości blisko 22,5 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło ponad 18,4 mln PLN. Wszystkie przeszły pozytywnie etapy oceny i zostały zaakceptowane do realizacji przez ZWO.

Projekty zaakceptowane do realizacji

W okresie sprawozdawczym zakończyła się także ocena projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne*. Spośród złożonych 34 wniosków (w grudniu 2008 r.) –

⁶ wg kursu 1 Euro = 4,3840 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia, tj. 30 stycznia 2009 r.

33 otrzymały ocenę pozytywną na wszystkich etapach ocen i zostały zaakceptowane do realizacji. Wartość dofinansowania z EFRR projektów zaakceptowanych do realizacji wyniosła ponad 76 mln PLN.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W I półroczu 2009 r., w ramach *Osi priorytetowej 3. Transport* podpisano 18 nowych umów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR blisko 42 mln PLN.

Całkowita wartość wszystkich 22 umów podpisanych w ramach przedmiotowej *Osi* od początku uruchomienia programu wynosi ponad 202 mln PLN, a wartość dofinansowania z EFRR – 134 mln PLN.

Wnioski o płatność

Na dzień 30 czerwca 2009 r. w ramach *Osi priorytetowej 3* beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR ponad 37 mln PLN, co stanowi 7,46% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej *Osi*.

Wskaźniki produktu

W ramach *Osi priorytetowej 3. Transport* realizowane są 22 projekty z zakresu transportu: 3 dotyczą budowy/przebudowy dróg regionalnych, 18 dróg lokalnych i 1 transportu publicznego. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja jednego projektu. W jego wyniku zrekonstruowano 7 km dróg regionalnych (wojewódzkich).


Inwestycja ta wpisuje się w cele RPO WO 2007-2013, gdyż jest ona ważnym elementem regionalnego systemu transportowego łączącego województwo z autostradą A4, czyli ponadlokalnym systemem transportowym.

Droga wojewódzka nr 414 stanowi dostęp do terenów o ogromnym znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym regionu do Gór Opawskich oraz planowanych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Biała. Łatwiejszy dostęp do stolicy regionu oznacza możliwość rozwoju gospodarczo-społecznego terenu przygranicza, stanowiącego obszar o bardzo dużych możliwościach.

Inwestycja w dalszej przyszłości przyczyni się ponadto do powstania oszczędności w przewozach pasażerskich jak i towarowych, a także do poprawy bezpieczeństwa podróżujących, wzrostu komfortu jazdy, poprawy płynności jazdy.

Stan wdrażania Osi 3 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wykres 9. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 3* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

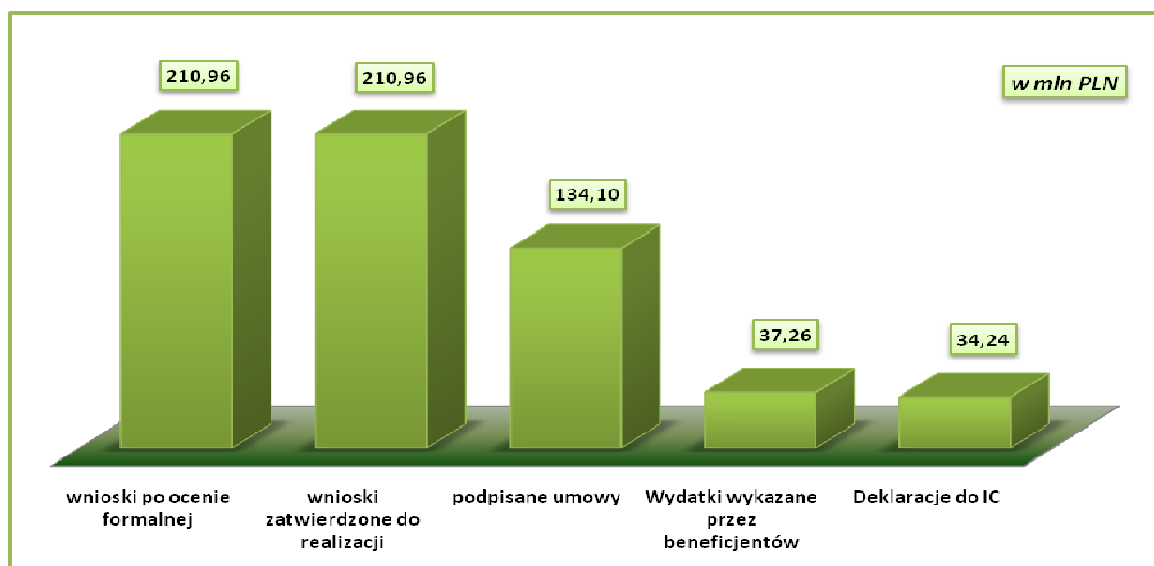

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory planowane

W II półroczu 2009 r. zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach *Osi Priorytetowej 3* zaplanowano 1 nabór wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 1 nabór w ramach procedury indywidualnych projektów kluczowych.

Tabela 12. Planowane nabory wniosków w ramach *Osi priorytetowej 3* w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | 3.2 <i>Transport publiczny</i> | 16-30 listopada |
| 2. | 3.2 <i>Transport publiczny (IPI)</i> | 15-30 września |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*.

⇒ OŚ PRIORYTETOWA 4 *Ochrona środowiska*

Nabory ogłoszone

W styczniu 2009 r. złożono pełną dokumentację projektową dla projektu kluczowego *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie* w ramach działania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*. Całkowita wartość projektu to ponad 28 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR wynosi ponad 15,7 mln PLN.

Projekty zaakceptowane do realizacji

W okresie sprawozdawczym zakończyła się też ocena projektów złożonych w ramach I naboru do 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*. Spośród złożonych 19 wniosków (w listopadzie 2008 r.) – 14 zostało zaakceptowanych do realizacji na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 78 mln PLN).

Zaakceptowano do realizacji także projekt kluczowy, o całkowitej wartości przekraczającej 28,5 mln PLN.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W ramach *Osi priorytetowej 4* do 30 czerwca 2009 r. podpisano łącznie 13 umów, których wartość dofinansowania z EFRR przekracza 87 mln PLN. 12 umów realizowanych jest w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* oraz 1 projekt kluczowy realizowany w ramach działania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*.

Wskaźniki produktu

W ramach *Osi priorytetowej 4. Ochrona środowiska* realizowanych jest 12 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz 1 projekt dotyczący prewencji zagrożeń. Wszystkie projekty są jeszcze w trakcie realizacji, więc nie można opisać postępu realizacji wskaźników produktu w ramach *Osi*.

Obecnie realizowane projekty w ramach *Osi priorytetowej 4* przyczyniają się do ochrony zasobów wód rozlokowanych na terenie województwa opolskiego oraz zmniejszenia zagrożenia przeciwpowodziowego w województwie opolskim. Realizowane inwestycje wpisują się w jeden z głównych celów *Osi Priorytetowej 4* „*Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego*”.

Projekty realizowane w ramach działania 4.1. rozlokowane są w obrębie 4 głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wymagających najwyższej ochrony tzw. *ONO* (są to: GZWP 323 Subzbiornik rzeki Stobrawy, GZWP 324 Dolina Kopalna Kluczborka, GZWP 328 Dolina Kopalna Małej Panwi i GZWP 333 Zbiornik Opole – Zawadzkie) oraz dwóch zbiorników wymagających wysokiej ochrony

tzw. *OWO* (są to : GZWP 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie i GZWP 338 Subzbiornik Paczków-Niemodlin).


Wśród projektów kanalizacyjnych realizowane są również 2 projekty (gminy Dobrodzień i Kolonowskie), które są elementem dużego przedsięwzięcia pn Trias Opolski. W jego ramach prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi, co w efekcie wpłynie na oczyszczenie Jeziora Turawskiego. Inwestycja ta ma także znaczenie dla zachowania czystości wód podziemnych najcenniejszego zbiornika triasowego GZWP 333 Opole – Zawadzkie, źródła wody pitnej dla mieszkańców Opolszczyzny, Śląska oraz Czech. Inwestycje w ramach działania 4.1 mają również istotne znaczenie dla ochrony obszarów cennych przyrodniczo m.in. Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie, Bory Niemodlińskie, Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz korytarza ekologicznego Dolina Małej Panwi.

Ponadto budowa zbiorczej kanalizacji w gminach Branice i Głubczyce przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w dorzeczu rzeki Troi, tym samym poprawy jakości wód nowo wybudowanego (ze środków ZPORR 2004-2006) zbiornika retencyjnego „Włodzienin”, mającego na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe południowej części regionu opolskiego.

Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego północnej części regionu w ramach działania 4.2 realizowana jest budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie. Realizacja projektu będzie stanowiła jeden z elementów całego systemu małej retencji w województwie opolskim.

Stan wdrażania Osi 4 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wykres 10. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 4* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

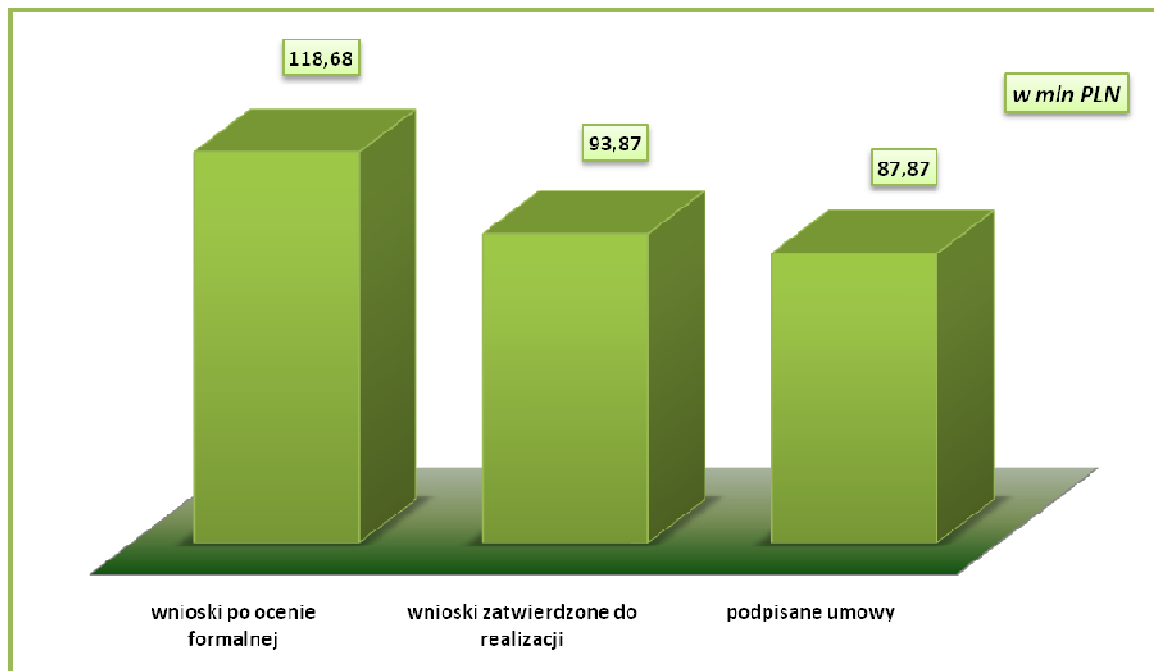

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory planowane

W ramach *Osi Priorytetowej 4*, w II półroczu 2009 r. zaplanowano 3 nabory wniosków w procedurze konkursowej.

Tabela 13. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|--|------------------|
| 1. | 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i> | 03 – 17 sierpnia |
| 2. | 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i> | 15 – 30 września |
| 3. | 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i> | 01 – 15 września |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*.

⇒ OŚ PRIORYTETOWA 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Nabory ogłoszone

W dniach od 27 kwietnia do 11 maja 2009 r. przeprowadzono jeden nabór wniosków w ramach poddziałania 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*.

Kwota alokacji przeznaczona na ten nabór wyniosła ponad 2,5 mln Euro, tj. ponad 12 mln PLN⁷.

W ramach ww. naboru złożonych zostało 18 wniosków o łącznej wartości ponad 13 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło około 8,84 mln PLN, co nie wyczerpało w pełni alokacji przeznaczonej na nabór. Ocenę formalną przeszło pozytywnie 11 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR ponad 5 mln PLN.

W dniach od 2 do 16 lutego 2009 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*. Można było składać wnioski na realizację dwóch typów przedsięwzięć: Typ I Infrastruktura kultury o zaznaczeniu ponadlokalnym (alokacja około 6 mln Euro, tj. blisko 25 mln PLN⁸) oraz Typ II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (alokacja 2, 4 mln Euro, tj. około 10 mln PLN⁸). Złożono 36 wniosków o dofinansowanie. Wartość wniosków złożonych prawie trzykrotnie przewyższyła przeznaczoną alokację. Pozytywną ocenę formalną otrzymały 33 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania EFRR ponad 87 mln PLN.

Projekty zaakceptowane do realizacji

W okresie sprawozdawczym zakończyła się też ocena projektów złożonych w ramach naboru do 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. Spośród złożonych 12 wniosków (we wrześniu 2008 r.) – 11 zostało zaakceptowanych do realizacji, na kwotę ponad 56 mln PLN dofinansowania z EFRR.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził do realizacji także 23 projekty w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*, na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 54,5 mln PLN.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W I półroczu 2009 r. ramach Osi priorytetowej 5 podpisano 13 umów o wartości dofinansowania z EFRR 64,3 mln PLN (11 umów w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* oraz 2 umowy w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*).

Całkowita wartość 26 umów zawartych w ramach Osi od początku uruchomienia Programu to ponad 159,5 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR około 101,6 mln PLN.

⁷ wg kursu 1 Euro = 4,7260 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia, tj. 30 marca 2009 r.

⁸ wg kursu 1 Euro = 41465 PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia, tj. 30 grudnia 2008 r.

Wnioski o płatność

Na dzień 30 czerwca 2009 r. w ramach *Osi priorytetowej 5* beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR przekraczającą 6,8 mln PLN, co stanowi 3,58% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej *Osi*.

Wskaźniki produktu

W ramach *Osi priorytetowej 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* realizowanych jest 11 projektów z zakresu edukacji (w tym 2 projekty uczelni wyższej), 13 projektów z zakresu ochrony zdrowia oraz 2 projekty w zakresie dziedzictwa kulturowego.

W ramach zakończonych 8 projektów z zakresu ochrony zdrowia wsparcie otrzymało 14 placówek medycznych (szpitali i klinik), dla których potrzeb zakupiono, m.in. 126 sztuk sprzętu medycznego.

Efekty tych projektów to przede wszystkim szeroko rozumiane podniesienie standardu opieki zdrowotnej, tj. poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w stacjonarnej opiece medycznej, poprawa dostępności do nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki, skrócenie czasu oczekiwania na badania i specjalistyczną diagnozę.

Projekty te zapewniają ponadto wczesną wykrywalność, poprawę efektywności i jakości diagnostyki i terapii (szczególnie w takich dziedzinach jak: onkologia, hematologia, kardiologia czy neurologia).

Dzięki zakupionemu nowoczesnemu sprzętowi medycznemu poprawia się precyzja wykonywanych badań, liczba wykonywanych badań tomografii komputerowej, mammograficznych i EEG. Badania przeprowadzane za pomocą nowoczesnej aparatury są bardziej bezpieczne dla pacjentów, a prowadzona z ich pomocą diagnostyka stanu zdrowia pacjentów przedstawia dokładniejszy i pełniejszy obraz.

Te wszystkie elementy przyczyniają się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie, co wszystko w celu długoterminowym przełoży się na obniżenie śmiertelności i poprawę zdrowia mieszkańców regionu.

Wskaźnik *Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia* został już przekroczony na poziomie poddziałania 5.2.1 blisko 2-krotnie. *Liczba zakupionego sprzętu medycznego* – docelowy wskaźnik został już wielokrotnie przekroczony.


Projekty realizowane w zakresie edukacji przyczynią się do zwiększenia poziomu wykształcenia społeczeństwa regionu oraz skoordynowania działań w obszarze infrastruktury edukacyjnej, która ma zapewnić stworzenie efektywnego, zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy, systemu kształcenia kadr.

Podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez inwestycje w bazę placówek edukacyjnych umożliwi wzrost aktywności regionalnego środowiska technologicznego. Zostanie ułatwiony przepływ kadry z uczelni do przedsiębiorstw i odwrotnie.

Szczególne znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu, będą miały dziedziny wskazane przez realizowane badania w ramach *Regionalnego Foresight*, takie jak: chemia, biotechnologia, budownictwo, medycyna.

Stan wdrażania Osi 5 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

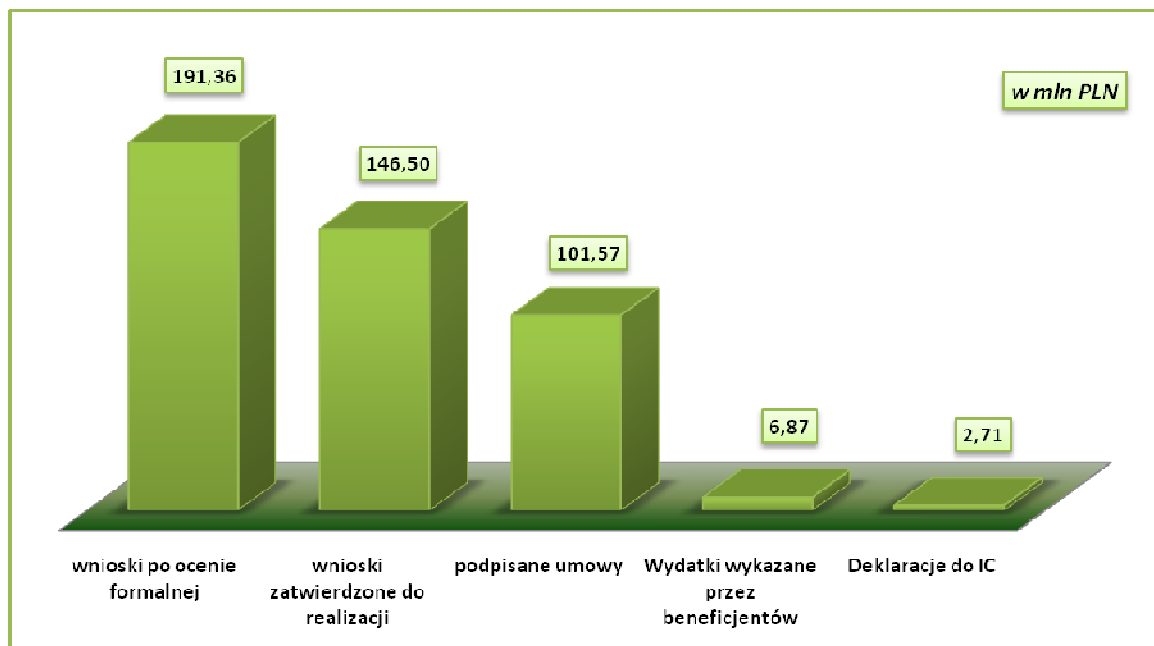

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory planowane

W II półroczu 2009 r. zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* zaplanowano 1 nabór wniosków w trybie konkursowym.

Tabela 14. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 5 w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|--|----------------------|
| 1. | 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej | 16 – 30 października |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*.

⇒ OŚ PRIORYTETOWA 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Nabory ogłoszone

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* w I półroczu 2009 r. nie ogłoszono żadnego naboru wniosków w ramach przedmiotowej Osi.

Weryfikacji poddanych zostało 21 *Lokalnych Programy Rewitalizacji*, które zostały opracowane przez poszczególne miasta na podstawie *Wytycznych IZ RPO WO 2007-2013*. W maju 2009 r. zakończyła się ich ocena merytoryczna, w wyniku której pozytywnie ocenionych zostało 16 *Lokalnych Programów Rewitalizacji*.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W ramach Osi priorytetowej 6 podpisano 1 umowę na realizację projektu kluczowego *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF*, złożonego w ramach działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*,


przez Politechnikę Opolską (w I kwartale 2008 r.). Wartość umowy to 21,4 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR ponad 18,2 mln PLN. Wartość zakontraktowania to ponad 11% alokacji środków przeznaczonych na przedmiotową Oś.

Wskaźniki produktu

Z uwagi na brak w KSI (SIMIK 07-13), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., wniosków o płatność końcową, nie można wykazać postępu w realizacji wskaźników rzeczowych w ramach Osi priorytetowej 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych.

Stan wdrażania Osi 6 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wykres 12. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

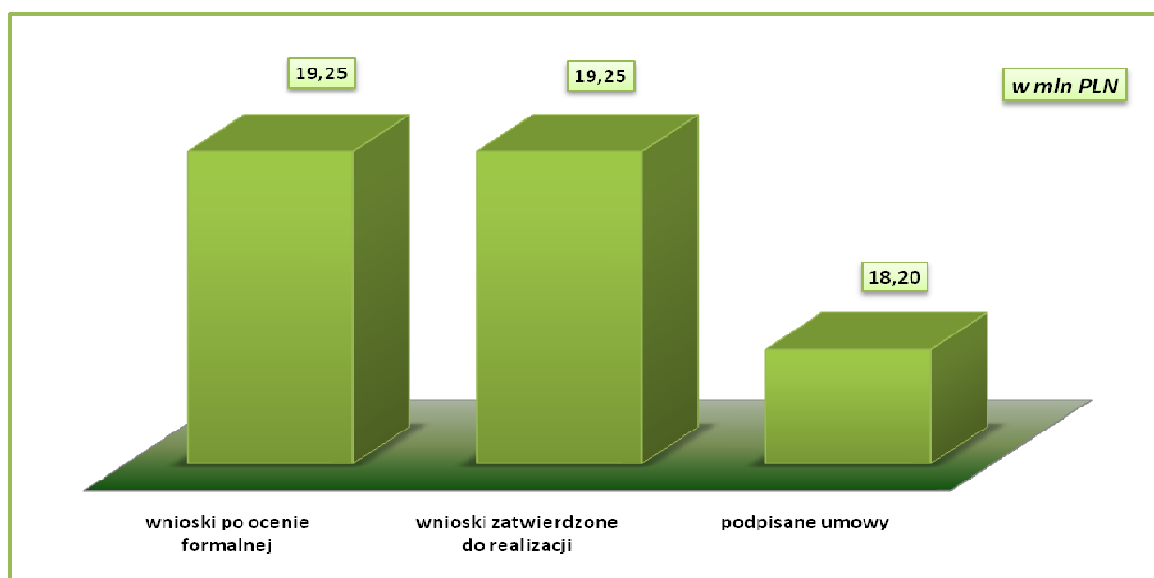

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

Nabory planowane

W II półroczu 2009 r. w ramach Osi Priorytetowej 6 zaplanowano 2 nabory wniosków w procedurze konkursowej.

Tabela 15. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 6 w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Termin naboru |
|-----|---|--------------------|
| 1. | 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | 01-15 października |
| 2. | 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych | 17-31 sierpnia |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

⇒ **OŚ PRIORYTETOWA 7 Pomoc techniczna**

Nabory ogłoszone

W I półroczu 2009 r. nie złożono Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013.

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych nowych umów, ani nie podjęto decyzji o dofinansowaniu.

Wnioski o płatność


Na dzień 30 czerwca 2009 r. w ramach *Osi priorytetowej 7* beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 9,1 mln PLN, co stanowi 15,81% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej *Osi*.

Wskaźniki produktu

W ramach *Osi priorytetowej 7. Pomoc techniczna* w okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja Rocznych Planów Działań na lata 2007-2008. Na potrzeby obsługi Programu zatrudniono 90 osób w IZ oraz w IP II stopnia (70 kobiet, 20 mężczyzn) – 85% realizacji wartości wskaźnika na 2010 r. Zakupiono 85 sztuk zestawów komputerowych – 36% realizacji wartości wskaźnika na 2010 r. Przeprowadzono 151 szkoleń, konferencji i seminariów (realizacja wskaźnika na 2010 r. w 150%); opracowano 17 ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji studiów (141% realizacji wskaźnika założonego do osiągnięcia w 2010 r.).

Stan wdrażania Osi 7 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wykres 13. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach *Osi priorytetowej 7* na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.

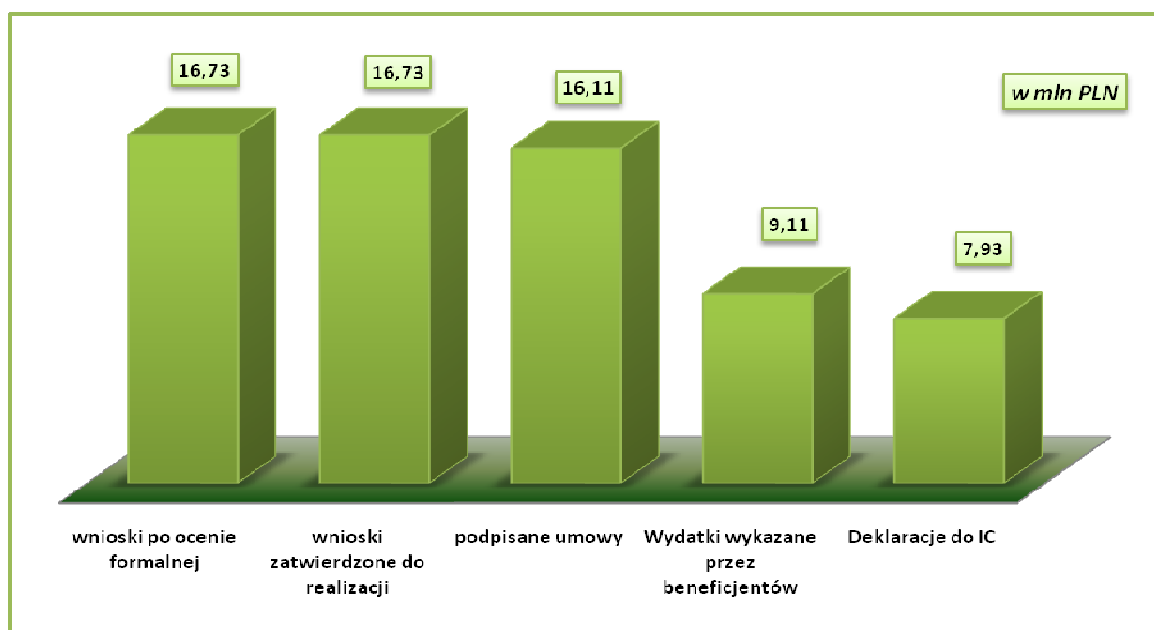

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

V. Indywidualne projekty kluczowe

Zmiany na liście indywidualnych projektów kluczowych

Dokument *Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013* został przyjęty uchwałą nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 listopada 2007 r. i stanowi Załącznik nr 4 do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Aktualizację dokumentu w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa *Tabela 16*.

Tabela 16. Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013.

| Podstawa aktualizacji dokumentu | Najważniejsze zmiany |
|--|---|
| <p><i>Uchwała nr 3239/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ usunięcie z listy projektu pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Centrum Nauki i Biznesu (CeNaB)”, w związku z wycofaniem przez Beneficjenta tj. Uniwersytet Opolski w/w projektu z procesu oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej RPO WO 2007-2013; ▪ zmiana nazwy projektu projektu z ”Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401” na „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17”; |
| <p><i>Uchwała nr 3512/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ usunięcie z listy projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 3,4,5”, w związku z wycofaniem w/w projektu z procesu oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej RPO WO 2007-2013; ▪ zmiana nazwy projektu z „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej” na „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” (Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o realizacji dwóch niezależnych projektów inwestycyjnych pawilonu leczniczego, budowanego ze środków samorządu województwa, oraz projektu kluczowego obejmującego zakres rzeczowy Zespołu Parkowo-Pałacowego z wyłączeniem usług zdrowotnych). |

Źródło: Opracowanie własne.

Złożona dokumentacja projektowa

W I półroczu 2009 r. została złożona pełna dokumentacja projektowa dla 2 projektów:

- ✓ Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie w km 61+500 w ramach działania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*;
- ✓ Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich” w ramach poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*.

Projekty zaakceptowane do realizacji

Projekt z działania 4.2 Budowa *zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie w km 61+500* został zaakceptowany do realizacji przez Zarząd Województwa Opolskiego. Jego wartość dofinansowania z EFRR to 15,7 mln PLN.

Podpisane umowy

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 nowe umowy na realizację projektów kluczowych (w ramach działań/poddziałów 1.4.2, 4.2, 6.2) o łącznej wartości 66,5 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 45,7 mln PLN.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. podpisanych było 8 umów na realizację projektów kluczowych. Ich całkowita wartość to ponad 274 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi około 164,6 mln PLN.

Wnioski o płatność

Na dzień 30 czerwca 2009 r. beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 37,4 mln PLN. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskami wynosi ponad 53,3 mln PLN.

Planowane nabory

W II półroczu 2009 r. planuje się 2 nabory wniosków w ramach procedury indywidualnych projektów kluczowych:

Tabela 17. Planowane nabory wniosków w ramach procedury indywidualnych projektów kluczowych w II półroczu 2009 r.

| Lp. | Nazwa działania/poddziałania | Tytuł projektu | Termin naboru |
|-----|---|---|------------------|
| 1. | 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry. | 03 – 17 sierpnia |
| 2. | 3.2 Transport publiczny | Utworzenia Lokalnego Publicznego Portu Lotniczego w Kamieniu Śląskim. | 15 – 30 września |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

VI. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013

W I półroczu 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 realizowała zadania związane z opracowywaniem/zmianą następujących dokumentów:

⇒ **Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1324/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 18.

Tabela 18. Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.

| Podstawa aktualizacji dokumentu | Najważniejsze zmiany |
|--|--|
| Uchwała nr 2879/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 05 lutego 2009 r. | <ul style="list-style-type: none">▪ zmiany w karcie działania 3.1.1 Drogi regionalne dotyczące minimalnej wartości projektu;▪ dopisanie warunków szczegółowych w karcie działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. |
| Uchwała nr 3117/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. | <ul style="list-style-type: none">▪ w związku z aktualizacją Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej oraz wejściem w życie Rozporządzenia Komisji WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), w całym dokumencie dostosowano zapisy do w/w Rozporządzeń;▪ w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zaktualizowano m.in. zapisy dotyczące procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym;▪ dokonano aktualizacji załącznika nr 5 Kryteria wyboru projektu (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013;▪ dokonano aktualizacji załącznika nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 – wytyczne;▪ dokonano zmian w kartach działań/poddziałań RPO WO 2007-2013 w zakresie m.in. minimalnej/maksymalnej wartości dofinansowania, warunków szczegółowych, typów projektów; |

| Podstawa aktualizacji dokumentu | Najważniejsze zmiany |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaktualizowano zapisy w związku z przesunięciem środków finansowanych pomiędzy działaniami/poddziałaniami RPO WO 2007-2013 |
| <p><i>Uchwała nr 3441/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2009 r.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ w kartach działań dokonano zmiany dnia rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów objętych pomocą de minimis w ramach poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>. Dokonano aktualizacji załącznika nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 – wytyczne w zakresie dostosowania zapisów do zmiany rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w projektach objętych pomocą de minimis dostosowanie zapisów w zakresie kwalifikowalności wydatków do <i>Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013</i>; ▪ w kartach działań dokonano zmiany maksymalnej kwoty wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i> oraz poddziałania 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>. Z limitów pomocy de minimis wynika, iż możliwe jest udzielenie dofinansowania w ramach tej pomocy do 800 000 PLN; ▪ zaktualizowano zapisy dotyczące procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym w wyniku opracowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 wytycznych w zakresie ww. procedury; ▪ dokonano aktualizacji załącznika nr 4 Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013; ▪ w związku z wejściem w życie Wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami dostosowano zapisy w karcie działania 4.1 <i>Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami</i>; ▪ dostosowano zapisy do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008). |

Źródło: Opracowanie własne.

⇒ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1855/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 19.

Tabela 19. Aktualizacja *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

| Podstawa aktualizacji dokumentu | Najważniejsze zmiany |
|--|--|
| <p><i>Uchwała nr 2837/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2009 r.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ uszczegółowienie Procesu nr 4 pn. Zarządzanie finansowe w zakresie pobierania informacji na temat obciążeń na projekcie oraz rezygnacji z Ramowego Planu Realizacji Działania; ▪ określenie w Procesie nr 5 pn. Sprawozdawczość i monitoring ramowych terminów zatwierdzania sprawozdań okresowych i rocznych przez KM RPO WO 2007-2013; ▪ usunięcie Podprocesu nr 8.3 pn. Administracja uprawnieniami w ramach bazy danych Rejestru Podmiotów Wykluczonych. |

| Podstawa aktualizacji dokumentu | Najważniejsze zmiany |
|---|--|
| <p><i>Uchwała nr 2973/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 marca 2009 r.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ uszczegółowienie Procesu nr 1 pn. Wybór projektów w zakresie terminów, zasad powołania Zespołu ds. odwołań oraz procedury złożenia skargi kasacyjnej do NSA; ▪ określenie w Podprocesie 2.6 pn. Weryfikacja wniosków o płatność wraz z częścią dot. postępu rzeczowo - finansowego projektu/RPDz nowego terminu wprowadzania zatwierdzonego wniosku o płatność do KSI (SIMIK 07-13); ▪ uzupełnienie zapisów Podprocesu nr 6.2 pn. Sporządzenie i przekazywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających i/lub niepodlegających raportowaniu do KE na podstawie art. 28 Rozporządzenia nr 1828/2006 do MF-R/IPOC w zakresie terminów przekazywania informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE. |
| <p><i>Uchwała nr 3461/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 czerwca 2009 r.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ dodanie we wstępie zapisu o możliwości wydawania przez IZ RPO WO 2007-2013 wytycznych, wraz z informacją dotyczącą ich zatwierdzania i opiniowania; ▪ uaktualnienie podprocesu pn. Procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów w wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (Dz. U. 2008 Nr 216, poz. 1370) oraz na podstawie Wytycznych IZ RPO WO 2007-2013 w zakresie procedury odwoławczej w ramach RPO WO 2007-2013; ▪ zmiana zapisów podprocesu nr. 2.5 Nadzór nad prawidłową realizacją przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy /decyzji o dofinansowanie projektu/RPDz pod kątem weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych; ▪ dodanie podprocesu pn. Kontrola krzyżowa programu/horyzontalna z projektami PROW 07-13; ▪ wprowadzenie zmian pod kątem zasad przekazywania przez IZ RPO WO 2007-2013 środków z dotacji rozwojowej dla IP II stopnia na płatności dla beneficjentów. |

Źródło: Opracowanie własne.

⇒ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1854/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2008. r. z późn. zm. W okresie sprawozdawczym dokument nie był aktualizowany.

⇒ **Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 stanowi dokument IZ RPO WO 2007-2013 przygotowany dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Z uwagi na złożoność, dokument składa się z trzech tomów. Wobec powyższego został on przyjęty w trybie uchwał Zarządu Województwa Opolskiego:

- *Uchwała nr 1332/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008 r., przyjmująca *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013;*

- *Uchwała nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008 r., przyjmująca Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013;*
- *Uchwała nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 lutego 2008 r., przyjmująca Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.*

Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego: 2929/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. 3122/2009 z dnia 31 marca 2009 r.; 3123/2009 z dnia 31 marca 2009 r., 3439/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.; 3440/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.

Wprowadzane zmiany wynikały z konieczności doprecyzowania zapisów oraz dostosowania do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.

⇒ ***Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1411/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. Aktualizację zapisów w/w dokumencie dokonano uchwałą nr 3160/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. Zmiany w dokumencie wynikały z dotychczasowego braku możliwości sporządzania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia analiz niezbędnych do oceny efektywności procesów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 w ramach RPO WO 2007-2013 (ww. zmiana dotyczy kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej. Konieczne było zaktualizowanie dokumentu w zakresie aktów prawnych, stanowiących podstawę kwalifikowania wydatków w ramach pomocy technicznej. Wprowadzono również zmianę dostosowującą termin sporządzania sprawozdania końcowego z realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej w sytuacji zmiany terminu finansowej i rzeczowej realizacji ww. projektu.

⇒ ***Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich***

Dokument został przyjęty uchwałą nr 2351/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokument nie był aktualizowany.

⇒ ***Wytyczne w zakresie zasad udzielania pomocy dla osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą (StartUp) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach***

Dokument przyjęty uchwałą nr 3238/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. Określa zasady, na jakich osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013.

⇒ ***Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzenia kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument przyjęty uchwałą nr 2576/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2008 r.

Opracowanie ma na celu zaprezentowanie głównych założeń systemu kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2007-2013. W dokumencie określone zostały m.in. podstawy prawne procesów kontroli, zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, ogólne zasady systemu kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu. Dokument będzie wykorzystywany przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

W związku z koniecznością uszczegółowienia zapisów przebiegu czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu realizacji projektów oraz dodania zapisów dotyczących

procedury kontroli krzyżowych dokument był dwukrotnie aktualizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego: uchwałą nr 2889/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. oraz uchwałą nr 3358/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

⇒ **Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 3162/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. Ma na celu opis procedury odwoławczej dla projektów składanych do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WO 2007-2013. W dokumencie określone zostały zasady wnoszenia i rozpatrywania przez IZ środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w trakcie naboru projektów, a także wskazanie wnioskodawcy jego praw związanych z wniesieniem dalszych środków odwołania w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia protestu przez IZ.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

⇒ **Problemy zakłócające/opóźniające realizację RPO WO 2007-2013**

Najistotniejszym problemem, na jaki napotkała Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 we wdrażaniu RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym był brak odpowiednich rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego określających zasady udzielania pomocy publicznej. IZ RPO WO 2007-2013 opracowując *Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*, bierze pod uwagę stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego określającymi zasady udzielania pomocy publicznej w obszarach wymagających uzgodnień z Komisją Europejską.

Niestety nie udało się uniknąć konieczności zmiany terminów naborów ze względu na brak przedmiotowych rozporządzeń w I półroczu 2009 r.

Ze względu na trwające prace nad *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury strefy badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*, nabór wniosków w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* został przesunięty na czerwiec 2009 r., a następnie z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia naboru wniosków w tym terminie, nabór wniosków przesunięto ponownie na wrzesień 2009 r.

Przesunięciu uległ również nabór wniosków w ramach działania 1.3.1. *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*. Planowany wstępnie na czerwiec 2009 r. przesunięty został na wrzesień 2009 r.

Brak uregulowań prawnych mających wymierny wpływ na wdrażanie RPO WO 2007-2013 odnosi się do następujących działań i poddziałań Programu, co przedstawia *Tabela 20*.

Tabela 20. Zestawienie Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej.

| Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Działanie / Poddziałanie RPO WO 2007-2013 |
|---|--|
| <i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych</i> | 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i> 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</i> 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i> 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</i> |
| <i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych</i> | 6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> |

| Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Działanie / Poddziałanie RPO WO 2007-2013 |
|---|---|
| <i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych</i> | 3.2 Transport publiczny |

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami MRR, zarówno uczestnicząc w spotkaniach roboczych, jak i na bieżąco opiniując projekty rozporządzeń lub propozycje rozwiązań określających zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, opracowywanych na poziomie Ministerstwa. Dobrą praktyką jest stosowana również stała współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi.

⇒ **Inicjatywy/przedsięwzięcia realizowane przez Komitet Monitorujący, IZ RPO WO 2007-2013 oraz inne podmioty działające na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu**

• **Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013**

W I półroczu 2009 r. miały miejsce trzy posiedzenia KM RPO WO 2007-2013: w dniu 20 lutego, 11 marca oraz 05 czerwca. Podczas nich zatwierdzono *Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r. oraz Sprawozdanie roczne za 2008 r. z realizacji RPO WO 2007-2013*.

Członkowie KM zapoznali się z wynikami badań ewaluacyjnych: *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach RPO WO na lata 2007-2013, Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim oraz z Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2009*.

Ponadto, Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji), wynikające m.in. z rekomendacji przedstawionych przez ewaluatora w raporcie końcowym z badania *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach RPO WO 2007-2013*.

Zmiany dotyczyły zarówno kryteriów uniwersalnych: formalnych i merytorycznych I stopnia, jak i kryteriów szczegółowych na poziomie osi priorytetowych. Dodano kilka nowych kryteriów (m.in. poprawność formalna złożonej dokumentacji, szacunkowy wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających obiekt, spójność z politykami horyzontalnymi w zakresie ochrony środowiska), niektóre kryteria zostały usunięte.

Ponadto, doprecyzowano zapisy i nazwy kryteriów (nastąpiło odwrócenie kryterium efektywność kosztowa/wskaźnik efektywności kosztowej, które po zmianie licznika z mianownikiem otrzymało nazwę „nakład jednostkowy”) oraz wyszczególniono branże wskazane przez FORESIGHT województwa opolskiego, które będą premiowane przy ocenie projektów.

• **Zespół ds. przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w województwie opolskim**

W związku ze światowym kryzysem gospodarczym, Zarząd Województwa Opolskiego powołał w grudniu 2008 r. *Zespół ds. przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w województwie opolskim*, którego głównymi zadaniami są:

- stały i aktywny monitoring rynku pracy oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej;
- tworzenie instrumentów oddziaływania i przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczo-finansowego w województwie opolskim;
- przygotowywanie wspólnego stanowiska administracji rządowej i samorządowej;
- kierowanie do rządu RP rekomendacji wynikających z ustaleń *Zespołu* i przyjętych stanowisk.

W I półroczu 2009 r. miały miejsce 4 spotkania *Zespołu*. Ponadto, Zarząd Województwa Opolskiego spotkał się z przedstawicielami wszystkich samorządów powiatowych (12 spotkań) oraz z przedstawicielami sektora bankowego (3 spotkania).

W styczniu 2009 r. zorganizowano także konferencję z udziałem samorządowców, Wojewody Opolskiego, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji około biznesowych, podczas której zastanawiano się nad zminimalizowaniem negatywnych skutków kryzysu gospodarczego w regionie.

Ogólne wnioski ze spotkań w zakresie wsparcia unijnego są następujące. Należy przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych w regionie oraz rozstrzygnięcie naborów na projekty; szybko uruchomić płatności oraz zaliczkowanie częściowo zrealizowanych inwestycji. W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego przyspieszył nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 (część naborów planowana na kolejne lata, została przeniesiona na rok 2009), co będzie miało bezpośrednie przełożenie na szybsze podpisywanie umów i rozliczanie projektów.

- **Zespół Strategiczny ds. RPO WO 2007-2013**

Zespół został powołany *uchwałą nr 2861/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r.* Jego działania mają na celu dbałość o skuteczne zarządzanie Programem oraz intensyfikację, na wszystkich etapach realizacji projektów, działań Instytucji Zarządzającej dla lepszego wydatkowania środków w ramach Programu.

W jego ramach powołano trzy zespoły robocze:

- *Zespół ds. planowania i przygotowania projektów;*
- *Zespół ds. finansów;*
- *Zespół ds. monitorowania i realizacji projektów.*

W I półroczu 2009 r. miały miejsce cztery spotkania *Zespołu*, podczas których omawiano aktualny stan wdrażania całego Programu i poszczególnych działań, stopień realizacji założonych celów. Dyskutowano nad działaniami, które mają przyspieszyć wydatkowanie środków, szczególnie na rzecz przedsiębiorców, którzy mocno odczuwają skutki kryzysu gospodarczego. Każdorazowo analizowany był także postęp prac nad projektami własnymi Samorządu Województwa Opolskiego realizowanymi w ramach RPO WO 2007-2013, dyskutowano nad sposobami rozwiązania problemów pojawiających się przy ich wdrażaniu.

⇒ **Przeprowadzone badania ewaluacyjne**

Mając na względzie zapewnienie skutecznego, efektywnego zarządzania Programem IZ RPO WO 2007-2013 przystąpiła do badań ewaluacyjnych odnoszących się do oceny systemu wskaźników. Zakończono także prace nad raportem końcowym w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

- ***Badanie ewaluacyjne Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim***

Badanie zostało przeprowadzone w okresie sierpień 2008 r. – luty 2009 r. W ramach badania oceniony został stopień znajomości problematyki FS przez poszczególne grupy docelowe oraz rozpoznane ich zapotrzebowanie informacyjne w obszarze RPO WO 2007-2013. Ponadto, celem badania była ilościowa oraz jakościowa ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w sposób zintegrowany (łączny) w województwie opolskim w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL, jak również niezależnie dla każdego z ww. Programów. Badanie objęło także ocenę polityki komunikacyjnej w/i pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki informacyjno-promocyjnej w regionie oraz pomiędzy ww. instytucjami a grupami docelowymi, której efektem było wypracowanie modelu zalecanej polityki komunikacyjnej.

- **Badanie ewaluacyjne *Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013***

Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty – maj 2009 r. Celem badania było dokonanie oceny systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013 pod kątem zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji Programu. Celem operacyjnym było przygotowanie katalogu szczegółowych zmian i uzupełnień listy wskaźników w zakresie ich nazw, definicji, sposobu pomiaru, agregacji i wartości docelowych. Ocena dokonana została pod kątem racjonalizacji systemu monitoringu w taki sposób, aby służył on skutecznej i efektywnej realizacji RPO WO 2007-2013, umożliwiając odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiające się trudności czy nieprawidłowości. W ramach badania dokonano oceny przyjętego systemu wskaźników pod kątem 4 podstawowych kryteriów ewaluacyjnych: adekwatności, skuteczności, spójności i kompletności, natomiast poszczególne wskaźniki szczegółowo przeanalizowano pod kątem jakości ich definicji oraz dodatkowo w odniesieniu do ich poprawności, rozumianej jako: trafność względem typu projektów, mierzalność, dostępność informacji, kompletność i wzajemna rozłączność grup wskaźników przypisanych do typów projektów, a także adekwatność wobec celów działań i osi priorytetowych.

W II półroczu 2009 r. planuje się przyjęcie wyników badania przez Zarząd Województwa Opolskiego, a następnie przedstawienie do wiadomości Komitetowi Monitorującemu RPO WO 2007-2013.

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz badania potwierdzają, iż przyjęty w ramach RPO WO 2007-2013 katalog wskaźników jest wyczerpujący pod względem ilustrowania istotnych efektów realizacji projektów, a jednocześnie nie jest nadmiernie rozbudowany. Ogólnie, opracowane definicje wskaźników należy uznać za prawidłowe, podobnie jak przyporządkowanie większości wskaźników do poziomu produktu bądź rezultatu. Poprawnie sformułowano także jednostki pomiaru wskaźników. Niemniej jednak, w odniesieniu do wybranych wskaźników konieczne jest wprowadzenie szeregu niewielkich zmian.

System wskaźników monitoringu RPO WO 2007-2013 ogólnie należy ocenić pozytywnie, choć na etapie jego tworzenia nie udało się uniknąć pewnych błędów. Dzięki realizacji przedmiotowego badania problemy zostały zidentyfikowane, a zaprezentowane w raporcie wnioski i rekomendacje zawierają propozycje ich skutecznego rozwiązania.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie przeprowadzała kontroli systemowych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Kontynuowała jednak czynności kontrolne podjęte w II półroczu 2008 r. w ramach kontroli systemowej, która miała miejsce w dniach 23 października – 18 listopada 2008 r.

Sformułowane w lutym 2009 r. zalecenia pokontrolne miały na względzie usunięcie błędów i uchybień zidentyfikowanych w zakresie: procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, rejestracji wniosków w systemach informatycznych KSI (SIMIK 07-13) oraz SEZaM, procedury odwoławczej, sprawozdawczości oraz realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.

Do czasu przeprowadzenia działań naprawczych w obszarach wskazanych podczas kontroli, w IP II stopnia procedura podpisywania umów o dofinansowanie projektów wybranych w ramach naboru do poddziałań 1.1.2 i 1.4.1 RPO WO 2007-2013 została wstrzymana przez Instytucję Zarządzającą.

DZIAŁANIA POKONTROLNE

W dniach 27 lutego - 04 marca 2009 r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. W jej wyniku stwierdzono wdrożenie zaleceń oraz naprawienie błędów i uchybień.

W związku z powyższym, decyzją IZ RPO WO 2007-2013 proces podpisywania umów został odblokowany, za wyjątkiem projektów, w stosunku do których OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych) prowadził czynności wyjaśniające. W dniach 12 lutego - 10 kwietnia 2009 r. pracownicy Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, przeprowadzili kontrolę doraźną 3 wniosków (objętych czynnościami wyjaśniającymi przez OLAF). Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym IZ w dniu 03 czerwca 2009 r. wyraziła zgodę na kontynuację procesu wdrażania projektów.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ IP II STOPNIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, IP stopnia miała przeprowadzić 24 kontrole realizacji projektów. Ostatecznie, w I półroczu 2009 r., skontrolowano 17 projektów. Z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosków o płatność, pozostałe kontrole zostaną zrealizowane w II połowie 2009 r.

Przeprowadzone kontrole swym zakresem objęły następujące zagadnienia:

- zakres finansowo-księgowy i rzeczowy projektu (m.in. sprawdzenie czy wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; czy zadeklarowane przez beneficjentów wydatki zostały faktycznie poniesione i są kwalifikowane);
- osiągnięcie założonych wskaźników;
- zgodność z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku aplikacyjnego.

Przebieg kontroli

IP II stopnia przeprowadziła 13 kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów, poprzedzone kontrolą dokumentacji, oraz 4 projekty będące w trakcie realizacji. Kontrole dotyczyły projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* oraz 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*.

Wyniki kontroli

- w ramach kontroli 13 zakończonych projektów nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie sformułowano żadnych zaleceń pokontrolnych oraz nie podejmowano działań pokontrolnych;
- w 4 projektach skontrolowanych w trakcie realizacji – nie wykryto również żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ IZ RPO WO 2007-2013 W RAMACH POZOSTAŁYCH OSI PRIORYTETOWYCH

W okresie od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła 6 kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów złożonych do dofinansowania w ramach *Osi 5*, zaplanowanych w Rocznym Planie Kontroli IZ RPO WO 2007-2013 na rok 2009.

Przeprowadzone kontrole swym zakresem objęły następujące zagadnienia:

- sprawdzenie, czy beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umową/aneksami do umowy o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa;
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- sprawdzenie części sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatność;
- sprawdzenie zgodności wniosku beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu;
- oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej.

Przebieg kontroli

Kontrolę na miejscu ww. projektów poprzedziła kontrola dokumentacji na zakończenie realizacji projektów, polegająca na sprawdzeniu kompletności wszystkich dokumentów wymaganych na poprzednich etapach realizacji i rozliczenia oraz prawidłowości postępowania przy weryfikacji tychże dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wyniki kontroli

- w ramach 5 skontrolowanych projektów stwierdzono uchybienia w zakresie: braku aktualizacji dokumentacji pod kątem zmienionej ustawy *Prawo zamówień publicznych*; procedury przetargowej (np. pomyłki w protokołach, ogłoszeniach czy wnioskach komisji przetargowej); ewidencji księgowej; informacji i promocji (brak oznaczeń o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR). W przypadku jednego projektu sformułowano zalecenia pokontrolne, w pozostałych przypadkach poprzestano na podpisaniu informacji pokontrolnej. Wszyscy skontrolowani beneficjenci usunęli terminowo błędy i uchybienia. Proces kontroli projektów został zakończony;
- w ramach kontroli jednego projektu stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybienia w zakresie procedury przetargowej oraz naruszenie przepisów *Prawo zamówień publicznych* (m.in. zawarcie umowy z firmą przed terminem przewidzianym ustawowo na rozstrzygnięcie protestu). Zespół Kontrolujący sformułował zalecenia pokontrolne, które instytucja kontrolowana wypełniła terminowo. Błędy i uchybienia skorygowano, a środki za naruszenie przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* zwrócono na konto IZ RPO WO 2007-2013. Proces kontroli przedmiotowego projektu został zakończony.

Ponadto, kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu dodatkowo poddane zostało po jednym projekcie w ramach *Osi 3* i *Osi 5* oraz dwa projekty z *Osi 7*.

W ramach pozostałych Osi, ze względu na stopień zaawansowania ich wdrażania, nie przeprowadzono w okresie sprawozdawczym kontroli realizacji projektów. Nie ujawniono także przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

⇒ INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone działania kontrolne oraz audyty przez następujące instytucje:

I) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI

A) termin i zakres kontroli: 25 lutego – 9 marca 2009 r. Celem Systemowej Wizyty Sprawdzającej było zbadanie poprawności funkcjonowania procedur w procesie zarządzania i kontroli w RPO WO 2007-2013 w następujących obszarach: wdrażania, nieprawidłowości, kontroli, przygotowania instytucji do pełnienia roli Instytucji Zarządzającej.

– najważniejsze zalecenia:

- uściślenie zapisów Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013, Wytucznych IZ do przeprowadzenia kontroli oraz Regulaminu kontroli;
- terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami dokumentować przebieg kontroli;

- zapewnienie spójności rzeczywistych danych z ewidencją prowadzoną w ramach systemu KSI (SIMIK 07-13);
- przekazywanie do IPOC wyników kontroli i audytów zewnętrznych w IP II stopnia;
- przedkładanie celem uzgodnienia z IPOC projektów procedur i wytycznych IZ RPO WO 2007-2013.

– **stopień wdrożenia zaleceń:**

- uściślono zapisy dokumentów oraz zapewniono spójność we wskazanych obszarach;
- kontrole będą dokumentowane terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- uzupełniono niespójności między stanem rzeczywistym a danymi zawartymi w KSI
- (SIMIK 07-13);
- do IPOC będą przekazywane wyniki przeprowadzonych kontroli w IP II stopnia oraz projekty/aktualizacje wytycznych IZ RPO WO 2007-2013.

B) termin i zakres kontroli: 4 – 10 czerwca 2009 r. Wizyta sprawdzająca dotyczyła kontroli wydatków (na próbie) przedstawionych w poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do Instytucji Certyfikującej za okres do 31 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym raport z wizyty sprawdzającej nie został dostarczony do IZ RPO WO 2007-2013.

II) BIURO AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (BAU)

A) termin i zakres audytu: 21 listopada – 24 lutego 2009 r. W ramach audytu sprawdzano sposób nadzoru IZ wobec IP II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013.

– **najważniejsze zalecenia:**

- należy zwiększyć nadzór merytoryczny IZ RPO WO 2007-2013 nad jakością danych wprowadzanych przez IP II stopnia do systemu SEZaM, weryfikacją dokumentów (czy dane w nich zawarte są zgodne z dokumentami powiązаныmi), w ramach monitoringu procesów związanych z kontrolą zewnętrzną;
- należy zobowiązać IP II stopnia do systematycznego przekazywania informacji dotyczących wniesionych przez beneficjentów odwołań;
- należy zwiększyć nadzór nad procesem monitoringu i sprawozdawczości;
- należy opracować sprawny system wykorzystania LSI w celu uzupełnienia systemu KSI, aby oba systemy były wiarygodne;
- należy opracować zasady użytkowania systemu SEZaM przez IP II stopnia

– **stopień wdrożenia zaleceń:**

- wdrożony zostanie mechanizm kontroli integralności danych zarejestrowanych w LSI i KSI (SIMIK 07-13) polegający na badaniu zgodności danych poprzez porównanie obu systemów;
- przygotowane zostaną *Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad Instytucją Pośredniczącą II stopnia*;
- IP II stopnia zostanie zobligowana do przekazywania w cyklu tygodniowym zaktualizowanych zestawień złożonych protestów;
- zapisy *Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013* w zakresie monitoringu i sprawozdawczości są przestrzegane;
- zostaną opracowane *Wytyczne w zakresie użytkowania KSI (SIMIK 07-13) oraz SEZaM-u*, gdzie zostaną opisane zasady użytkowania systemów przez IP II stopnia.

B) termin i zakres audytu: 19 marca – 22 maja 2009 r. W ramach audytu weryfikowano proces wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013.

– najważniejsze zalecenia:

- należy przestrzegać zapisów Instrukcji wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 w zakresie weryfikacji formalnej, przy sporządzaniu zbiorczych list przekazujących wnioski do dalszych etapów ocen, weryfikacji dokumentacji, w zakresie rozpatrywania protestów;
- należy przestrzegać terminów określonych w pismach do beneficjentów przy przyjmowaniu korekt wniosków o dofinansowanie;
- zwrócić szczególną uwagę na terminowość składanych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.
- należy w w/w obszarach zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem procedur wynikających z regulacji wewnętrznych.

Informacja nt. wykonania zaleceń zostanie przekazana do BAU w III kwartale 2009 r.

C) termin i zakres audytu: 24 marca – 24 kwietnia 2009 r. Przeprowadzono czynności sprawdzające wdrożenia uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu końcowym z zadania audytowego pn. *Wykorzystanie środków w ramach Pomocy Technicznej dla RPO WO 2007-2013.*

– najważniejsze zalecenia:

- należy zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o jednoznaczną interpretację dotyczącą kwalifikowalności dodatku specjalnego oraz monitorować wprowadzenie zapisów w tym zakresie do *Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej;*

– stopień wdrożenia zaleceń:

- wystosowano do MRR pismo w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, iż zapisy dotyczące kwalifikowalności dodatku specjalnego zostaną wprowadzone przy aktualizacji *Wytycznych.*

D) termin i zakres audytu: 2 kwietnia – 28 maja 2009 r. Przeprowadzono czynności sprawdzające w zakresie pomocy publicznej, realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

– najważniejsze zalecenia:

- należy wprowadzić mechanizmy kontrolne umożliwiające ocenę przedsiębiorstwa pod kątem przesłanek wynikających z rozporządzenia Komisji 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Mechanizmy kontrolne powinny uwzględniać pozyskanie od podmiotów ubiegających się o udzielenie pomocy inwestycyjnej informacji pozwalających na ocenę występowania/braku występowania ww/ przesłanek;
- należy rozważyć wprowadzenie do list sprawdzających pytań dotyczących analizy sytuacji finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną/pomoc de minimis w kontekście przesłanek opisanych w kryterium oraz pytań dotyczących występowania we wniosku o dofinansowanie efektu zachęty;
- należy uzupełnić zakres czynności o zadania związane ze sprawozdawczością dot. pomocy publicznej;
- należy zwrócić się do UOKiK o jednoznaczną interpretację, co do sposobu sprawozdania w zakresie formy udzielania pomocy publicznej (czy sprawozdawczość powinna zawierać informację o przekazanej dotacji rozwojowej czy też o formie jej przekazania).

Informacja nt. wykonania zaleceń zostanie przekazana do BAU w III kwartale 2009 r.

⇒ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

RAPORT Z WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ W CERTYFIKACJI (IPOC)

W I półroczu 2009 r. IP II stopnia otrzymała Raport z systemowej wizyty sprawdzającej przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji w dniach od 3 do 15 grudnia 2008 r.

Celem ww. wizyty było zweryfikowanie poprawności funkcjonowania procedur w procesie oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013 tj.:

- naboru i oceny wniosków złożonych w procedurze konkursowej
- pozakonkursowej procedury wyboru indywidualnych projektów kluczowych;
- procedury odwoławczej.
- **najważniejsze zalecenia:**
 - należy terminowo przeprowadzać oceny wniosków,
 - dokumentować ustalenia komisji konkursowej zgodnie z zapisami Regulaminu komisji;
 - terminowo wprowadzać dane do systemu KSI (SIMIK 07-13) oraz SEZaM;
 - należy uszczegółowić zapisy *Rejestru odwołań* zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IP II stopnia;
 - terminowo przekazywać protesty do rozpatrzenia Wojewody oraz ponowną ocenę wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

IP II stopnia przekazała w lutym 2009 r. do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych zawartych w *Raporcie z systemowej wizyty sprawdzającej*.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym wykryto trzy nieprawidłowości, których wartości wynosiły odpowiednio:

- 867,24 Euro, tj. 3894,80 PLN (wg kursu 1 Euro = 4,491 PLN obowiązującego w czerwcu 2009 r., tzn. w miesiącu, w którym wydatek został zaksięgowany przez Instytucję Certyfikującą);
- 614,98 Euro, tj. 2550,00 PLN (wg kursu 1 Euro = 4,1465 PLN obowiązującego w styczniu 2009 r., tzn. w miesiącu, w którym wydatek został zaksięgowany przez Instytucję Certyfikującą);
- 53,65 Euro, tj. 222,47 PLN (wg kursu Euro = 4,1465 PLN obowiązującego w styczniu 2009 r., tzn. w miesiącu, w którym wydatek został zaksięgowany przez Instytucję Certyfikującą).

Zgodnie z dokumentem pn. *System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013* (dokument opracowany przez Pełnomocnika Rządu do Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej), ww. nieprawidłowości zostały zakwalifikowane jako niepodlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej. Informacje na temat przedmiotowych nieprawidłowości zostaną zgłoszone do komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie nieprawidłowości w III kwartale 2009 r.

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Kwoty nieprawidłowości, o których mowa w punkcie 3.4 niniejszego sprawozdania zostały w całości odzyskane przez IZ RPO WO 2007-2013.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

| | |
|---|---|
| Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans; | Data i miejsce: 18.08.2009 r. Opole |
| | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego |

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na etapie procesu oceny projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości, problemów i zagrożeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

Na etapie wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 2007-2013 była zobowiązana do 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania części dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. Od ww. terminu, czyli od czasu przyjęcia nowych wzorów umów o dofinansowanie projektu IZ RPO WO 2007-2013 nie ma obowiązku weryfikacji stosowania prawa zamówień publicznych przez Beneficjentów. Do czasu przyjęcia nowych wzorów umów o dofinansowanie projektu dokumentacja przetargowa sprawdzana była pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu przez pracowników IZ RPO WO 2007-2013. Do weryfikacji dokumentów dotyczących procedur przetargowych zostały wprowadzone listy sprawdzające poprawność stosowania Pzp przez Beneficjentów. W przypadku dokładniejszej weryfikacji dokumentacji przetargowej z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych istniała konieczność powołania ekspertów w dziedzinie Pzp. Na etapie rozliczania projektów w I półroczu 2009 r. nie stwierdzono naruszeń prawa zamówień publicznych.

Na etapie kontroli projektów IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła występowania problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. Wykryto jedną nieprawidłowość w tym zakresie, podczas przeprowadzania kontroli problemowej. IZ wymierzyła beneficjentowi karę finansową w postaci korekty w wysokości 5% kwoty dofinansowania wydatku kwalifikowanego objętego nieprawidłowością wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Beneficjent w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zwrócił w terminie całość nienależnie wypłaconej kwoty (zagadnienie opisano szerzej w punkcie 3.4 oraz 3.5).

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* są zgodne z:

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483).

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482).

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317).

Tabela 4a. Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu.

| Działanie/grupa operacji | Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł) | | | | |
|--------------------------|--|--|---|-----------|-----------|
| | Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy | Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny | Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej | | |
| | | | Typ przedsiębiorstwa | | |
| | | | małe | średnie | duże |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Działanie 1.1 | 5 877 458,97 | 1 037 198,62 | 100% | - | - |
| Działanie 1.3 | 244 800,00 | 43 200,00 | 100% | - | - |
| Działanie 1.4 | 2 576 060,42 | 454 598,92 | 100% | - | - |
| SUMA | 8 698 319,39 | 1 534 997,54 | 100% | 0% | 0% |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W I półroczu 2009 r. przekazano beneficjentom pierwsze środki stanowiące pomoc publiczną przedstawia powyższa Tabela 4a. W okresie sprawozdawczym odbiorcami pomocy publicznej zostały 33 przedsiębiorstwa realizujące projekty w ramach poddziałań 1.1.2 (21 projektów), 1.3.2 (1 projekt) oraz 1.4.1 (11 projektów). Są to projekty, które mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

Pomoc *de minimis* przekazana została na realizację 26 projektów na kwotę 7 375 100,52 PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), z czego 25 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast jeden projekt przez małe przedsiębiorstwo. W ramach tych projektów pomoc publiczna przeznaczona została m.in. na rozwój mikroprzedsiębiorstw poprzez budowę, przebudowę infrastruktury, zakup i unowocześnianie wyposażenia oraz świadczenie specjalistycznych usług doradczych.

Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 7 projektów na kwotę 2 858 216,41 PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Beneficjentami pomocy są mikroprzedsiębiorstwa (3 projekty) oraz małe przedsiębiorstwa (4 projekty). Wsparcie otrzymali beneficjenci realizujący nowe inwestycje polegające m.in. na budowie nowych restauracji, hoteli, moteli, spełniających rolę punktów turystycznych –rekreacyjnych oraz tworzący nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.

Wykres 14. Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej.

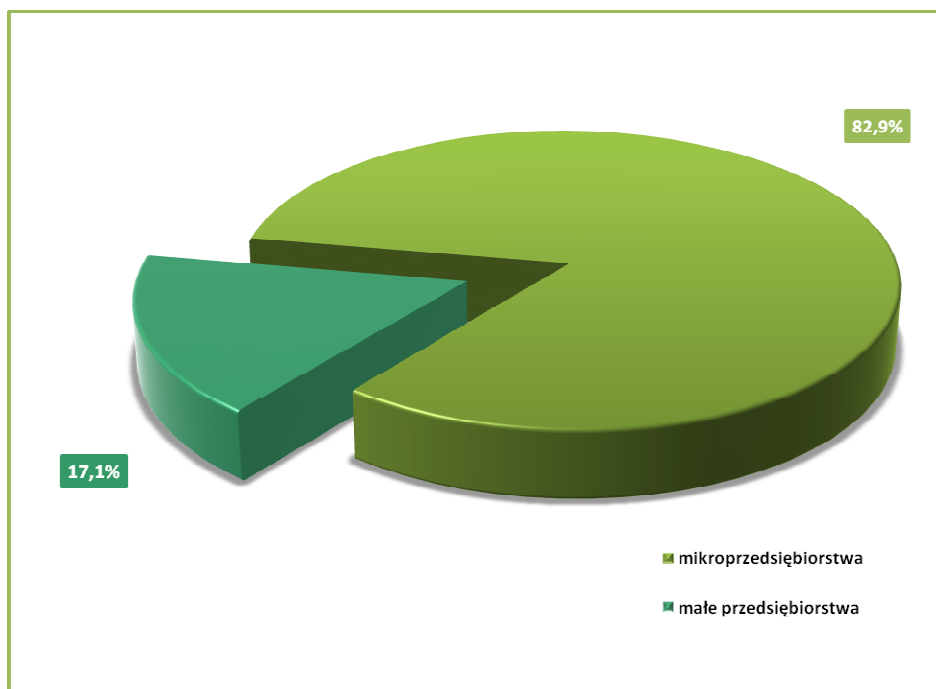

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali 4 projekty: każda z instytucji realizowała Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 (w ramach środków niewygasających z dniem 31 grudnia 2008 roku) oraz Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym zostało złożonych **17** wniosków o płatność o ogólnej wartości **3 771 657,55 PLN**, w tym **3 205 909,20 PLN** dofinansowania z EFRR. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii szkoleniowej oraz informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, analizami, ekspertyzami.

Tabela 21. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym).

| Lp. | Rodzaj wydatku | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie z EFRR |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 | 895 815,10 | 761 442,84 |
| 2. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 | 748,90 | 636,56 |
| 3. | Stworzenie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu | 77 227,05 | 65 642,99 |
| 4. | Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu | 185,54 | 157,71 |
| 5. | Tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów | 28 802,70 | 24 482,29 |
| 7. | Ewaluacje, analizy, ekspertyzy | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 | 836,66 | 711,16 |
| 9. | Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 1 003 615,95 | 853 073,55 |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 21. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie).

| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu | % środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej ⁹ |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szkolenia | - | 678 387,91 | 4,21% |
| 2. | Zatrudnienie | - | 8 022 190,69 | 49,79% |
| 3. | Sprzęt komputerowy | - | 2 766 481,07 | 17,17% |
| 4. | Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych | - | | |
| 5. | Promocja | - | 2 574 245,34 | 15,98% |
| 6. | Ekspertyzy/ doradztwo | - | 548 098,70 | 3,40% |
| 7. | Ewaluacje | - | | |
| 8. | Kontrola/audyt ¹⁰ | - | 35 700,00 | 0,22% |

⁹ Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartości należy wyliczyć w procentach jako iloraz: wartości dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR) * 100%. Suma w tej kolumnie powinna wynosić zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia.

¹⁰ W Sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r. omyłkowo wykazano błędną kwotę w tej kategorii.

| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu | % środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej ⁹ |
|--------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Organizacja procesu wyboru projektów | - | 539 959,15 | 3,35% |
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów | - | | |
| 11. | Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów | - | 804 839,75 | 5,00% |
| 12. | Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu | - | 142 359,79 | 0,88% |
| Razem | | 4 | 16 112 262,40 | |

Źródło: Opracowanie własne.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące problemy, zakłócające sprawną i efektywną realizację projektów w ramach pomocy technicznej:

I. W przypadku Beneficjenta – Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013

Część środków, ujętych w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w wysokości 1 273 748,00 PLN (100% wydatków) została zgłoszona w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 roku, w tym kwota 753.715,00 PLN (100% wydatków), dotycząca kategorii wydatków „Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013”. W związku z ujęciem części środków w ramach wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, termin finansowej i rzeczowej realizacji Roczno Planu Działań (RPDz) Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013, decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, został przesunięty do 30 czerwca 2009 roku.

Tak wysoka kwota środków niewygasających wynikała ze zbyt niskiego wydatkowania funduszy, ujętych w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 na lata 2007-2008 w kategorii wydatków dotyczącej zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków wyniknęło z kilku przesłanek, między innymi: obniżania proponowanych wysokości wynagrodzeń nowych pracowników oraz podwyżek, nagród i premii dla zatrudnionych już osób; kształtowania się wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013 na poziomie niższym, niż zaplanowano; długotrwałej procedury naboru i długich okresów wypowiedzeń pracowników, którzy przed podjęciem pracy w UMWO zatrudnieni byli w innych firmach; wstrzymania, w dniu 10 września 2008r. decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, naborów pozostałych pracowników do końca 2008 roku, a więc do końca okresu realizacji Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2007-2008 r.; braku możliwości – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – finansowania wynagrodzeń pracowników w 2009 roku ze środków niewygasających.

Duże oszczędności powstały również w kategorii „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu”. Z dniem 30 kwietnia 2008 r. ocena wniosków została zawieszona z uwagi na komunikat MRR i decyzję Zarządu

Województwa Opolskiego. Nabory wniosków o dofinansowanie zostały wznowione w dniu 20 maja 2008 roku (wraz z ogłoszeniem naboru wniosków do poddziałania 5.1.1. RPO WO 2007 – 2013). W związku z tym niemożliwe było wykorzystanie środków finansowych na pokrycie kosztów, związanych z procesem naboru i oceny projektów, na zakładanym poziomie.

Pozostałe oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczących między innymi dostawy materiałów biurowych i papieru oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla celów zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu.

II. W przypadku Beneficjenta – Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013

Beneficjent – Instytucja Pośrednicząca II stopnia, realizując projekt, napotkał na problemy związane z zachowaniem płynności finansowej w projekcie, które spowodowane były wymogami i procedurami związanymi z weryfikacją wniosków beneficjenta o płatność oraz brakiem środków dotacji rozwojowej na rachunku IZ. W związku z powyższym trzykrotnie zwracał się o refundację wydatków do Skarbnika Województwa Opolskiego. Po otrzymaniu drugiej transzy zaliczki – Beneficjent nie zrealizował wszystkich wydatków z uwagi na krótki termin (grudzień 2008 r.).

Zwrot niewykorzystanej kwoty RPDz w tym przypadku wynikał głównie z braku płynności finansowej w realizacji projektu, rozliczania zaliczek i refundacji jednocześnie, opóźnienia w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej dla beneficjenta, ujednoczenia ewidencji i klasyfikacji środków trwałych w całej jednostce (zwrócono środki majątkowe), krótkiego czasookresu wydatkowania środków niewygasających, braku możliwości wydatkowania bieżących wynagrodzeń, procedur związanych z realizacją zamówień publicznych oraz oszczędności przetargowych, rezygnacja pracowników ze studiów podyplomowych, zmiany organizacyjne w jednostce.

Dodatkowym problemem, dotyczącym funkcjonowania Beneficjentów pomocy technicznej RPO WO 2007-2013, było przekazanie z opóźnieniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej, która następnie została przekazana IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. W dużej mierze stało się to przyczyną nieosiągnięcia przez Beneficjentów pełnego zakresu rzeczowo-finansowego projektów.

Ze względu na niewykorzystanie środków w ramach środków niewygasających z dniem 31 grudnia 2008 r., na konto Instytucji Zarządzającej zwrócono łącznie **1 014 256,04 PLN**.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Dane dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zawarte są w załączniku nr IV *Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji*.

Załączniki:

1. Załącznik I. Tabela 1. *Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013*;
2. Załącznik II. Tabela 2. *Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco*;
3. Załącznik III. *Tabele finansowe do sprawozdania okresowego (RPO WO 2007-2013)*:
 - Tabela 1a. *Złożone wnioski o dofinansowanie / roczne plany działań oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych*;
 - Tabela 1b. *Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za*

wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych;

- Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu;
 - Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu;
 - Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu;
 - Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł;
 - Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu.
4. Załącznik IV. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

| | |
|--|---|
| Dane osoby sporządzającej sprawozdanie | Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Marta Sobańska |
| | Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 077 / 54-16-234, m.sobanska@umwo.opole.pl |
| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: 18.08.2009 r. Opole |
| | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego |
| | Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): 077 / 54-16-510, marszalek@umwo.opole.pl |
| | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: |

Załącznik I

Tabela 1. Postęp fizyczny RPO WO 2007-2013

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem | |
|--|--------------------|------|----|------|---------------------|----------|----|----------|----|------|----|------|------------|---------|----|------|----|------------|------------|----------|--------|
| | półroczne | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym: - w MSP | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | - | - | - | 24 szt. | - | - | - | - | 30 szt. | 30 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | - | 8 szt. | - | - | - | - | 10 szt. | 10 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 16 szt. | - | - | - | - | 20 szt. | 20 szt. | | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: - Mikro: do 9 pracujących, - Małe: 10–49 pracujących, | Realizacja | - | 0 | 0 | 6 szt. ¹ | 108 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 262 szt. | - | - | - | - | 1 047 szt. | - | - | - | - | 1 309 szt. | 1 309 szt. | | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 5 szt. ¹ | 70 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 204 szt. | - | - | - | - | 816 szt. | - | - | - | - | 1 020 szt. | 1 020 szt. | | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 1 szt. ¹ | 28 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 48 szt. | - | - | - | - | 192 szt. | - | - | - | - | 240 szt. | 240 szt. | | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem | |
|--|--------------------|------|----|------|----|---------|----|------|------------|---------|----|------|----|------------|----------|------|----|------|-------------|-------------|----------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| - Średnie: 50–249 pracujących oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia - przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 10 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | 10 szt. | - | - | - | - | 39 szt. | - | - | - | - | 49 szt. | 49 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 szt. | - | - | - | - | 112 szt. | - | - | - | - | 140 szt. | 140 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 18 szt. | - | - | - | - | 22 szt. | 22 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 27 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 szt. | - | - | - | - | 104 szt. | - | - | - | - | 130 szt. | 130 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym: - funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | 7 szt. | - | - | - | - | 29 szt. | - | - | - | - | 36 szt. | 36 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 23 szt. | - | - | - | - | 29 szt. | 29 szt. |
| Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | 2 mln euro | - | - | - | - | 8 mln euro | - | - | - | - | 10 mln euro | 10 mln euro | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|--------------------|------|----|------|---------------------|---------|----|---------------|----|------|----|------|---------------|------|----|------|----|--------------|----|--------------|
| | półroczne | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu | Realizacja | - | 0 | 0 | 2 szt. ¹ | 53 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 36 szt. | - | - | - | - | 139 szt. | - | - | - | - | 174 szt. | - | 174 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0,36 mln euro | - | - | - | - | 1,44 mln euro | - | - | - | - | 1,8 mln euro | - | 1,8 mln euro |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|--|------|----|------|---------------------|---------|----|---|----|------|----|------|---|------|----|------|----|---|----|------------|
| | półroczne | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1.1 | Rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Wsparcie instytucji otoczenia biznesu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | 5 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w: - innowacyjne przedsięwzięcia, | Realizacja | - | 0 | 0 | 4 szt. ¹ | 40 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 204 szt. | - | - | - | - | 816 szt. | - | - | - | - | 1 020 szt. | - | 1 020 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji | - | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|---|------|----|------|---------------------|---------|----|------------|----|------|----|------|---------|------------|----|---------|-------------|------|----|-------------|
| | półroczne | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| - przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 18 szt. | - | - | 22 szt. | - | - | - | 22 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania | Realizacja | - | 0 | 0 | 1 szt. ¹ | 15 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 21 szt. | - | - | - | - | - | 81,5 szt. | - | - | 102 szt. | - | - | 102 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 7 szt. | - | - | - | - | - | 29 szt. | - | - | 36 szt. | - | - | 36 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | - | 23 szt. | - | - | 29 szt. | - | - | 29 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba wspartych przedsiębiorstw | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 20 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 204 szt. | - | - | - | - | - | 816 szt. | - | - | 1 020 szt. | - | - | 1 020 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 mln euro | - | - | - | - | - | 8 mln euro | - | - | 10 mln euro | - | - | 10 mln euro |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 6: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | 3 szt. | - | - | 3 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 7: Liczba wspartych przedsiębiorstw | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 11 szt. | - | - | - | - | - | 45 szt. | - | - | 56 szt. | - | - | 56 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|---|------|----|------|----|---------|----|---------|----|------|----|------|---------|------|----|----------|----|------|----|----------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1.3 | Innowacje, badania, rozwój technologiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu B+R | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 16 szt. | - | - | 20 szt. | - | - | - | 20 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 9: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 16 szt. | - | - | 20 szt. | - | - | - | 20 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu B+R | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 8 szt. | - | - | 10 szt. | - | - | - | 10 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 11: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 28 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 24 szt. | - | - | - | - | 95 szt. | - | - | 119 szt. | - | - | - | 119 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mikro: do 9 pracujących ² | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 2 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Małe: 10-49 pracujących, | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 18 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 20 szt. | - | - | - | - | 79 szt. | - | - | 99 szt. | - | - | - | 99 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Średnie: 50-249 pracujących, | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 8 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 16 szt. | - | - | 20 szt. | - | - | - | 20 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem | |
|---|--|------|----|------|---------------------|---------|----|------|---------|---|----|------|----|----------|---|------|----|------|----------|---|----------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| Wskaźnik 17: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa: - Mikro: do 9 pracujących ² - Małe: 10-49 pracujących, -Średnie: 50-249 pracujących, oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania | Realizacja | - | 0 | 0 | 2 szt. ¹ | 40 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | 34 szt. | - | - | - | - | 136 szt. | - | - | - | - | 170 szt. | 170 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 1 szt. ¹ | 28 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana w trakcie realizacji | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 1 szt. ¹ | 10 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 szt. | - | - | - | - | 113 szt. | - | - | - | - | 141 szt. | 141 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 2 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | - | - | 23 szt. | - | - | - | - | 29 szt. | 29 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 9 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 13,5 szt. | - | - | - | - | 17 szt. | 17 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 18: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 13 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | 6 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|--------------------|------|----|------|----|------|----|--------------------|----|------|----|------|---------------------|------|----|------|----|---------------------|----|---------------------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | 5 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 60 km ³ | - | - | - | - | 240 km ³ | - | - | - | - | 300 km ³ | - | 300 km ³ |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|---|------|----|------|----|------|----|---|----|------|----|------|---|------|----|------|----|---|----|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 2.1 | Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | 1 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 60 km | - | - | - | - | 240 km | - | - | - | - | 300 km | - | 300 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2013 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2013 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2013 r. | - | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 „Transport”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|--------------------|----------|---|------|---------------------|---------|----|---------|----|------|----|------|---------|------|---------|------|----|------|----|---------|
| | | półrocze | | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 4 szt. ¹ | 22 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 13 szt. | - | - | - | - | 48 szt. | - | 60 szt. | - | - | - | - | 60 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym: | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 km | - | - | - | - | 9 km | - | 11 km | - | - | - | - | 11 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - regionalne (wojewódzkie), | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 km | - | - | - | - | 5 km | - | 6 km | - | - | - | - | 6 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - lokalne (powiatowe i gminne). | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 km | - | - | - | - | 4 km | - | 5 km | - | - | - | - | 5 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 km |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 18 km | - | - | - | - | 74 km | - | 93 km | - | - | - | - | 93 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - regionalne (wojewódzkie), | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 km |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 6 km | - | - | - | - | 24 km | - | 30 km | - | - | - | - | 30 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - lokalne (powiatowe i gminne). | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 12 km | - | - | - | - | 50 km | - | 63 km | - | - | - | - | 63 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego | Realizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 10 szt. | - | 12 szt. | - | - | - | - | 12 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|-------------------------------|------|----|------|---------------------|---------|----|---------|----|------|----|------|---------|------|----|---------|----|------|----|---------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 3.1 | Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Drogi regionalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu | Realizacja | - | 0 | 0 | 3 szt. ¹ | 3 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | 4 szt. | - | - | - | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Długość nowych dróg | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 km | - | - | - | - | 5 km | - | - | 6 km | - | - | - | 6 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 7 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 km |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 6 km | - | - | - | - | 24 km | - | - | 30 km | - | - | - | 30 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Drogi lokalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu transportu | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 18 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 10 szt. | - | - | - | - | 40 szt. | - | - | 50 szt. | - | - | - | 50 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Długość nowych dróg | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 km | - | - | - | - | 4 km | - | - | 5 km | - | - | - | 5 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 6: Długość zrekonstruowanych dróg | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 12 km | - | - | - | - | 50 km | - | - | 63 km | - | - | - | 63 km |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Transport publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu transportu | Realizacja | - | 0 | 0 | 1 szt. ¹ | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | 6 szt. | - | - | - | 6 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 8: Liczba zakupionych środków transportu publicznego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 10 szt. | - | - | 12 szt. | - | - | - | 12 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|--------------------|----------|---|------|----|---------|----|--------|----|------|----|------|--------|------|----|------|----|--------|----|---------|
| | | półrocze | | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 12 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 7 szt. | - | - | - | - | 9 szt. | - | 9 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | 3 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | - | - | 8 szt. | - | 8 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|--|----------|---|------|----|---------|----|--------|----|------|----|------|--------|------|----|------|----|--------|----|---------|
| | | półrocze | | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 4.1 | Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 12 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 7 szt. | - | - | - | - | 9 szt. | - | 9 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | 3 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|---|----------|---|------|---|--------|---|--------|---|------|---|------|--------|------|---|------|---|--------|--------|--------|
| | | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 21 km | - | - | - | - | 86 km | - | - | - | - | 107 km | 107 km | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 5 km | - | - | - | - | 21 km | - | - | - | - | 26 km | 26 km | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | 2 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 6: Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych składowisk | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | 2 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 7: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | 2 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | 2 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | - | - | 8 szt. | 8 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 10: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | 2 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|--|------|----|------|----|------|----|------|---|------|----|------|----|---|----|------|----|------|---|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 11: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych | Cel | - | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 12: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru | Cel | - | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 13: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba jednostek wytwarzania energii ciepłej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego | Cel | - | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 14: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z biomasy | Cel | - | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 15: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności | Cel | - | - | - | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - | - | - | - | wartość docelowa zostanie oszacowana do końca 2010 r. | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|--------------------|------|----|------|----------------------|----------|----|--------|----|------|----|------|---------|------|----|---------|----|------|----------|---------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 11 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 8 szt. | - | - | 10 szt. | - | - | 10 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 8 szt. | - | - | 10 szt. | - | - | 10 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia | Realizacja | - | 0 | 0 | 13 szt. ¹ | 13 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 18 szt. | - | - | 22 szt. | - | - | 22 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: - szpitale i kliniki | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 14 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 18 szt. | - | - | 22 szt. | - | - | 22 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 14 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 9 szt. | - | - | 11 szt. | - | - | 11 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 126 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 7 szt. | - | - | 9 szt. | - | - | 9 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 2 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | 6 szt. | - | - | 6 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 7: Liczba obiektów kultury objętych wsparciem ⁴ | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | 3 szt. | - | - | 3 szt. | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|-----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|-----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1 | Wsparcie infrastruktury edukacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1.1 | Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---------|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---------|
| Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 11 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1.2 | Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|--------|
| Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu edukacji | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | 6 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 6: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | 6 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 7: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | 6 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.2 | Rozwój bazy medycznej w regionie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.2.1 | Stacjonarna opieka medyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|----------------------|---------|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---------|
| Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia | Realizacja | - | 0 | 0 | 13 szt. ¹ | 13 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | - | - | 7 szt. | - | 7 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|--|------|----|------|----|----------|----|--------|----|------|----|------|---------|------|----|------|----|---------|----|----------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 9: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 14 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 9 szt. | - | - | - | - | 11 szt. | - | 11 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 10: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | 3 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 11: Liczba zakupionego sprzętu medycznego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 126 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Ambulatoryjna opieka medyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 12: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 12 szt. | - | - | - | - | 15 szt. | - | 15 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 13: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 9 szt. | - | - | - | - | 11 szt. | - | 11 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 14: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 7 szt. | - | 7 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 15: Liczba zakupionego sprzętu medycznego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | 5 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 16: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 2 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 5 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | 6 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 17: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem ⁴ | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | 3 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 18: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | 3 szt. | - | 3 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|---|--------------------|------|----|------|----|------|----|--------|----|------|----|------|--------|------|----|--------|----|------|--------|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 19: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 20: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | 1 szt. | - | - | 1 szt. | 1 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 21: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | 2 szt. | - | - | 2 szt. | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|--------------------|------|----|------|----|------|----|--------|----|------|----|------|----|--------|----|------|----|------|--------|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | - | - | 8 szt. | 8 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | 4 szt. | 4 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem |
|--|--|------|----|------|----|------|----|--------|----|------|----|------|--------|------|----|--------|----|------|----|--------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 6.1 | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | 8 szt. | - | - | - | 8 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 6 szt. | - | - | 8 szt. | - | - | - | 8 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | 2 szt. | - | - | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | 2 szt. | - | - | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Zagospodarowanie terenów zdegradowanych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 5: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | 2 szt. | - | - | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 6: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | 2 szt. | - | - | - | 2 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem | |
|--|--------------------|------------|----|------|----|---------------|---------|----------------|----|------|----|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------|---------------|
| | półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: ⁵ - kobiety, - mężczyźni | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 90 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 szt. (EPC) | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 105 szt. (EPC) | - | - | - | - | 105 szt. ⁶ (EPC) | - | - | 105 szt. (EPC) | - | - | - | 105 szt. (EPC) | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 70 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 szt. (EPC) |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 78 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | 78 szt. ⁶ (EPC) | - | - | 78 szt. (EPC) | - | - | - | 78 szt. (EPC) |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 20 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 szt. (EPC) |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 27 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | 27 szt. ⁶ (EPC) | - | - | 27 szt. (EPC) | - | - | 27 szt. (EPC) |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik 2: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 85 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 szt. |
| Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) | Cel | - | - | - | - | - | - | 232 szt. | - | - | - | - | - | 232 szt. ⁶ | - | - | 232 szt. | - | - | 232 szt. | |
| Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 151 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 szt. | |
| Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów | Cel | - | - | - | - | - | - | 100 szt. | - | - | - | - | - | 400 szt. | - | - | 500 szt. | - | - | 500 szt. | |
| Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 4: | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 17 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 szt. | |
| Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów | Cel | - | - | - | - | - | - | 12 szt. | - | - | - | - | - | 50 szt. | - | - | 63 szt. | - | - | 63 szt. | |
| Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki na poziomie kategorii

| Wskaźniki | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Ogółem | |
|--|---|------------|---|------|---|---------------|---------|----------------|---|------|---|------|----------------|------|---|----------------|---|------|---|----------------|---------------|
| | | półrocz | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | | |
| Kat 85 | Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: ⁵ - kobiety, - mężczyźni | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 90 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 szt. (EPC) | |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 105 szt. (EPC) | - | - | - | - | 105 szt. (EPC) | - | - | 105 szt. (EPC) | - | - | - | 105 szt. (EPC) | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 70 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 szt. (EPC) |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 78 szt. (EPC) | - | - | - | - | 78 szt. (EPC) | - | - | 78 szt. (EPC) | - | - | - | 78 szt. (EPC) | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 20 szt. (EPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 szt. (EPC) |
| | Cel | - | - | - | - | - | - | 27 szt. (EPC) | - | - | - | - | 27 szt. (EPC) | - | - | 27 szt. (EPC) | - | - | - | 27 szt. (EPC) | |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 85 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 szt. |
| Cel | - | - | - | - | - | - | - | 232 szt. | - | - | - | - | 232 szt. | - | - | 232 szt. | - | - | - | 232 szt. | |
| Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kat 86 | Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 151 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 szt. | |
| Cel | - | - | - | - | - | - | - | 100 szt. | - | - | - | - | 400 szt. | - | - | 500 szt. | - | - | - | 500 szt. | |
| Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów | Realizacja | - | 0 | 0 | 0 | 17 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 szt. |
| | Cel | - | - | - | - | - | 12 szt. | - | - | - | 50 szt. | - | - | 63 szt. | - | - | - | - | 63 szt. |
| | Sytuacja wyjściowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Umowy zostały podpisane w 2008 r., jednak nie wykazano ich w sprawozdaniu okresowym za II połowę 2008 r. (stosowano wówczas inną metodologię ich obliczania i nie było podstaw do ich uwzględnienia). Od momentu sporządzania sprawozdania rocznego za 2008 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła metodologię, iż wskaźniki odnoszące się do tzw. *Liczby projektów...* oblicza na podstawie liczby podpisanych umów, a nie na podstawie końcowych wniosków o płatność, jak w przypadku wszystkich pozostałych wskaźników.

² Wskaźnik zostanie dodany przy aktualizacji *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*.

³ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

⁴ Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Podczas renegotjacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

⁵ Jednostka miary wskaźnika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Zmiana jednostki miary wskaźnika zostanie zmieniona podczas renegotjacji Programu.

⁶ Wykazane wartości zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Będą przedmiotem renegotjacji Programu.

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w PLN)¹ w danym roku oraz narastająco

| | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
|--|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | Okres sprawozdawczy 1.01.2009 - 30.06.2009 | | | | | | Dane narastająco od uruchomienia programu | | | | | |
| Oś priorytetowa 1 (EFRR) | 9 408 350,00 | 9 408 350,00 | n/d | 7 189 348,42 | 1,01 | | 9 408 350,00 | 9 408 350,00 | n/d | 8 698 319,39 | 1,22 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 9 408 350,00 | 9 408 350,00 | n/d | 7 189 348,42 | 1,01 | | 9 408 350,00 | 9 408 350,00 | n/d | 8 698 319,39 | 1,22 | |
| Oś priorytetowa 2 (EFRR) | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| Oś priorytetowa 3 (EFRR) | 51 711 179,07 | 51 711 179,07 | n/d | 1 697 950,45 | 0,42 | | 53 041 694,22 | 53 041 694,22 | n/d | 2 822 501,85 | 0,57 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 51 711 179,07 | 51 711 179,07 | n/d | 1 697 950,45 | 0,42 | | 53 041 694,22 | 53 041 694,22 | n/d | 2 822 501,85 | 0,57 | |
| Oś priorytetowa 4 (EFRR) | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |

| | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
|--|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | Okres sprawozdawczy 1.01.2009 - 30.06.2009 | | | | | | Dane narastająco od uruchomienia programu | | | | | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| Oś priorytetowa 5 (EFRR) | 10 182 506,04 | 10 182 506,04 | n/d | 3 215 443,52 | 1,67 | | 12 174 016,77 | 12 174 016,77 | n/d | 4 298 780,06 | 2,24 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 43 200,00 | 43 200,00 | n/d | 24 190,51 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 10 182 506,04 | 10 182 506,04 | n/d | 3 215 443,52 | 1,67 | | 12 130 816,77 | 12 130 816,77 | n/d | 4 274 589,55 | 2,23 | |
| Oś priorytetowa 6 (EFRR) | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |
| Oś priorytetowa 7 (EFRR) | 3 771 657,55 | 3 771 657,55 | n/d | 187 261,30 | 0,33 | | 10 717 521,28 | 10 717 521,28 | n/d | 6 091 244,65 | 10,57 | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | |

| | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
|---|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | Okres sprawozdawczy 1.01.2009 - 30.06.2009 | | | | | | Dane narastająco od uruchomienia programu | | | | | |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 3 771 657,55 | 3 771 657,55 | n/d | 187 261,30 | 0,33 | | 10 717 521,28 | 10 717 521,28 | n/d | 6 091 244,65 | 10,57 | |
| OGÓLEM | 75 073 692,66 | 75 073 692,66 | n/d | 12 290 003,69 | 0,64 | 1 639 639,09 | 85 341 582,27 | 85 341 582,27 | n/d | 21 910 845,95 | 1,14 | 1 639 639,09 |
| Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR | 0,00 | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 | | 43 200,00 | 43 200,00 | n/d | 24 190,51 | 0,00 | |
| Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | |

UWAGI:

- 1) za wyjątkiem kolumny "Łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej", które wykazane są w Euro
- 2) Kolumna pod nazwą " Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)" nie obejmuje części rozliczonych zaliczek. Wynika to z faktu, iż wnioski wyłącznie rozliczające zaliczki w KSI (SIMIK 07-13) nie zawierają daty wypłaty środków, wtedy nie traktujemy ich jako zrealizowanych (zgodnie z zasadą przyjętą przy sporządzaniu informacji miesięcznych z realizacji RPO WO 2007-2013). Rzeczywista kwota płatności zrealizowanych, obejmujących refundacje i wszystkie rozliczone zaliczki, w okresie sprawozdawczym wynosi 51 053 918,93 PLN. Natomiast od uruchomienia programu 60 674 761,19 PLN.
- 3) Wnioski na kwotę 1 991 510, 73 PLN (wydatki kwalifikowalne), w tym 1 083 336,54 PLN (EFRR) w ramach Osi 5 zostały zatwierdzone i wypłacone w grudniu 2008 r., ale wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) w styczniu i lutym 2009 r. dlatego wykazano je jedynie od uruchomienia programu
- 4) Wniosek na kwotę 141 398,41 PLN (wydatki kwalifikowalne), w tym 120 188,65 PLN z EFRR w ramach Osi 7 zostały zatwierdzone i wypłacone w grudniu 2008 r., ale wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) w styczniu 2009 r., dlatego wykazano je jedynie od uruchomienia programu.
- 5) Wniosek zawierający *cross-financing* zatwierdzono i wypłacono w grudniu 2009 r., jednak do systemu wprowadzono go w lutym 2009 r., więc wykazano go jedynie od uruchomienia programu.

Załącznik III

TABELE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO ¹⁾²⁾

Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie / roczne plany działań oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według osi priorytetowych (w PLN) - RPO WO 2007-2013

| | Złożone wnioski o dofinansowanie / roczne plany działań ³⁾ | | | | | Zawarte umowy / wydane decyzje o dofinansowanie | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|---|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------|--|--|
| | Liczba | | Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia programu | | | Liczba | | Wartość przyznanego dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia programu | | | |
| | W okresie sprawozdawczym | Od uruchomienia programu | Odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁴⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu | W okresie sprawozdawczym | Od uruchomienia programu | Ogółem | Odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁵⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Oś 1. | 4 | 421 | 350 187 918,05 | 49,28% | 46,52% | 115 | 121 | 138 400 814,52 | 121 929 716,45 | 17,16% | 0,55% |
| Oś 2. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Oś 3. | 36 | 40 | 210 959 684,75 | 42,25% | 23,16% | 18 | 22 | 134 103 367,86 | 134 103 367,86 | 26,86% | 21,06% |
| Oś 4. | 1 | 18 | 118 681 981,80 | 61,80% | 53,60% | 13 | 13 | 87 868 518,22 | 87 868 518,22 | 45,75% | 0,00% |
| Oś 5. | 44 | 69 | 191 355 949,46 | 99,64% | 51,52% | 13 | 26 | 101 572 467,16 | 101 572 467,16 | 52,89% | 19,41% |
| Oś 6. | 0 | 1 | 19 251 879,85 | 12,53% | 12,53% | 1 | 1 | 18 204 515,71 | 18 204 515,71 | 11,85% | 0,00% |
| Oś 7. | 0 | 4 | 16 731 295,20 | 29,04% | 29,04% | 0 | 4 | 16 112 262,40 | 16 112 262,40 | 27,97% | 29,04% |
| Ogółem | 85 | 553 | 907 168 709,11 | 47,24% | 35,62% | 160 | 187 | 496 261 945,87 | 479 790 847,80 | 24,98% | 8,49% |

¹⁾ Kwoty wnioskowanego, przyznanego oraz wypłaconego dofinansowania w części odpowiadającej środkom UE wykazywane w tabelach wylicza się jako iloczyn wnioskowanego / przyznanego / wypłaconego dofinansowania oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczególnym opisie priorytetu

²⁾ Tabele 2a, 2b i 3b nie są wypełniane w przypadku RPO

³⁾ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13)

⁴⁾ Liczone w relacji do kolumny 3

⁵⁾ Liczone w relacji do kolumny 9

Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w ramach osi priorytetowych (w PLN) - RPO WO 2007-2013

| Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność od uruchomienia programu | | | | | Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE | | | | Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC (w części odpowiadającej środkom UE) | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------------------|---|--|---------------|
| Ogółem | Wydatki kwalifikowalne ⁶⁾ | Wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁷⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu | W okresie sprawozdawczym ⁸⁾ | Od uruchomienia programu | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ⁹⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu | W okresie sprawozdawczym | Od uruchomienia programu | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 ¹⁰⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007 - 2013 na koniec poprzedniego okresu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 28 888 236,46 | 22 839 427,34 | 9 741 997,09 | 1,37% | 0,00% | 7 189 348,42 | 8 698 319,39 | 1,22% | 0,00% | 3 094 126,14 | 3 094 126,14 | 0,44% | 0,00% | Oś. 1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Oś. 2 |
| 53 041 694,22 | 53 041 694,22 | 37 262 519,43 | 7,46% | 0,23% | 1 697 950,45 | 2 822 501,85 | 0,57% | 0,23% | 34 242 923,68 | 34 242 923,68 | 6,86% | 0,00% | Oś. 3 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Oś. 4 |
| 12 413 767,71 | 12 174 016,77 | 6 867 717,19 | 3,58% | 0,00% | 3 215 443,52 | 4 298 780,06 | 2,24% | 0,00% | 2 709 875,45 | 2 709 875,45 | 1,41% | 0,00% | Oś. 5 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Oś. 6 |
| 10 717 521,28 | 10 717 521,28 | 9 109 892,55 | 15,81% | 10,04% | 187 261,30 | 6 091 244,65 | 10,57% | 10,04% | 7 925 818,12 | 7 925 818,12 | 13,76% | 0,00% | Oś. 7 |
| 105 061 219,67 | 98 772 659,61 | 62 982 126,26 | 3,28% | 0,36% | 12 290 003,69 | 21 910 845,95 | 1,14% | 0,36% | 47 972 743,39 | 47 972 743,39 | 2,50% | 0,00% | Ogółem |

⁶⁾ Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

⁷⁾ Liczone w relacji do kolumny 3

⁸⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

⁹⁾ Liczone w relacji do kolumny 7

¹⁰⁾ Liczone w relacji do kolumny 11

UWAGI:

- 1) Wnioski na kwotę 1 508 970,97 PLN w ramach Osi 1 zostały wypłacone w grudniu 2008 r., ale wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) w styczniu 2009 r. dlatego wykazano je jedynie w kolumnie 7 od uruchomienia programu
- 2) Wnioski na kwotę 1 083 336,54 PLN w ramach Osi 5 zostały wypłacone w grudniu 2008 r., ale wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) w styczniu i lutym 2009 r. dlatego wykazano je jedynie w kolumnie 7 od uruchomienia programu
- 3) Wnioski na kwotę 120 188,65 PLN w ramach Osi 7 zostały wypłacone w grudniu 2008 r., ale wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) w styczniu 2009 r. dlatego wykazano je jedynie w kolumnie 7 od uruchomienia programu
- 4) Płatności zrealizowane (kolumna 6 i 7) nie obejmują części rozliczonych zaliczek. Wynika to z faktu, iż wnioski wyłącznie rozliczające zaliczki w KSI (SIMIK 07-13) nie zawierają daty wypłaty środków, wtedy nie traktujemy ich jako zrealizowanych (zgodnie z zasadą przyjętą przy sporządzaniu informacji miesięcznych z realizacji RPO WO 2007-2013). Rzeczywista kwota płatności zrealizowanych, obejmujących refundacje i wszystkie rozliczone zaliczki, w okresie sprawozdawczym wynosi 51 053 918,93 PLN. Natomiast od uruchomienia programu 60 674 761,19 PLN.

Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu (w PLN)¹¹⁾ - RPO WO 2007-2013

| Oś priorytetowa | Ogółem | Środki publiczne | | | | | | | | | Środki prywatne | Środki z pożyczek EBI | Procentowy udział wkładu funduszy (13=(3/1)*100) ¹²⁾ |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | Ogółem | Środki wspólnotowe | | | Środki publiczne krajowe | | | | | | | |
| | | | Ogółem | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Społeczny | Fundusz Spójności | Ogółem | Budżet państwa | Jednostki samorządu terytorialnego | Inne | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oś. 1 | 20 061 783,17 | 10 233 316,93 | 8 698 319,39 | 8 698 319,39 | 0,00 | 0,00 | 1 534 997,54 | 1 534 997,54 | 0,00 | 0,00 | 9 828 466,24 | 0,00 | 85,00 |
| Oś. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś. 3 | 4 993 048,48 | 4 993 048,48 | 2 822 501,85 | 2 822 501,85 | 0,00 | 0,00 | 2 170 546,63 | 0,00 | 2 170 546,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 |
| Oś. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś. 5 | 7 586 629,03 | 7 265 503,81 | 4 298 780,06 | 4 298 780,06 | 0,00 | 0,00 | 2 966 723,75 | 0,00 | 1 613 529,22 | 1 353 194,53 | 321 125,22 | 0,00 | 59,17 |
| Oś. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś. 7 | 7 166 171,15 | 7 166 171,15 | 6 091 244,65 | 6 091 244,65 | 0,00 | 0,00 | 1 074 926,50 | 0,00 | 1 074 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Ogółem dla programu | 39 807 631,83 | 29 658 040,37 | 21 910 845,95 | 21 910 845,95 | 0,00 | 0,00 | 7 747 194,42 | 1 534 997,54 | 4 859 002,35 | 1 353 194,53 | 10 149 591,46 | 0,00 | 73,88 |

¹¹⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

¹²⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 13 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (13=3/2)

UWAGI:

- 1) Płatności zrealizowane (kolumna 4) nie obejmują części rozliczonych zaliczek. Wynika to z faktu, iż wnioski wyłącznie rozliczające zaliczki w KSI (SIMIK 07-13) nie zawierają daty wypłaty środków, wtedy nie traktujemy ich jako zrealizowanych (zgodnie z zasadą przyjętą przy sporządzaniu informacji miesięcznych z realizacji RPO WO 2007-2013). Rzeczywista kwota płatności zrealizowanych, obejmujących refundacje i wszystkie rozliczone zaliczki, od uruchomienia programu wynosi 60 674 761,19 PLN.
- 2) W ramach *Osi priorytetowej 5* obecnie wykazane zostały wydatki prywatne, lecz w ramach projektu w którym wykazane zostały środki prywatne jako wkład własny, zostanie podpisany aneks, ze zmianą ze środków prywatnych na środki jednostki samorządu terytorialnego

Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu (w PLN)¹³⁾ - RPO WO 2007-2013

| Oś priorytetowa | Ogółem | Środki publiczne | | | | | | Środki prywatne | Procentowy udział wkładu funduszy (9=(3/1)*100) ¹⁴⁾ |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | Ogółem | Środki wspólnotowe | | | Środki publiczne krajowe | | | |
| | | | Ogółem | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Społeczny | | Fundusz Spójności | | |
| | | | | 1=2+8 | 2=3+7 | | 3=4+5+6 | | |
| Oś .1 | 3 640 148,41 | 3 640 148,41 | 3 094 126,14 | 3 094 126,14 | 0,00 | 0,00 | 546 022,27 | 0,00 | 85,00% |
| Oś .2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś .3 | 47 815 453,72 | 47 815 453,72 | 34 242 923,68 | 34 242 923,68 | 0,00 | 0,00 | 13 572 530,04 | 0,00 | 71,61% |
| Oś .4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś .5 | 4 812 853,80 | 4 812 853,80 | 2 709 875,45 | 2 709 875,45 | 0,00 | 0,00 | 2 102 978,35 | 0,00 | 56,30% |
| Oś .6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś .7 | 9 324 492,42 | 9 324 492,42 | 7 925 818,12 | 7 925 818,12 | 0,00 | 0,00 | 1 398 674,30 | 0,00 | 85,00% |
| Ogółem dla programu | 65 592 948,35 | 65 592 948,35 | 47 972 743,39 | 47 972 743,39 | 0,00 | 0,00 | 17 620 204,96 | 0,00 | 73,14% |

¹³⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

¹⁴⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (9=3/2)

UWAGI:

W lipcu 2009 r. została złożona korekta do wniosku od IZ do IC zarejestrowanego w systemie KSI (SIMIK 07-13) w okresie sprawozdawczym

Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do Komisji Europejskiej, od uruchomienia programu, (w Euro) ¹⁵⁾ - RPO WO 2007-2013

| Oś priorytetowa | Ogółem | Środki publiczne | | | | | | Środki prywatne | Procentowy udział wkładu funduszy (9=3/1*100) ¹⁶⁾ |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | Ogółem | Środki wspólnotowe | | | Środki publiczne krajowe | | | |
| | | | Ogółem | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Społeczny | | Fundusz Spójności | | |
| | 1=2+8 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Oś .1 | 810 542,96 | 810 542,96 | 688 961,51 | 688 961,51 | 0,00 | 0,00 | 121 581,45 | 0,00 | 85,00% |
| Oś .2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś .3 | 10 578 494,31 | 10 578 494,31 | 7 589 703,44 | 7 589 703,44 | 0,00 | 0,00 | 2 988 790,87 | 0,00 | 71,75% |
| Oś .4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś .5 | 1 049 616,14 | 1 049 616,14 | 591 406,51 | 591 406,51 | 0,00 | 0,00 | 458 209,63 | 0,00 | 56,35% |
| Oś .6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś .7 | 2 143 148,88 | 2 143 148,88 | 1 821 676,43 | 1 821 676,43 | 0,00 | 0,00 | 321 472,45 | 0,00 | 85,00% |
| Ogółem dla programu | 14 581 802,29 | 14 581 802,29 | 10 691 747,89 | 10 691 747,89 | 0,00 | 0,00 | 3 890 054,40 | 0,00 | 73,32% |

¹⁵⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

¹⁶⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 9 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (9=3/2)

Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatniczych, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN)¹⁷ - RPO WO 2007-2013

| Oś priorytetowa | Ogółem | Środki publiczne | | | | | | | | | Środki prywatne | Procentowy udział wkładu funduszy (12=3/1) ¹⁸ |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Ogółem | Środki wspólnotowe | | | | Środki publiczne krajowe | | | | | |
| | | | Ogółem | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Społeczny | Fundusz Spójności | Ogółem | Budżet państwa | Jednostki samorządu terytorialnego | Inne | | |
| 0 | 1=2+11 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Oś priorytetowa 1 | 151 276 343,00 | 104 659 906,00 | 66 894 166,00 | 66 894 166,00 | 0,00 | 0,00 | 37 765 740,00 | 8 525 101,00 | 27 589 372,00 | 1 651 267,00 | 46 616 437,00 | 63,92 |
| Kwartał III | 20 021 350,00 | 20 007 134,00 | 8 028 422,00 | 8 028 422,00 | 0,00 | 0,00 | 11 978 712,00 | 700 048,00 | 10 222 016,00 | 1 056 648,00 | 14 216,00 | 40,13 |
| Kwartał IV | 30 573 767,00 | 30 532 985,00 | 12 863 925,00 | 12 863 925,00 | 0,00 | 0,00 | 17 669 060,00 | 737 148,00 | 16 589 635,00 | 342 277,00 | 40 782,00 | 42,13 |
| Kwartał I | 43 606 719,00 | 22 897 519,00 | 19 462 891,00 | 19 462 891,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 628,00 | 3 210 070,00 | 224 558,00 | 0,00 | 20 709 200,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 57 074 507,00 | 31 222 268,00 | 26 538 928,00 | 26 538 928,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 340,00 | 3 877 835,00 | 553 163,00 | 252 342,00 | 25 852 239,00 | 85,00 |
| Oś priorytetowa 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Kwartał III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Kwartał IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Kwartał I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Kwartał II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Oś priorytetowa 3 | 84 294 880,00 | 82 925 487,00 | 60 932 231,00 | 60 932 231,00 | 0,00 | 0,00 | 21 993 256,00 | 223 827,00 | 21 769 429,00 | 0,00 | 1 369 393,00 | 73,48 |
| Kwartał III | 33 820 632,00 | 33 820 632,00 | 23 478 652,00 | 23 478 652,00 | 0,00 | 0,00 | 10 341 980,00 | 0,00 | 10 341 980,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42 |
| Kwartał IV | 20 229 175,00 | 20 229 175,00 | 12 924 907,00 | 12 924 907,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304 268,00 | 0,00 | 7 304 268,00 | 0,00 | 0,00 | 63,89 |
| Kwartał I | 12 458 991,00 | 12 458 991,00 | 10 590 142,00 | 10 590 142,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 849,00 | 0,00 | 1 868 849,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 17 786 082,00 | 16 416 689,00 | 13 938 530,00 | 13 938 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 159,00 | 223 827,00 | 2 254 332,00 | 0,00 | 1 369 393,00 | 84,90 |
| Oś priorytetowa 4 | 83 342 816,00 | 73 873 392,00 | 55 138 300,00 | 55 138 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 735 092,00 | 1 537 362,00 | 15 428 909,00 | 1 768 821,00 | 9 469 424,00 | 74,64 |
| Kwartał III | 17 978 482,00 | 17 978 482,00 | 11 168 832,00 | 11 168 832,00 | 0,00 | 0,00 | 6 809 650,00 | 0,00 | 5 897 091,00 | 912 559,00 | 0,00 | 62,12 |
| Kwartał IV | 15 267 511,00 | 15 267 511,00 | 9 436 179,00 | 9 436 179,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831 332,00 | 0,00 | 5 017 156,00 | 814 176,00 | 0,00 | 61,81 |
| Kwartał I | 23 863 627,00 | 19 128 915,00 | 16 259 578,00 | 16 259 578,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 337,00 | 827 155,00 | 2 042 182,00 | 0,00 | 4 734 712,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 26 233 196,00 | 21 498 484,00 | 18 273 711,00 | 18 273 711,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 773,00 | 710 207,00 | 2 472 480,00 | 42 086,00 | 4 734 712,00 | 85,00 |
| Oś priorytetowa 5 | 114 013 966,00 | 114 013 966,00 | 75 748 076,00 | 75 748 076,00 | 0,00 | 0,00 | 38 265 890,00 | 0,00 | 28 357 576,00 | 9 908 314,00 | 0,00 | 66,44 |
| Kwartał III | 57 827 536,00 | 57 827 536,00 | 33 144 188,00 | 33 144 188,00 | 0,00 | 0,00 | 24 683 348,00 | 0,00 | 20 124 699,00 | 4 558 649,00 | 0,00 | 57,32 |
| Kwartał IV | 27 790 246,00 | 27 790 246,00 | 18 467 132,00 | 18 467 132,00 | 0,00 | 0,00 | 9 323 114,00 | 0,00 | 7 247 441,00 | 2 075 673,00 | 0,00 | 66,45 |
| Kwartał I | 14 198 092,00 | 14 198 092,00 | 12 068 378,00 | 12 068 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 714,00 | 0,00 | 492 718,00 | 1 636 996,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 14 198 092,00 | 14 198 092,00 | 12 068 378,00 | 12 068 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 714,00 | 0,00 | 492 718,00 | 1 636 996,00 | 0,00 | 85,00 |
| Oś priorytetowa 6 | 21 830 195,00 | 14 999 283,00 | 12 749 391,00 | 12 749 391,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 892,00 | 443 456,00 | 789 119,00 | 1 017 317,00 | 6 830 912,00 | 85,00 |
| Kwartał III | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał IV | 3 281 688,00 | 3 281 688,00 | 2 789 435,00 | 2 789 435,00 | 0,00 | 0,00 | 492 253,00 | 0,00 | 0,00 | 492 253,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał I | 4 756 556,00 | 2 499 596,00 | 2 124 657,00 | 2 124 657,00 | 0,00 | 0,00 | 374 939,00 | 0,00 | 322 018,00 | 52 921,00 | 2 256 960,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 11 641 951,00 | 7 067 999,00 | 6 007 799,00 | 6 007 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 200,00 | 443 456,00 | 467 101,00 | 149 643,00 | 4 573 952,00 | 85,00 |
| Oś priorytetowa 7 | 8 105 367,00 | 8 105 367,00 | 6 889 562,00 | 6 889 562,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 805,00 | 0,00 | 1 215 805,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał III | 2 526 465,00 | 2 526 465,00 | 2 147 495,00 | 2 147 495,00 | 0,00 | 0,00 | 378 970,00 | 0,00 | 378 970,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał IV | 2 067 328,00 | 2 067 328,00 | 1 757 229,00 | 1 757 229,00 | 0,00 | 0,00 | 310 099,00 | 0,00 | 310 099,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał I | 1 755 787,00 | 1 755 787,00 | 1 492 419,00 | 1 492 419,00 | 0,00 | 0,00 | 263 368,00 | 0,00 | 263 368,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 1 755 787,00 | 1 755 787,00 | 1 492 419,00 | 1 492 419,00 | 0,00 | 0,00 | 263 368,00 | 0,00 | 263 368,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| Ogółem | 462 863 567,00 | 398 577 401,00 | 278 351 726,00 | 278 351 726,00 | 0,00 | 0,00 | 120 225 675,00 | 10 729 746,00 | 95 150 210,00 | 14 345 719,00 | 64 286 166,00 | 69,84 |
| Kwartał III | 134 324 465,00 | 134 310 249,00 | 79 795 089,00 | 79 795 089,00 | 0,00 | 0,00 | 54 515 160,00 | 700 048,00 | 46 964 756,00 | 6 850 356,00 | 14 216,00 | 59,41 |
| Kwartał IV | 99 209 715,00 | 99 168 933,00 | 58 238 807,00 | 58 238 807,00 | 0,00 | 0,00 | 40 930 126,00 | 737 148,00 | 36 468 599,00 | 3 724 379,00 | 40 782,00 | 58,73 |
| Kwartał I | 100 639 772,00 | 72 938 900,00 | 61 998 065,00 | 61 998 065,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 835,00 | 4 037 225,00 | 5 213 693,00 | 1 689 917,00 | 27 700 872,00 | 85,00 |
| Kwartał II | 128 689 615,00 | 92 159 319,00 | 78 319 765,00 | 78 319 765,00 | 0,00 | 0,00 | 13 839 554,00 | 5 255 325,00 | 6 503 162,00 | 2 081 067,00 | 36 530 296,00 | 84,98 |

¹⁷⁾ Prognozowanie wartości płatności jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych w okresie objętym prognozą zaliczek¹⁸⁾ W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartość w kolumnie 12 oblicza się dzieląc wartość z kolumny 3 przez wartość z kolumny 2 (12=3/2)

Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN) - RPO WO 2007-2013

| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 | | | | | Wartość projektów objętych umowami / decyzjami | Wartość dofinansowania ze środków publicznych | Wartość dofinansowania środkami UE ¹⁹⁾ |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|---|---|
| Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania | Kod Klasyfikacja 3 Obszar realizacji | Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 2 490 264,00 | 1 000 188,00 | 850 159,80 |
| 05* | 01 | 05 | 22 | PL52 | 1 032 120,00 | 549 900,00 | 467 415,00 |
| 07 | 01 | 01 | 03 | PL52 | 1 566 480,00 | 629 160,00 | 534 786,00 |
| 07 | 01 | 01 | 06 | PL52 | 13 922 775,00 | 6 319 655,75 | 5 371 707,39 |
| 07 | 01 | 01 | 10 | PL52 | 718 580,00 | 412 300,00 | 350 455,00 |
| 07 | 01 | 01 | 12 | PL52 | 9 203 017,40 | 5 000 123,08 | 4 250 104,62 |
| 07 | 01 | 01 | 21 | PL52 | 10 536 419,71 | 4 877 300,55 | 4 145 705,47 |
| 07 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 10 592 970,26 | 4 468 575,63 | 3 798 289,29 |
| 07 | 01 | 05 | 06 | PL52 | 2 555 060,64 | 1 295 206,24 | 1 100 925,30 |
| 07 | 01 | 05 | 12 | PL52 | 8 202 033,42 | 2 665 077,39 | 2 265 315,78 |
| 07 | 01 | 05 | 22 | PL52 | 13 340 700,00 | 6 498 600,00 | 5 523 810,00 |
| 08 | 01 | 01 | 06 | PL52 | 566 827,66 | 214 902,11 | 182 666,79 |
| 08 | 01 | 01 | 12 | PL52 | 7 023 756,78 | 2 314 417,83 | 1 967 255,16 |
| 08 | 01 | 01 | 14 | PL52 | 43 069 519,09 | 19 274 652,54 | 16 383 454,66 |
| 08 | 01 | 01 | 16 | PL52 | 152 988,00 | 62 700,00 | 53 295,00 |
| 08 | 01 | 01 | 19 | PL52 | 5 547 227,67 | 1 649 741,51 | 1 402 280,28 |
| 08 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 6 131 296,96 | 2 743 243,11 | 2 331 756,65 |
| 08 | 01 | 05 | 06 | PL52 | 2 181 553,00 | 1 094 748,20 | 930 535,97 |
| 08 | 01 | 05 | 12 | PL52 | 4 379 541,25 | 1 990 219,05 | 1 691 686,18 |
| 08 | 01 | 05 | 14 | PL52 | 37 557 638,02 | 16 336 047,61 | 13 885 640,46 |
| 08 | 01 | 05 | 19 | PL52 | 1 475 661,17 | 532 113,48 | 452 296,46 |
| 08 | 01 | 05 | 22 | PL52 | 6 521 601,91 | 2 571 685,55 | 2 185 932,72 |

| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 | | | | | Wartość projektów objętych umowami / decyzjami | Wartość dofinansowania ze środków publicznych | Wartość dofinansowania środkami UE ¹⁹⁾ |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|---|---|
| Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania | Kod Klasyfikacja 3 Obszar realizacji | Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | 02** | 01 | 22 | PL52 | 347 700,00 | 148 200,00 | 125 970,00 |
| 18 | 01 | 05 | 11 | PL52 | 42 029 000,00 | 25 238 414,50 | 25 238 414,50 |
| 23 | 01 | 01 | 11 | PL52 | 121 084 867,86 | 76 458 898,09 | 76 458 898,09 |
| 23 | 01 | 05 | 11 | PL52 | 39 647 432,84 | 32 406 055,27 | 32 406 055,27 |
| 24 | 01 | 05 | 22 | PL52 | 16 547 301,86 | 10 026 783,33 | 9 744 677,49 |
| 44*** | 01 | 05 | 20 | PL52 | 14 323 692,26 | 7 066 506,62 | 7 066 506,62 |
| 46 | 01 | 01 | 20 | PL52 | 30 914 715,80 | 17 745 862,66 | 17 745 862,66 |
| 46 | 01 | 05 | 20 | PL52 | 87 839 207,05 | 45 220 705,11 | 45 220 705,11 |
| 50 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 21 417 077,31 | 18 204 515,71 | 18 204 515,71 |
| 53 | 01 | 05 | 00 | PL52 | 28 574 765,14 | 17 835 443,83 | 17 835 443,83 |
| 57 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 115 993 829,53 | 39 717 048,46 | 36 251 247,29 |
| 57 | 01 | 05 | 22 | PL52 | 10 083 284,07 | 6 008 225,10 | 5 682 347,69 |
| 58 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 3 100 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 |
| 59 | 01 | 01 | 22 | PL52 | 10 603 131,71 | 9 012 661,95 | 9 012 661,95 |
| 75 | 01 | 01 | 18 | PL52 | 68 866 834,69 | 52 689 541,54 | 52 689 541,54 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | PL52 | 76 954 458,06 | 37 235 263,67 | 37 235 263,67 |
| 85 | 01 | 00 | 00 | PL52 | 18 955 602,84 | 16 112 262,40 | 16 112 262,40 |
| Ogółem | | | | | 896 050 932,96 | 496 261 945,87 | 479 790 847,80 |

¹⁹⁾ Przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii

UWAGI:

* Błędnie wpisany w KSI (SIMIK 07-13), gdyż poddziałanie 1.1.2, w ramach którego podpisana jest ta umowa, nie realizuje tej kategorii interwencji.

** Błędnie wpisany do KSI (SIMIK 07-13), gdyż forma finansowania 02 Pomoc realizowana jest jedynie w ramach działania 1.2 (do zakończenia okresu sprawozdawczego nie było naboru w ramach tego działania)

*** Błędnie wpisany do KSI (SIMIK 07-13), gdyż w ramach działania 4.1 nie było naboru na kategorię Gospodarka odpadami, a jedynie na Oczyszczanie ścieków.

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

| | |
|--------------------------------------|--|
| Numer programu (CCI): | 2007 PL 161 PO 012 |
| Nazwa programu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 |
| Załącznik do sprawozdania nr: | I/2009/RPO/16 |
| Okres sprawozdawczy: | od: (01/01/2009) do: (30/06/2009) |

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WO 2007-2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz danym Planem działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Nazwa działania | Opis działania |
|-------------------|------------------------------|---|
| Informacja | | |
| 1. | Punkty Informacyjne | W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. w ramach RPO WO 2007-2013 funkcjonowało 12 punktów informacyjnych: Punkt informacyjny dla beneficjentów prowadzony przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013, Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców prowadzony przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla RPO WO 2007-2013 (IP II stopnia) oraz 10 punktów w Powiatowych Centrach Informacji Europejskiej i Gospodarczej. Punkty informacyjne udzielały informacji drogą telefoniczną, e-mailową, korespondencyjną oraz w formie wizyt osobistych. W maju 2009 r. punkty zostały włączone do Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim na lata 2007-2013. |
| 2. | Biuletyn Informacyjny | W kwietniu 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała Biuletyn informacyjny podsumowujący badania ewaluacyjne przeprowadzone w województwie opolskim w ramach m.in. RPO WO 2007-2013 pt. „Ewaluacja w województwie opolskim” zawierający opisy przeprowadzonych badań, główne rekomendacje w zakresie modyfikacji systemu realizacji RPO WO 2007-2013 oraz podsumowanie zrealizowanych działań. |
| 3. | Poradnik dla przedsiębiorców | W czerwcu 2009 r. IP II stopnia opracowała i wydała „Poradnik dla przedsiębiorców” zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WO 2007-2013. W poradniku znalazły się przydatne informacje z zakresu zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów oraz zasady przygotowania wniosku w ramach programu. |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 4. | Publikacja wywiadów, ogłoszeń o naborach, artykułów informacyjnych | IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. publikowała ogłoszenia o naborach wniosków oraz artykuły informacyjne nt. aktualnego stanu wdrażania RPO WO 2007-2013 i planowanych terminów spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, jak również współpracowała z mediami regionalnymi (Nowa Trybuna Opolska) oraz krajowymi w opracowaniu materiałów informacyjnych. Łącznie opublikowanych zostało 58 materiałów dot. RPO WO 2007-2013. |
| 5. | Spotkania informacyjne | W lutym (26.02), marcu (30.03) i czerwcu (22.06) 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała robocze spotkania informacyjne dla beneficjentów nt. rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 połączone z podpisaniem umów w ramach programu. W okresie od lutego do czerwca 2009 r. IP II stopnia organizowała spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie informacji ogólnych o poszczególnych działaniach RPO WO 2007-2013, procedur i kryteriów wyboru projektów oraz dokumentacji projektowej. Na przełomie maja i czerwca 2009 r. IP II stopnia organizowała spotkania dla beneficjentów w zakresie wniosków o płatność w ramach RPO WO 2007-2013. W czerwcu IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała konferencję informacyjną nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 4.4 RPO WO 2007-2013 dot. bioróżnorodności. |
| 6. | Informator Europejski | Od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 publikowała Informator Europejski (tygodnik w wersji elektronicznej) zawierający informacje o aktualnościach oraz bieżących naborach m.in. w ramach RPO WO 2007-2013, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz słownik terminów unijnych. |
| Promocja | | |
| 7. | Konferencja ewaluacyjna | W dniu 6 kwietnia 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała Opolską Konferencję Ewaluacyjną pn. „Ewaluacja Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym”. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy w zakresie ewaluacji m.in. RPO WO 2007-2013 oraz nawiązanie współpracy między przedstawicielami środowisk zaangażowanych w proces ewaluacji. Konferencja miała również na celu rozpowszechnienie wiedzy w zakresie badań ewaluacyjnych realizowanych w województwie opolskim wśród instytucji wdrażających RPO WO 2007-2013, środowisk opiniotwórczych oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu. |
| 8. | Materiały biurowe, szkoleniowe i konferencyjne | W kwietniu 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała materiały konferencyjne na konferencję pn.: „Ewaluacja Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym” tj.: teczki i notesy, karty informacyjne, wizytówki, naklejki na teczki. |
| 9. | Materiały promocyjne | W marcu 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 wykonała świąteczne materiały promocyjne. W maju 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 wykonała dokumentację fotograficzną 30 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013. Dokumentacja jest na bieżąco wykorzystywana przy opracowaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach programu. |

| Edukacja | | |
|------------------|---|--|
| 10. | Szkolenia specjalistyczne | 27 lutego, oraz 23 i 24 czerwca 2009 r. IP II stopnia zorganizowała warsztaty z zakresu wypełniania wniosków dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013. |
| 11. | Szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających Fundusze Europejskie | W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia zorganizowały 36 szkoleń dla pracowników z zakresu przygotowania i realizacji RPO WO 2007-2013, m.in. w zakresie pomocy publicznej, postępowania administracyjnego, kontroli udzielania zamówień publicznych, procedur kontrolnych, kwalifikowalności podatku VAT, monitoringu, dyscypliny finansów publicznych. |
| Internet | | |
| 12. | Strona internetowa IZ RPO WO 2007-2013 (UMWO) | W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła stronę internetową www.rpo.opolskie.pl . Na stronie zamieszczane były wszystkie aktualne dokumenty w zakresie wdrażania programu oraz informacje przydatne beneficjentom przy przygotowaniu wniosku w ramach RPO WO 2007-2013. Strona jest systematycznie aktualizowana i dostosowywana do potrzeb beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. |
| 13. | Strona internetowa IP II RPO WO 2007-2013 (OCRG) | W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. IP II stopnia prowadziła stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl . |
| 14. | Newsletter RPO WO 2007-2013 | Od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 wysyłała newsletter RPO WO 2007-2013, który funkcjonuje jako samodzielna publikacja dotycząca programu (subskrypcja na stronie programu). Oprócz cotygodniowego newslettera informacyjnego, IZ RPO WO 2007-2013 po każdej ważnej informacji/decyzji wysyłała do subskrybentów newsletter specjalny, niezwłocznie po uzyskaniu informacji/otrzymaniu decyzji. |
| Ewaluacja | | |
| 15. | Badanie ewaluacyjne pn.: Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim | W sierpniu 2008 r. Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WO 2007-2003 rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych m. in. w zakresie RPO WO 2007-2013 pn. „ <i>Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim</i> ”. Badanie zakończyło się w styczniu 2009 r. Głównym celem ewaluacji było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat stopnia znajomości problematyki Funduszy Strukturalnych przez poszczególne grupy docelowe, tj.: ogół społeczeństwa; instytucje uczestniczące w realizacji RPO WO 2007-2013 i PO KL; beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów; partnerów społecznych i gospodarczych oraz media (telewizja, radio, prasa regionalna i lokalna) oraz rozpoznanie ich zapotrzebowania informacyjnego w obszarze obu Programów. IZ RPO WO 2007-2013 uchwałą nr 3291/2009 z dnia 5.05.2008 r. przyjęła wyniki z badania ewaluacyjnego tj.: <i>Raport końcowy</i> oraz <i>Kartę wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego</i> . |

Wymiana doświadczeń

| | | |
|------------|--|--|
| 16. | Zespół ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015. | Na spotkaniu 9 kwietnia 2009 r. Zespół ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 <u>wypracował i omówił modyfikacje linii komunikacyjnej RPO WO 2007-2013</u> , uwzględniającą wyniki zakończonego badania ewaluacyjnego pn.: „ <i>Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim</i> ”. W wyniku spotkania dokonane zostały zmiany w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009 w ramach RPO WO 2007-2013. |
|------------|--|--|

2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych¹⁾

| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|--|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| <i>Konferencje i wydarzenia promocyjne</i> | <i>Liczba konferencji</i> | Realizacja | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa²⁾ | | | | | 3/8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Konferencje i wydarzenia promocyjne</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>Liczba uczestników konferencji</i> | Realizacja | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | | 350/600 | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Konferencje i wydarzenia promocyjne</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>Liczba wydarzeń promocyjnych konferencji</i> | Realizacja | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | | 2/10 | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Spotkania informacyjne</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba zrealizowanych spotkań informacyjnych</i> | Realizacja | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | | 40/200 | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”).

²⁾ Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015).

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Szkołania informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba uczestników spotkań informacyjnych</i> | Realizacja | | | 735 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 800/6 500 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Szkołania specjalistyczne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających FE</i> | Realizacja | | | 36 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 40/280 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Szkołania specjalistyczne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba uczestników szkoleń</i> | Realizacja | | | 226 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 300/2 800 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Szkołania specjalistyczne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE</i> | Realizacja | | | 3 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 48/250 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Szkołania specjalistyczne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba uczestników szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych</i> | Realizacja | | | 159 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 700/7 00 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Materiały informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba wydanych egzemplarzy biuletynu</i> | Realizacja | | | 300 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 8 000/40 000 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Materiały informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba numerów biuletynu</i> | Realizacja | | | 1 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 4/28 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Materiały informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba wydanych egzemplarzy ulotek</i> | Realizacja | | | 0 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 13 000/80 000 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Materiały informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba tytułów/rodzajów ulotek</i> | Realizacja | | | 0 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 10/30 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Materiały informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba wydanych egzemplarzy innych materiałów informacyjnych</i> | Realizacja | | | 3000 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 5 000/10 000 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Materiały informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba tytułów/rodzajów innych materiałów informacyjnych</i> | Realizacja | | | 1 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 2/8 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Punkty informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba punktów informacyjnych</i> | Realizacja | | | 12 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 12/12 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Punkty informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba osób, które odwiedziły punkty informacyjne</i> | Realizacja | | | 850 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 1 500/3 000 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Punkty informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną</i> | Realizacja | | | 2 200 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 4 500/10 000 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Punkty informacyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba odpowiedzi udzielonych drogą e-mailową</i> | Realizacja | | | 700 | | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | 1 000/5 000 | | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| <i>Strony internetowe i mailing</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba wejść na stronę internetową</i> | Realizacja | | | | 109 855 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 150 000 /180 000 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| <i>Strony internetowe i mailing</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba subskrybentów newslettera</i> | Realizacja | | | | 619 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 550/300 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| <i>Strony internetowe i mailing</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba wysłanych newsletterów</i> | Realizacja | | | | 35 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 70/300 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| <i>Współpraca z mediami</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>liczba publikacji w mediach</i> | Realizacja | | | | 58 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 40/220 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| <i>Współpraca z mediami</i> | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>Liczba opublikowanych w ramach kampanii medialnej ogłoszeń, magazynów/ audycji</i> | Realizacja | | | | 0 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 80/500 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Materiały promocyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>ilość / liczba przygotowanych materiałów promocyjnych – gadżetów</i> | Realizacja | | | | 51 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 3 500/15 000 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |
| Materiały promocyjne | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
| | <i>Ilość przygotowanych materiałów biurowych i szkoleniowo-konferencyjnych</i> | Realizacja | | | | 1250 | | | | | | |
| | | Wartość docelowa | | | | 10 000/85 000 | | | | | | |
| | | Wartość bazowa | 0 | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| Komentarz | |
|------------------|--|

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Institucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów programu, zawierające nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE pod adresem: www.rpo.opolskie.pl. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 3 razy.

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input checked="" type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

7.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak Nie

7.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

Zgodnie z przyjętą Kartą rekomendacji opracowaną na podstawie Raportu końcowego podsumowującego badanie ewaluacyjne "Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim" w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane są następujące usprawnienia:

1. W zakresie poprawy pracy punktów informacyjnych stworzona została Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim. W punktach systematycznie zwiększana jest liczba konsultantów i wprowadzany standard obsługi klienta. Pracownicy punktów informacyjnych w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestniczą w szkoleniach merytorycznych (w zakresie programowania, wdrażania FS, jak również profesjonalnej obsługi klienta) oraz w spotkaniach informacyjnych i stale podnoszą wiedzę i kwalifikacje.
2. Realizowana jest szeroka promocja punktów informacyjnych podczas spotkań informacyjnych/szkoleń oraz na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, jak również w materiałach informacyjnych. Planowana jest szeroka promocja punktów w ramach kampanii informacyjnej (ulotki, foldery) i w ramach kampanii promocyjnej.
3. W zakresie modyfikacji strony internetowej www.rpo.opolskie.pl IZ RPO WO 2007-2013 podjęła prace nad zmianą strony internetowej. Utworzone zostały zakładki dla poszczególnych konkursów, poprawiony system informacji o zmianach wprowadzanych w dokumentach programowych, wprowadzone zostały dodatkowe informacje, w tym informacje o stanie realizacji programu. Wprowadzone zostały dodatkowe elementy, tj. warstwy i bannery informacyjne, których celem jest podkreślenie i zwrócenie uwagi korzystających ze strony na najważniejsze informacje w zakresie wdrażania programu. W II połowie 2009 r. planowana jest przebudowa strony internetowej www.rpo.opolskie.pl.
4. Na spotkaniach informacyjnych organizowanych z potencjalnymi beneficjentami w ramach RPO WO 2007-2013 przed naborami zwiększona została ilość informacji z zakresu: celów i korzyści realizacji programu/działania;

warunków otrzymania dotacji, dokumentacji wnioskowej; praktycznych aspektów przygotowania wniosków; najczęściej popełnianych błędów.

5. W zakresie wymiany doświadczeń, systematycznie zwiększany jest zakres współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy IZ RPO WO 2007-2013 oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację działań informacyjnych i promocyjnych, zwłaszcza w kontekście pracy punktów informacyjnych.
6. Usprawniana jest polityka magazynowa dotycząca materiałów szkoleniowych i konferencyjnych oraz gadżetów w zakresie uwzględniania przez IZ RPO WO 2007-2013 w terminach zamówień gadżetów promocyjnych RPO WO 2007-2013 potrzeb IP II stopnia oraz terminów spotkań informacyjnych i szkoleń specjalistycznych. Ponadto, wprowadzone zostały listy magazynowe dla gadżetów i materiałów konferencyjnych.
7. Planowane jest przeprowadzenie działań medialnych według dwóch linii komunikacyjnych: kampanii promocyjnej skierowanej do opinii publicznej (motyw przewodni-korzystne zmiany w regionie dzięki FE) oraz realizacja cyklu informacyjnego w mediach skierowanego głównie do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, którego motywem przewodnim będzie cykl życia projektu RPO WO 2007-2013. Podział kampanii pozwoli na lepsze dostosowanie przekazu do grupy odbiorców.
8. Planowana jest szeroka dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych do *Sieci Punktów Informacyjnych* oraz innych podmiotów współpracujących z IZ RPO WO 2007-2013 w zakresie upowszechniania informacji o RPO WO 2007-2013 (np. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia i Fundacje).
9. Planowane jest zintensyfikowanie działań informacyjnych i promocyjnych do podmiotów (gmin, powiatów), które w najmniejszym stopniu korzystają ze wsparcia RPO WO 2007-2013. Jednostka Ewaluacyjna w IZ RPO WO 2007-2013 w 2009 roku przeprowadzi badanie ewaluacyjne pn. *Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)*. Efektem badania będzie m.in. opracowanie mapy aktywności aplikacyjnej JST oraz diagnoza barier i problemów uniemożliwiających realizację projektów przez gminy i powiaty. Wyniki zostaną wykorzystane w planowaniu i realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

7.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

Tak

Nie

7.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

Wprowadzenie zmian w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009 w ramach RPO WO 2007-2013 wynika głównie z rekomendacji raportu końcowego badania ewaluacyjnego oraz analiz własnych IZ RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z przyjętą Kartą rekomendacji opracowaną na podstawie raportu końcowego podsumowującego badanie ewaluacyjne *”Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim”* zaplanowano głównie:

- wzmocnienie przekazu do ogółu społeczeństwa województwa opolskiego,
- zmodyfikowanie przekazu do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu,
- zmodyfikowanie stron internetowych programu,
- szersze dostosowanie planowanych działań medialnych do poszczególnych grup docelowych,

Część uwag i rekomendacji, zaproponowanych przez Ewaluatora, zostało zdiagnozowanych na etapie przygotowania Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009 w ramach RPO WO 2007-2013, dlatego nie wymagają one wprowadzania dodatkowych zmian w dokumencie.

Ponadto, część rekomendacji ma charakter szczegółowy i wymaga jedynie modyfikacji komunikatu lub dostosowania przekazu w ramach zaplanowanych i realizowanych działań informacyjnych i promocyjnych, nie wymaga natomiast zmian dokumentu.

7.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

1. Wyniki badania ewaluacyjnego uwzględnione w Karcie rekomendacji oraz Raporcie końcowym badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim”.
2. Analiza informacji zwrotnych od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013, potwierdzająca w/w wyniki badania ewaluacyjnego.
3. Analiza systemu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 i identyfikacja elementów stwarzających trudności i opóźnienia w realizacji w/w działań np.: procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zmiany organizacyjne w IP II stopnia.

7.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczno planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

7.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Szczegółowa analiza systemu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym pozwoliła na zidentyfikowanie elementów stwarzających trudności i opóźnienia w realizacji w/w działań. Istotne zagrożenie stanowi niewystarczające dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do specyfiki działań informacyjnych i promocyjnych.

6. Informacje dodatkowe

6 stycznia 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009 w ramach RPO WO 2007-2013 (Roczny plan działań).

Zgodnie z koncepcją polityki komunikacyjnej w roku 2009 działania informacyjne i promocyjne dostosowane zostaną do zaawansowanego poziomu wdrażania RPO WO 2007-2013. Dodatkowo, w związku z sytuacją gospodarczą, realizacja działań będzie na tyle elastyczna, aby uwzględnić wymagania bieżącej sytuacji. Na tym etapie nadal ważne jest budowanie i utrwalenie zdobytego zaufania ogółu społeczności regionalnej i lokalnej dla instytucji wdrażających w/w program, jednak punkt ciężkości prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przesuwa się w kierunku dostarczania informacji bardziej szczegółowej, działalności szkoleniowo-warsztatowej, a także ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników instytucji wdrażających, która ma szczególnie istotne znaczenie wobec dużej ilości nowych regulacji prawnych oraz wątpliwości interpretacyjnych w początkowej fazie wdrażania funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Nadal istotne będzie prowadzenie konsekwentnych działań wizerunkowych, tj.: zapewnienie jednolitego i identyfikowalnego wizerunku programu (oznaczenia materiałów, szerokie upowszechnianie hasła programu), zapewnienie rozpoznawalności programu i jego poszczególnych działań, ale ważnym elementem stanie się również zapewnienie prawidłowej realizacji i rozliczania projektów, w tym wywiązywanie się z realizacji przez beneficjentów działań informacyjnych i promocyjnych, a także promocja dobrych praktyk.

Prowadzone w 2009 roku działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane są przy wykorzystaniu narzędzi określonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji przy dostosowaniu odpowiedniego elementu przekazu do odpowiednich grup docelowych.

23 czerwca 2009 r. Roczny plan działań został zweryfikowany po zakończeniu prowadzonego w terminie od sierpnia 2008 r. do lutego 2009 r. badania ewaluacyjnego działania informacyjne i promocyjne RPO WO 2007-2013 pn.: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim”, którego wyniki IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła 5 maja 2009 r.

W okresie sprawozdawczym, oprócz opisanych w poprzedniej części sprawozdania działań informacyjno-promocyjnych, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu, jak również uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez inne instytucje i jednostki, na których przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 występowali w roli prelegentów lub konsultantów.

Najważniejsze spotkania zostały zorganizowane w następujących terminach:

- 1. Spotkanie nt. stanu przygotowania do realizacji oraz realizacji projektów kluczowych własnych w ramach RPO WO 2007-2013 – Opole, 20 lutego 2009 r.*
- 2. II Forum Funduszy Europejskich – Warszawa, 7-8 maja 2009 r.*

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpośrednio odpowiedzialna za opracowanie, wdrażanie i koordynację działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 ściśle współpracowała z IP II stopnia w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu przygotowywane przez IP II stopnia każdorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013.
